

2018

FAM

FONDO DE INICIATIVAS MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado

diciembre

FECHA DE CORTE: 31/12/2018

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Restante	Especificaciones	Cantidad	Medios	Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha	Obras y Mantenimiento									
													Ya fue inaugurada?	Ya fue inaugurada?	Ya fue inaugurada?	Cuenta con Actas						
1	Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a. Etapa.	x	\$ 4,300,000.00	\$ 1,581,359.97	\$ 2,718,640.03	S. Estructuras	1	133.00	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	70.00	20/09/18	No	No	No	No						
							1	44.00	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	70.00	15/02/19	No	No	No	No						
2	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x	\$ 3,775,919.02	\$ 2,502,828.39	\$ 1,273,090.64	S. Estructuras	1	133.00	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	70.00	20/09/18	No	No	No	No						
							1	44.00	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	70.00	15/02/19	No	No	No	No						
3	Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x	\$ 1,550,000.00	\$ 574,659.93	\$ 975,340.07	S. Estructuras	1	133.00	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	70.00	20/09/18	No	No	No	No						
							1	44.00	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	70.00	15/02/19	No	No	No	No						
4	Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 0.00	S. Estructuras	1	133.00	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	Perforación de pozos de agua para la construcción de la estructura.	70.00	20/09/18	No	No	No	No						
							1	44.00	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	Entrega de materiales para la construcción de la estructura.	70.00	15/02/19	No	No	No	No						
TOTAL													TOTAL									
													\$10,328,519.02									
													\$6,385,744.28									
													\$4,887,074.74									

Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca.

Clave Inst 911: 2005U0021P

Nombre: L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz.

Cargo: Vicedirector de Administración.

Teléfono: 911 722 7053 Ext. 1009

Correo electrónico: L.castillo@unimex.edu.mx



UNISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y Firma del Titular de la IES

Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los expedientes que caracterizan a la obra o proyecto. Se pueden anexar tanto fotos como documentos.

2 En esta sección se redactan de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

EAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

diciembre

FECHA DE CURTE: 31/12/2018



Porcentaje de avance

75



PRIORIDAD

3

Nombre de la obra:

Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

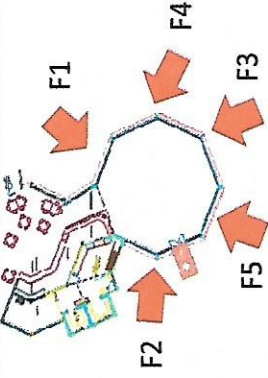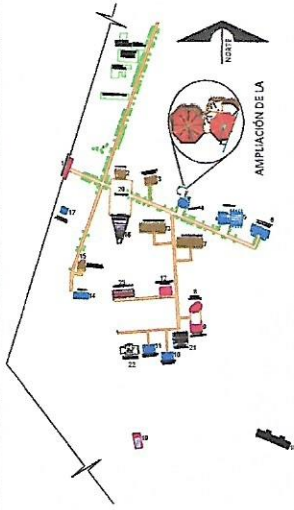

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1



F2



F3



F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:

Centrado, armado y colado de base de azules y trabes. Elaboración de cadenas de cerramiento y colado de casillas.

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

[Firma]

A. R. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

[Firma]

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Más reportes
diciembre
FECHA DE CORTE: 31/12/2018



Porcentaje de avance

70



1

Nombre de la obra:

Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a. Etapa.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

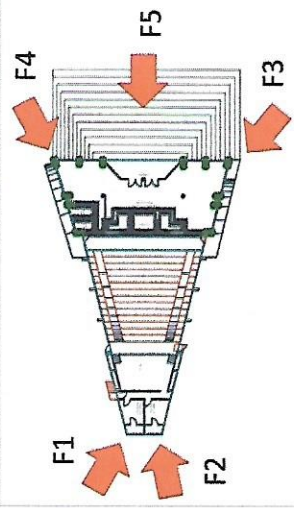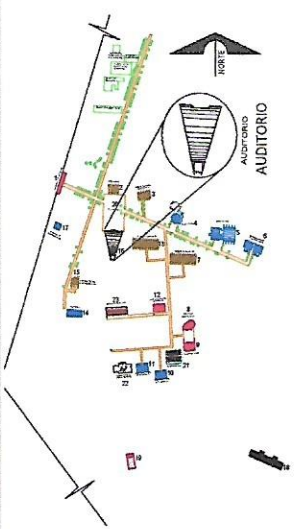

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transmisiona
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
Realización de apilados en muros, muro de tabión el muro inclinado, armado de acero en muros de concreto, armado de traves en muro inclinado, armado de estructura en techado.

F1:

F2:



F3:

F4:

F5:

L. A. E. Celar Fontajato Casillo Cruz

Nombre y firma del responsable de la IES

N. A. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FMS

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

diciembre

RESOLUCIÓN: 3112/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO

PROYECTO: 2

Nombre de la obra:


Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

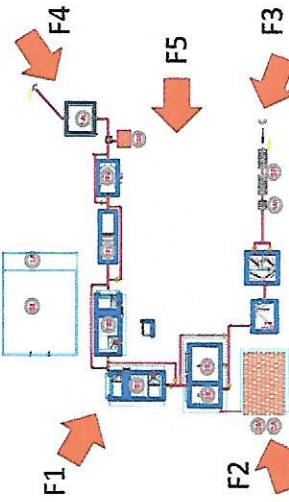

FOTOS




F1



F2



F3

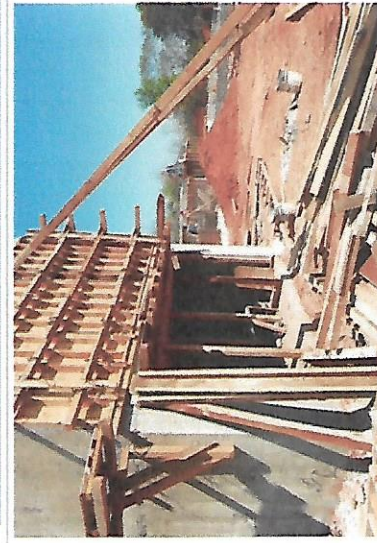

F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:

Cambio de ubicación del Ecosistema de Lodos, Elaboración de Muros de Concreto en Filtro 1.
 Terminación de Sedimentador 2, Colado de marquisina en Biorreactor, Elaboración de piso fino en cuarto de máquinas, Apilado fino en muro de cuarto de máquinas. Comienza con la elaboración de muros de tabicación en el ecosistema de lodos.

L. A. E. Celso Fortuna Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Dra. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
