



Nombre: Universidad del Istmo.
Entidad federativa: Oaxaca.
Clave Inst 811: 2046100212

Nombre: L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz
Cargo: Vice-rector de Administración
Teléfono: 971 72 2 70 Ext. *200
Correo electrónico: c. cesar@ibianni.unidemo.edu.mx

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García.
Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
Teléfono: 971 71 2 70 50 Ext. 2360
Correo electrónico: conava@hotmail.com

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nº	Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, recursos humanos y tipo de Proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance físico	Fechas		Observaciones	¿La suscripción de las memorias? (Chubut)	¿Ya fue incorporado?			Cuenta con Actas	
							Españolado	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con foto del avance?	¿Omn y cambio memoria?	Acta Administrativa (Alta Ingresos)		Acta de Alta (Alta Ingresos)
1	Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.		Obra de continuidad	\$ 3,195,675.22	\$ 3,195,675.22		5. Espectadores 1 193.00 Fon 1 44.00 Sanitarios 4 28.00 Vestibulo 1 162.00 Vestidores 2 24.00 TOTAL 9 449.00 Mecanismo 1 y 2 2 28.52 Cuadro de Aréola y Centro de 1 49.73 Borrador 1 y 2 2 104.34 Sementador 1 1 35.52 Sementador 2 1 35.52 Filtro 1 1 14.49 Filtro 2 1 14.49 Generador de 1 3.57 Tanque de 1 15.21 Atornillamiento 1 128.49 Tanque de bocos 1 128.49 TOTAL 13 427.87 Consulta de control 1 1 Luminaria con 5 12 Inlet 13 Microprocesador 13 Tecnologías 1 Sistemas/325- 1 Luminaria/Inlet 2 Extracción para 1 sella DIX 4 Alarcon 1000 W 4 Subwoofer 2 Alarcon 12 2 Procesador de 1 Mazodora de 24 1 Talon de boca 1 Talon de boca 1 Proyector BenQ 1 Pantalla 1 TOTAL 44 8.80 Chinos 12 114.62 Patio y Vestibulo 1 25.86 Sala de juntas 1 17.95 Sanitarios 2 6.42 TOTAL 16 165.85	97.0	11/09/19	15/04/20	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	Si	No	Si	Si	\$1,195,675.22					
2	Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en el Centro del Istmo Campus Tehuacan.		Obra de continuidad	\$ 3,050,200.00	\$ 3,050,200.00						100.00	21/09/19	31/03/20	Obra Terminada	Si	No	Si	Si	\$3,540,300.00		
3	Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán		Obra de continuidad	\$ 1,338,078.65	\$ 1,338,078.65						100.00	25/10/19	31/03/20	Obra Terminada	Si	No	Si	Si	\$1,338,078.65		
5	Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.		Obra de continuidad	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00						98.0	23/08/19	15/04/20	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	Si	No	Si	Si	\$700,000.00		

L. A. E. Cesar Fortuna de Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la IES

Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrian anexionar tanta filas como sean necesarias.

1. *What is the purpose of the study?*

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el cronograma de actividades.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "W. J. ...". The signature is written over a horizontal line. Below the signature, there are several lines of faint, illegible text, possibly a date or address.



Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca.

Clave Inst 911: 20MSU0021P

Nombre: L. A. E Cesar Fortunato Castillo Cruz

Cargo: Vice-rector de Administración

Telefono: 971 722 70 50 Ext. *206

Correo electrónico: c_cesar@bianni.unistmo.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.

Téléfono: 971 71 2 70 50 Ext. 209

Correo electrónico: cosavh@hotmail.com

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

[illegible]

A. F. Cesar Fontana, Castillo, Cuzco

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la I.E.S.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo

FECHA DE CORTE: 11/03/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

1

Nombre de la obra:



Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.



Porcentaje de avance

97

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

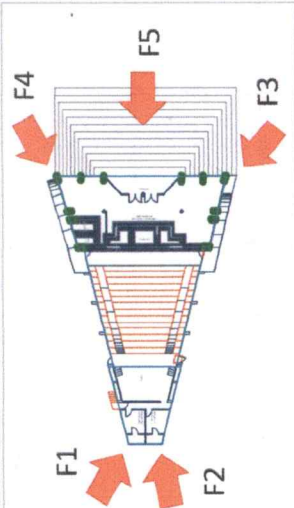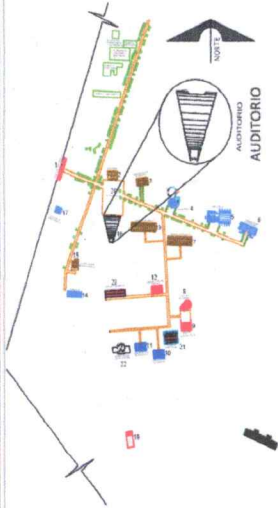

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transístmica
Juchitán-La Ventosa Km. 14, Huixtla, Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C.P. 70102

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos de pintura.




F1:




F2:

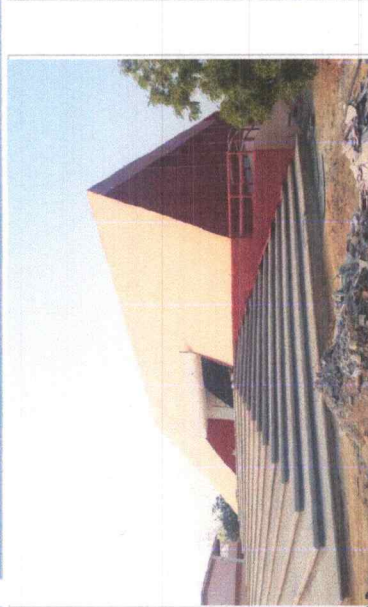

F3:

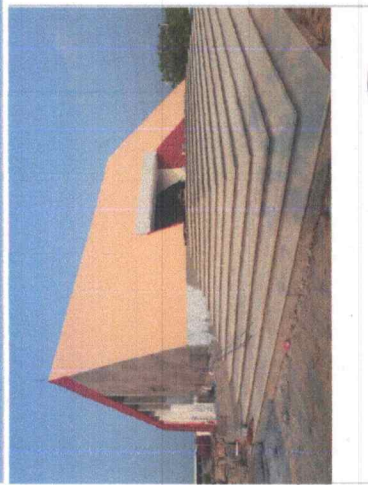

F4:

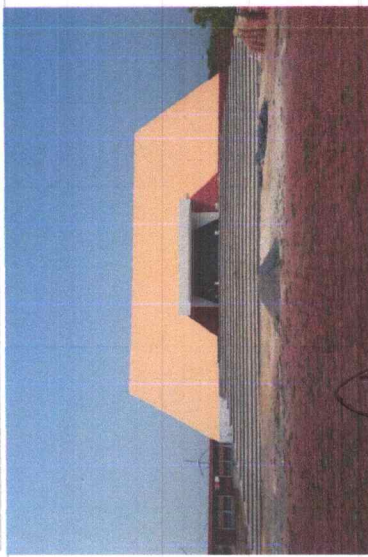

F5:

UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
L.A.E. Cesar Fortuna
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Cárdenas García

Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se recomienda copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se copie la pestiña correspondiente al ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

100


PROGRAMA

2

Nombre de la obra:



Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

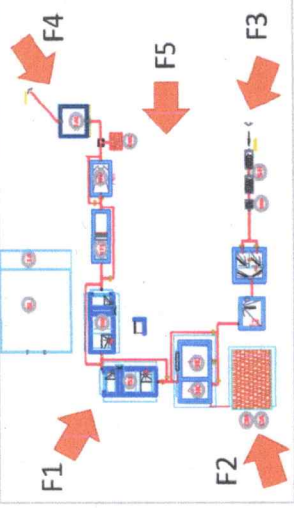



Ciudad Universitaria sin, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

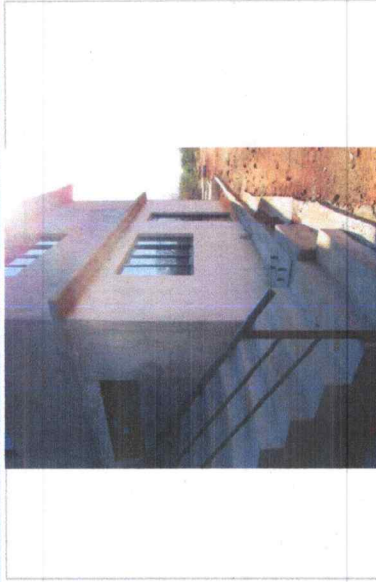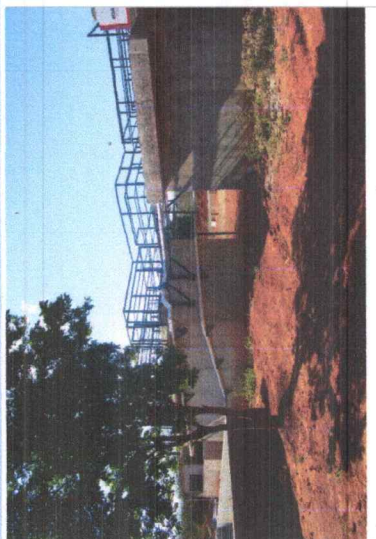

Comentarios de los trabajos realizados:
Otra terracería

FOTOS

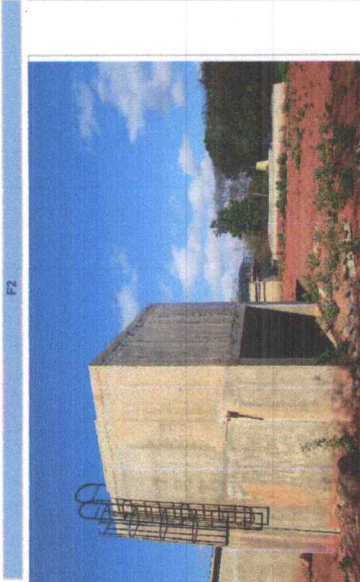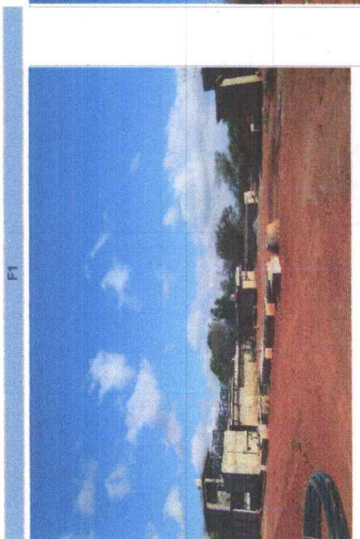


L.A.E. Cesar Fortuna, Secretario Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Víctor Hugo Hernández García

Nombre y firma del Titular de la IES



VICE-RECTORIA DE

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para esto se anexa una plantilla de copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y idricaciones, en especial, se recomienda que se anexa una plantilla de copiar tantas pestañas como sea necesario.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

100



PROCESO

3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

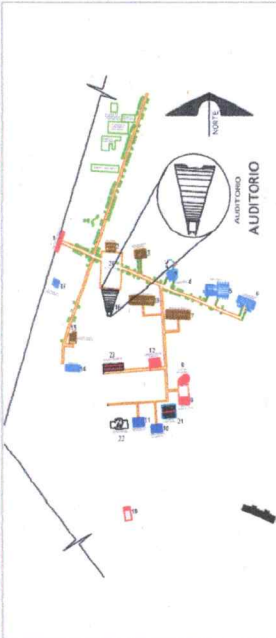

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra terminada



F2:



F4:



L. A. E. Cevallos, J. Cevallos Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

VICE-RECTORIA DE

ADMINISTRACIÓN

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se sugiere tomar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

Ing. Víctor Hugo Salazar García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE 31/03/2020



Porcentaje de avance

100



PROYECTO

3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

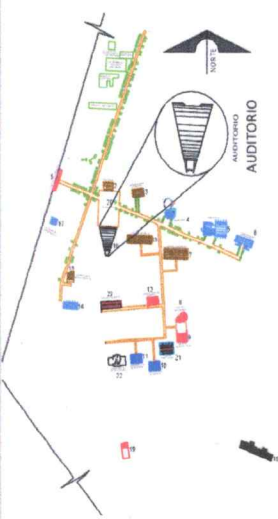

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C.P. 70102

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

L.A.E Cesar Forero Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

UNISTMO
VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Victor Hugo Hernández García

Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.



Porcentaje de avance

100


PROGRESO

3

Nombre de la obra:

Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CRONOS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C.P. 70102

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada



L.A. E. Cesar Fomonte Córdova Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

F4:

F5:

Ing. Víctor Hugo Orellana García

Nombre y firma del Titular de la IES

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

100


PROYECTO

3

Nombre de la obra:


Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

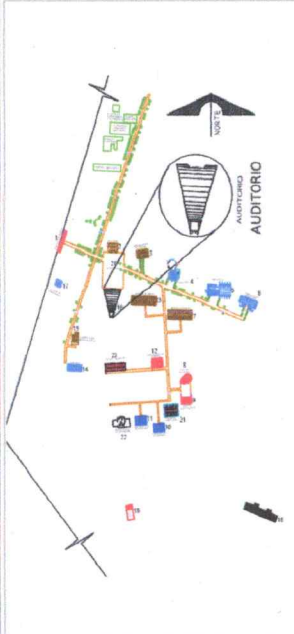

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carrera Transísmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Huixtla Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102



FOTOS




F1:



F2:



F3:



F4:



F5:



L.A.E. Cesar Fombrun Cepeda Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Manuel Velasco García

Nombre y firma del Titular de la IES

VICE-RECTORIA DE

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello, **ADMINISTRACIÓN** debe copiar tantas pestanillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar, para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

98


Proyecto

5

Nombre de la obra:

Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

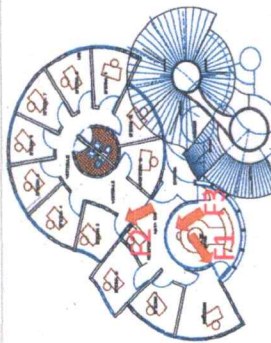


Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1

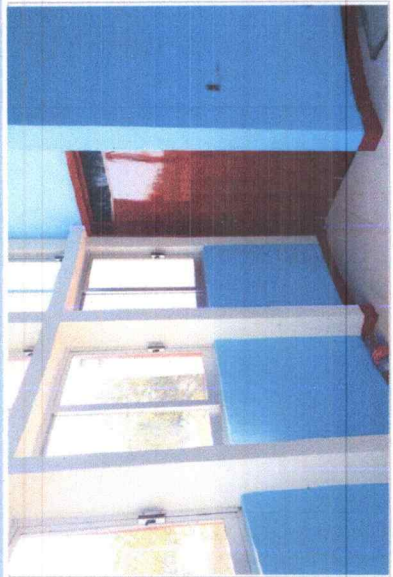

F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos de pintura

F3



L.A. E. Cesar E. Muñoz Restrepo Cruz

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Víctor Hugo Castañanos García

Nombre y firma del Titular de la IES y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las labores. Para ello se anexa una planilla, se podrá copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y educaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2018



Porcentaje de avance

98

PROYECTO

5

Nombre de la obra:


Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CENTRO DE IDIOMAS

CENTRO DE IDIOMAS

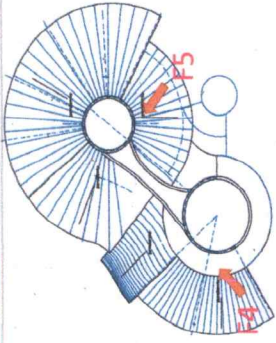


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS




F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos de pintura



L.A.E. Cesar Fortinero Castillo Ortiz

Nombre y firma del Titular de la IES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se recomienda copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

100

PROYECTO


7

Nombre de la obra:


Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

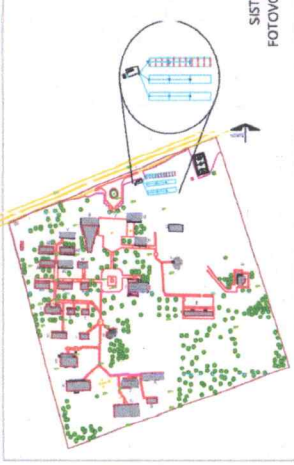


SISTEMA FOTOVOLTAICO

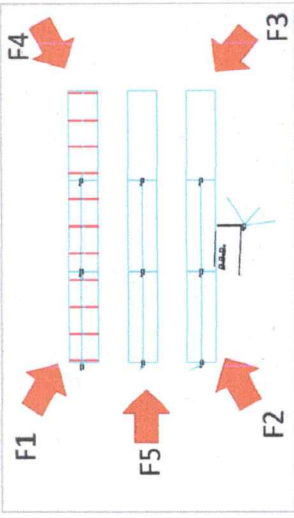


Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.


FOTOS




F1:




F2:



F3:



F4:



F5:

UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
L. A. E. Cesar Fontana Cruz
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Guadalupe García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrá copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se anexe como mínimo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO




Porcentaje de avance

100

9

Nombre de la obra:
Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN

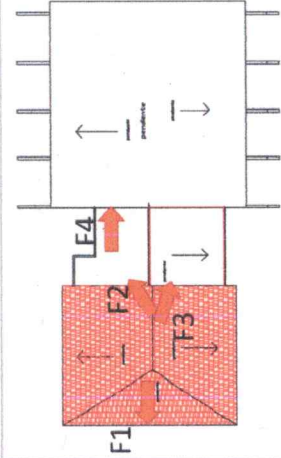

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70780, Saltillo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



BIBLIOTECA



F1


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.



F2



F3



F4

UNISTMO
L. A. E. Cesa Fortuondo Agustín Cruz
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la IES

2019

AÑO



Porcentaje de avance


100

10 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

REPORTE FOTOGRÁFICO

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

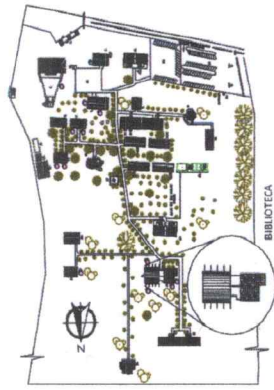

BIBLIOTECA




Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax.
México C.P. 70110.

FOTOS



BIBLIOTECA



F1: ACERVO PLANTA BAJA



F2



F3: SALA DE LECTURA PLANTA BAJA



F4



L.A.E. Cesar Fortaluzo Castillo Cruz
Nombre y firma del Titular de la ES

Ing. Víctor Hugo Villalobos García

Nombre y firma del Responsable de Obras y Mantenimiento de la ES

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE 31/03/2019



Porcentaje de avance

100


PROGRESO

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

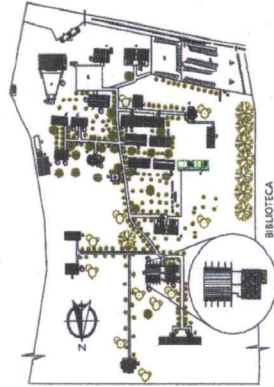

BIBLIOTECA




PIANTA ALTA

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



BIBLIOTECA



FI. ACERVO PANTA ALTA



F2



L.A. E. Cesar Rodríguez Ochoa



Nombre y firma del Titular de la Obra

Ing. Víctor Hugo Castellanos García


Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para el caso de obras de mantenimiento, se recomienda que se capture la misma toma, antes, durante y después de la obra. Para el caso de obras de construcción, se recomienda que se capture la misma toma, antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO

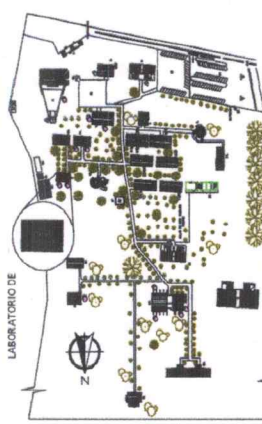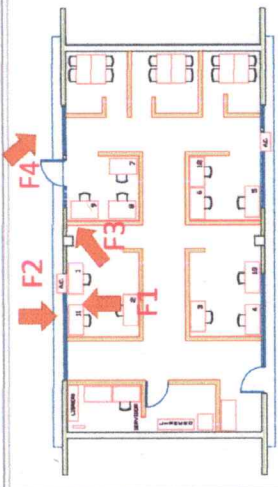PERSONA 10 Nombre de la obra:	GRUPO DE LOCALIZACIÓN Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtépec.	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Carr. Chihuitán-Ixtépec S/N, Ciudad Ixtépec, Oax., México C.P. 70110.
LABORATORIO DE 		
Porcentaje de avance 100		

FOTOS

		Comentarios de los trabajos realizados: Obra terminada.
LABORATORIO DE AUTOACCESO 		
		

UNISTMO VICE-RECTORIA DE L.A.E. César Fortulán Ceseo Cruz Nombre y firma del titular de la IES	UNISTMO VICE-RECTORIA DE Ing. Víctor Hugo Castañeda García Nombre y firma del titular de la IES
--	---

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para el mantenimiento de las obras se recomienda copiar tantas pastas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda copiar el mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo
FECHA DE CORTE 31/03/2019



Porcentaje de avance

100


PROYECTO

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtépec.

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

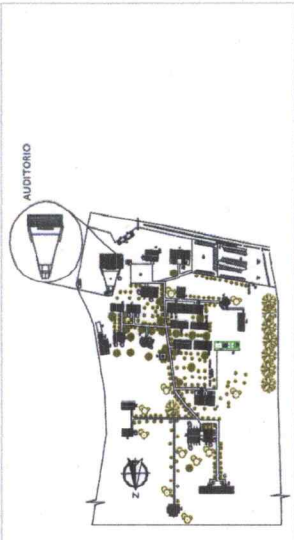


AUDITORIO

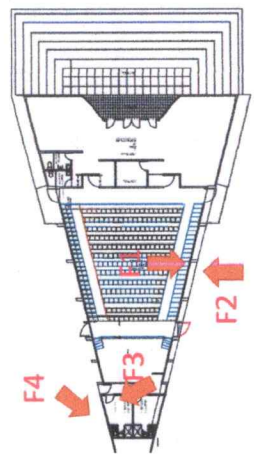

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitán-Ixtépec S/N, Ciudad Ixtépec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

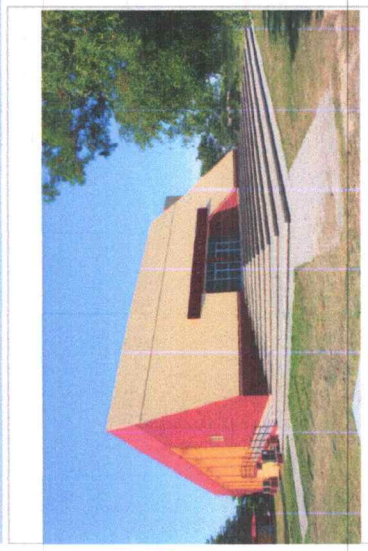


AUDITORIO




F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra lambrada.

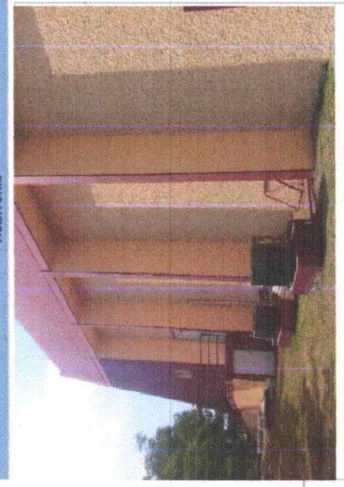

F2

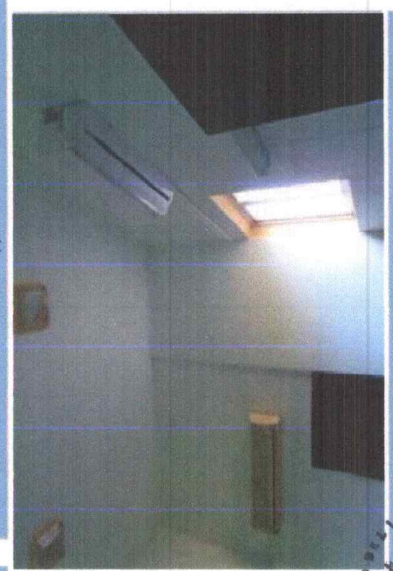

F3



F4



L.A.E. Cesar Roldán Osorio

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Oaxaca / Mantenimiento de la IES

VICE-RECTORIA DE

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello, el personal responsable deberá copiar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomendará tomar fotos en el mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE OBTENCIÓN: 31/03/2019



Porcentaje de avance



100

PROYECTO

10 Nombre de la obra:


Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

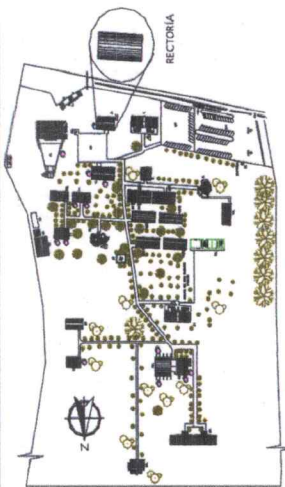


Referencia de fotos en croquis

FOTOS

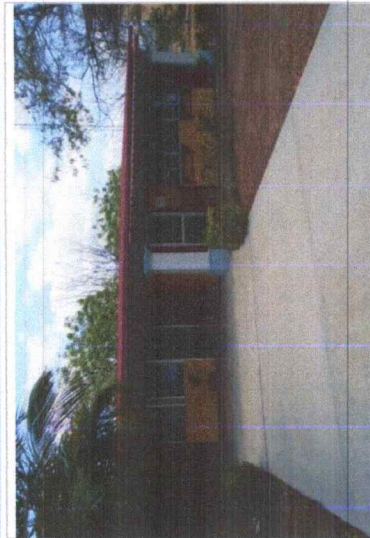

EDIFICIO DE RECTORÍA



F1: SALA DE JUNTAS



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas.

L.A.E. Cesar Esteban Cruz Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la IES

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

100



Proyecto:

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepepec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

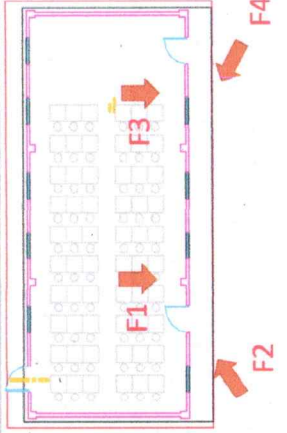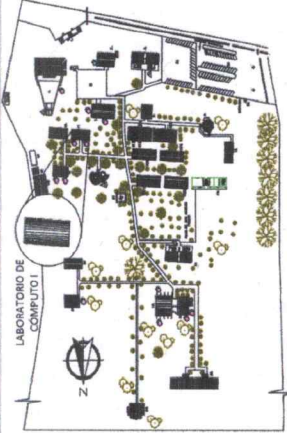



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtepepec S/N, Ciudad Ixtepepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

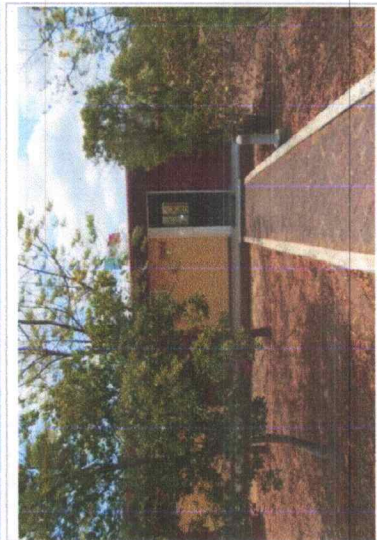

Comentarios de los trabajos realizados:
Otra terminada.

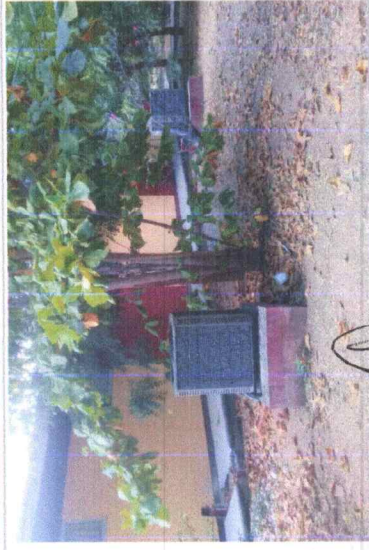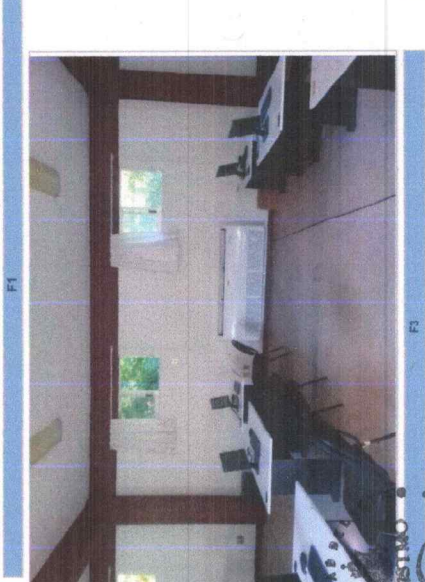

F2

F3

F4

L.A.E. Cesar Fortuna Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture a la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

100


PROYECTOS

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtetpec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

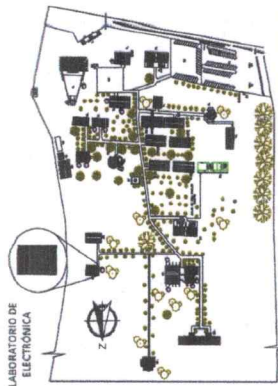


LABORATORIO DE ELECTRONICA

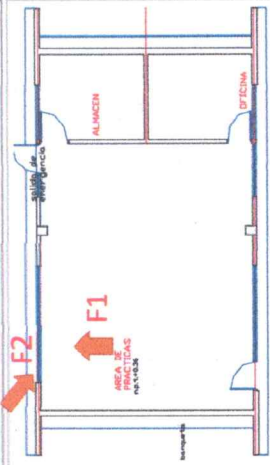

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtetpec S/N, Ciudad Ixtetpec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

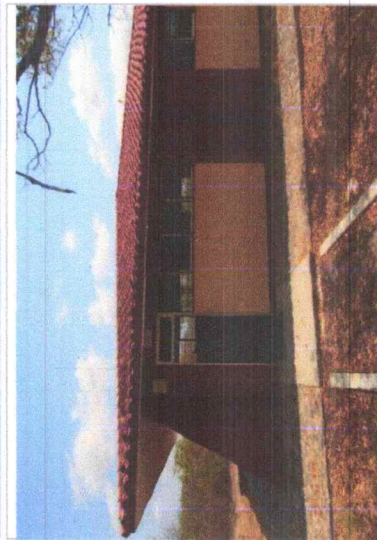

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas.

LABORATORIO DE ELECTRONICA



F1

F2



L. A. E. Cesar Fortuner Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

VICE-RECTORA DE

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una instancia de equiparación tantas veces como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se anexe una instancia de equiparación tanto en el ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

100


PROYECTO

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtetpec.


CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

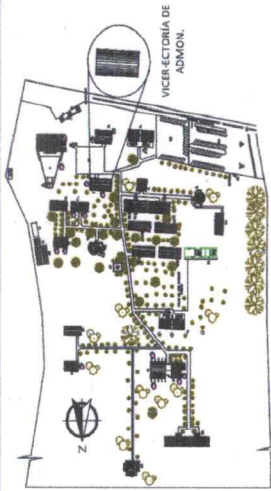

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ixtetpec S/N, Ciudad Ixtetpec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

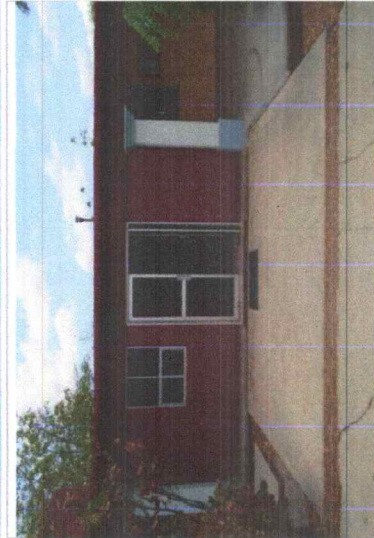


VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN.



F1



F2



F3



F4

L. A. E. Oscar Fournier Cruz, A. A. C.

Nombre y firma del Titular de la Vicerrectoría de Administración

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la Vicerrectoría de Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture a cámara, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2018



Porcentaje de avance

100



PROYECTO

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtetpec.


CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

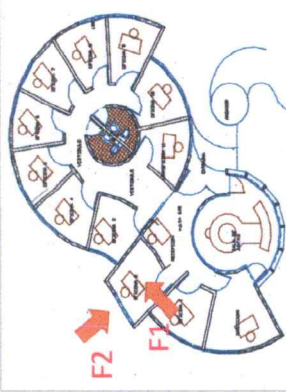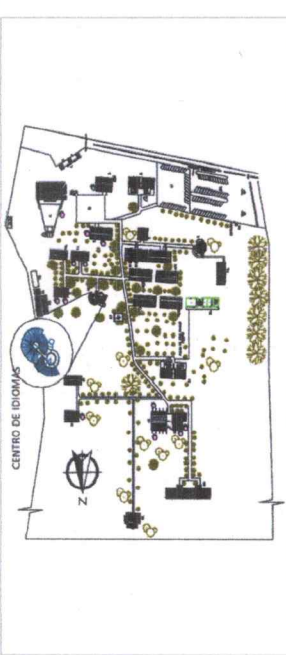

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ixtetpec SN, Ciudad Ixtetpec, Oax.
México C.P. 70110.

FOTOS

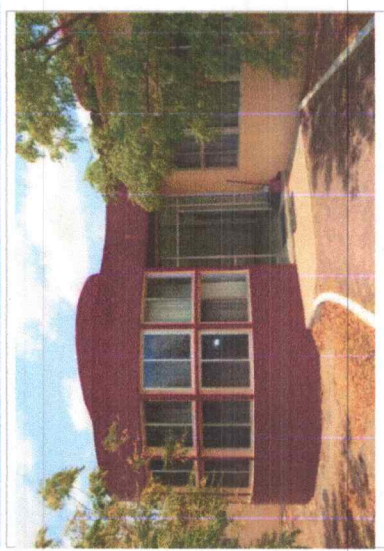

CENTRO DE IDIOMAS



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra actividad:



F2



L. A. E. Cesar Fajardo Castillo Cruz

Nombre y Apellido Titular de la IES

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Víctor Hugo Rosales García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa informe fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento / adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture a misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

100

Proyecto

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CUBICULO DE PROFES I



SALA DE JUNTAS

F1

F2

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ixtepepec S/N, Ciudad Ixtepepec, Oax.
México C.P. 70110.

FOTOS



CUBICULO DE PROFES I



F1: SALA DE JUNTAS



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra terminada



L. A. E. Cesar Fontanales Cruz

Nombre y firma del Titular de la ES

VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACIÓN

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
marzo
FECHA DE CORTE 31/03/2019



Porcentaje de avance

100


PROGRAMA

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Itepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

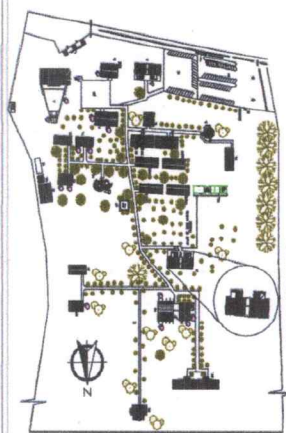


CUBICULO DE PROFES II

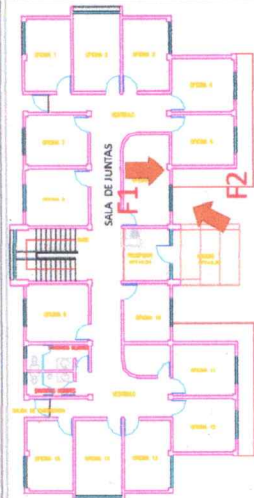

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Itepec S/N, Ciudad Itepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

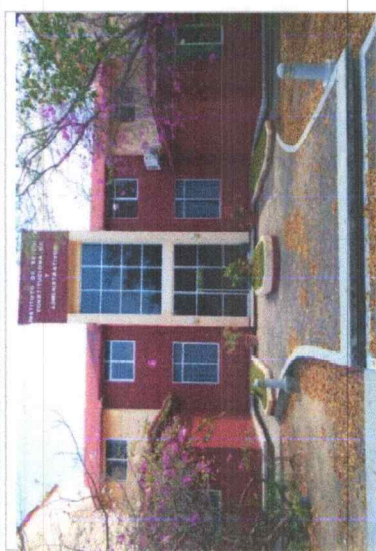

CUBICULO DE PROFES II



F1

Comentarios de los trabajos realizados:
Obras terminada.



F2

L.A.E. Cesar Fortuna

Nombre y firma del Titular de la IES



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Víctor Hugo Ochoa

Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrá tomar tantas fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CONTINÚE 31/03/2019



Porcentaje de avance

100



PROYECTO

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixttepec.

CRONOS DE LOCALIZACIÓN

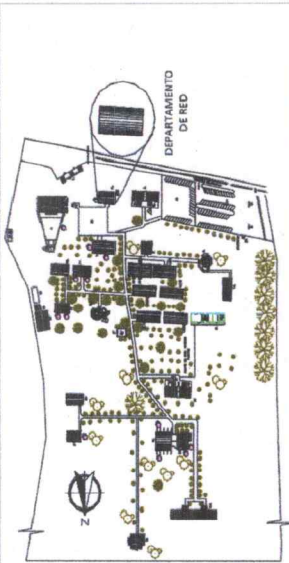

Referencia de fotos en croquis

FOTOS




EDIFICIO DE RECTORIA




F1 DEPARTAMENTO DE RED

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra terminada.

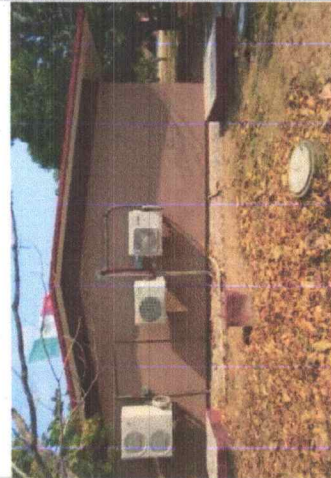

F2



L.A.E. Cesar Roldán Cárdenas

Nombre y firma del titular de la IES

VICE-RECTORIA DE

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se debe administrar por todas partes como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y educaciones, en especial, se recomienda que se capture a misma hora, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

Ing. Víctor Hugo Cárdenas García

Nombre y firma del titular de la IES

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2019


PRECEDENCIA

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtépec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN



AULAS DE DOS NIVELES

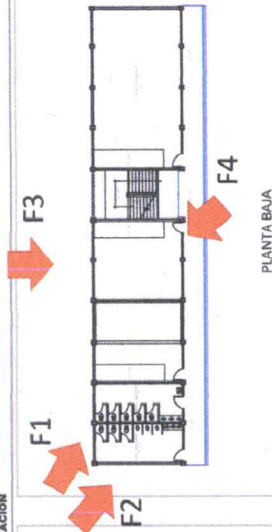

PLANTA BAJA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.




Porcentaje de avance

100

FOTOS

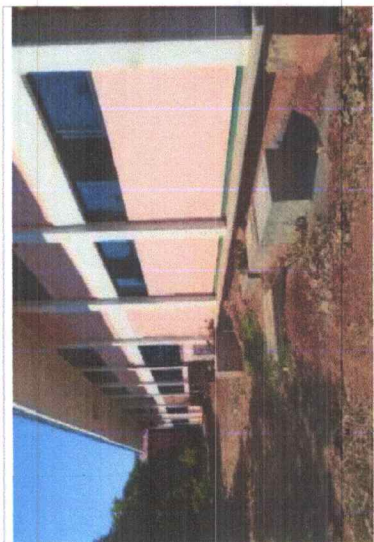

F1:

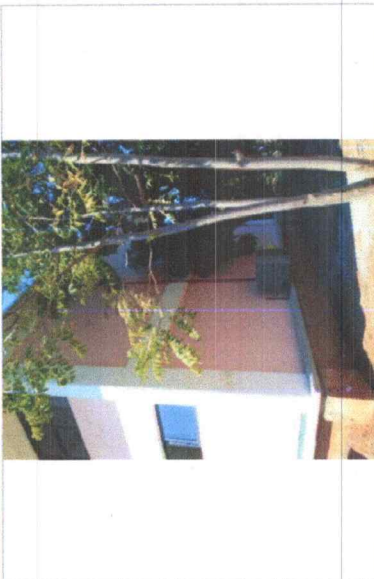

F2:



F3:



F4: AULA 26

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.

L. A. E. Cesar Tortuoso Jasso

Nombre y firma del titular de la IES

VICERECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Víctor Hugo Castañeros García

Nombre y firma del titular de la IES

*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las etapas. Para ello se anexa una pestalla, se podrán copiar tantas pestallas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO



Porcentaje de avance

100

PROYECTO

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CICLOS DE LOCALIZACIÓN




AULAS DE DOS NIVELES

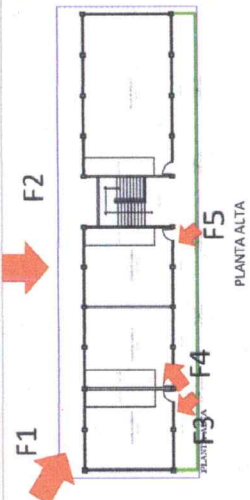

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, San Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

FOTOS

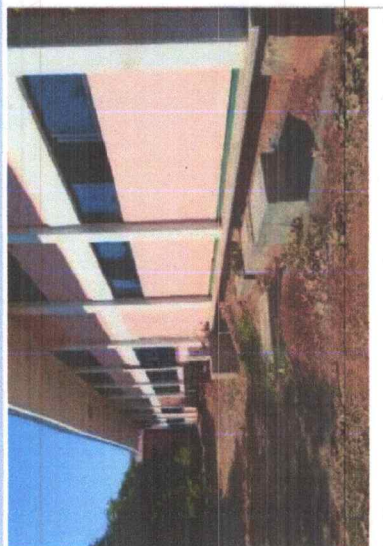

Comentarios de los trabajos realizados:

Ora terminada.

F1:



F1: AULA 27

L. A. E. Cesar Fajardo Casillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN

F2:



F2: AULA 28



F3: AULA 29

Ing. Víctor Hugo Hernández García

Nombre y firma del Titular de Aguas y Mantenimiento de la IES

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

100


PROYECTO

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

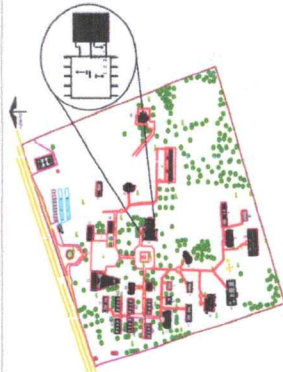

BIBLIOTECA



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:



F3:



L. A. E. Cresta Fortuna Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

F4:

F5:

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para cada obra se deben copiar tantas postales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
