

2020

300

FAM

PUNTO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAMes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca.

Clave Inst 9111 2008U0021P

Nombre: L.A.E. Cesar Fortunato Castellanos Cruz.

Cargo: Vicerrector de Administración.

Teléfono: 971 72 70 50 Ext. '206

Correo electrónico: c_cesar@unimex.edu.mx

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García.
Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
Teléfono: 971 72 70 50 Ext. '309
Correo electrónico: ccocan@unimex.com

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto		Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto		Acciones que sustentan el avance	Autodisponibilidad por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Cualquier)	Ya fue inaugurado?							
		Obra de continuidad	Equipamiento				Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Especificaciones			Cantidad	Acciones que sustentan el avance	Autodisponibilidad por realizar	Inicio	Termino	¿Cuenta con Actas Administrativas?	¿Cuenta con Resolución de la Secretaría de Finanzas?	¿Cuenta con Actas Administrativas?
P-5	Rehabilitación impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Itepec.	X		\$ 1,962,910.00	\$ -	\$ 1,962,910.00	Centro de idioma	1	176.96		0.00	01/07/20	21/10/20	La obra se encuentra en proceso de Liberación del Recurso ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No No está concluida.	No	-----	No	No	No			
																					Cuba Profra	1	348.81
																					IECA	1	348.81
																					Biblioteca	1	600.00
																					Cafetería	1	180.00
																					Páridio	1	200.00
																					Deplo. Profra	1	500.86
																					Vicerrectoría Administrativa	1	332.01
																					Auditorio	1	264.63
																					Lab. Electrónica	1	132.31
P-6	Rehabilitación impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	X		\$ 768,866.77	\$ -	\$ 768,866.77	Cuba Profra	1	78.84		0.00	02/07/20	15/09/20	La obra se encuentra en proceso de Liberación del Recurso ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No No está concluida.	No	-----	No	No	No			
																					Cuba Profra	1	343.12
																					Talleres	1	234.00
																					Cafetería	1	259.61
																					Vicerrectoría Académica	1	294.04
																					Lab. Inge. Química	1	78.84
																					Talleres	1	234.00
																					Cafetería	1	259.61
																					Vicerrectoría Académica	1	294.04
																					Lab. Inge. Química	1	78.84
P-7	Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	X		\$ 1,519,717.44	\$ -	\$ 1,519,717.44	Extracción para Línea de Cable	1	45.05		0.00	02/08/20	15/11/20	La obra se encuentra en proceso de Liberación del Recurso ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No No está concluida.	No	-----	No	No	No			
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
																					Extracción para Línea de Cable	1	36.00
P-8	Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	X		\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	Red Sanitaria	1	270.00		0.00	15/06/20	12/09/202	La obra se encuentra en proceso de Liberación del Recurso ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No No está concluida.	No	-----	No	No	No			
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00
																					Red Sanitaria	1	270.00

L.A.E. Cesar Fortunato Castellanos Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

- Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar una sola vez como sea necesario.
- En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos realizados, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.
- Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, dd, mm y aa.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2018



Porcentaje de avance

0

PROYECTO

P-1


Nombre de la obra:

Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



EDIFICIO DE 9 AULAS




PLANTA BAJA


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.


FOTOS

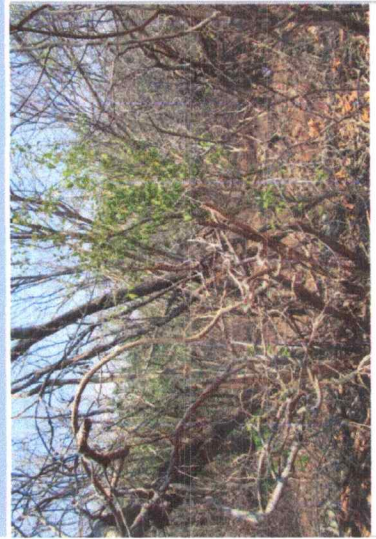

F1:

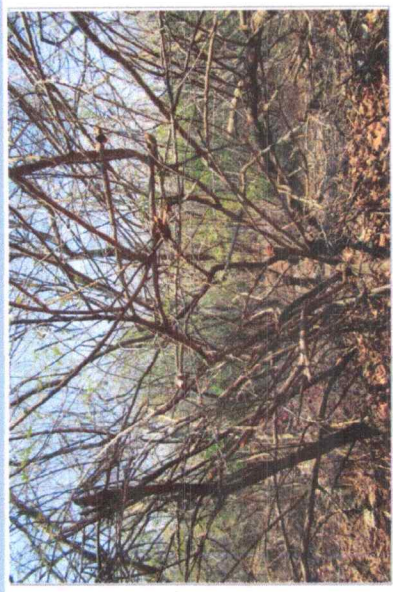

F2:

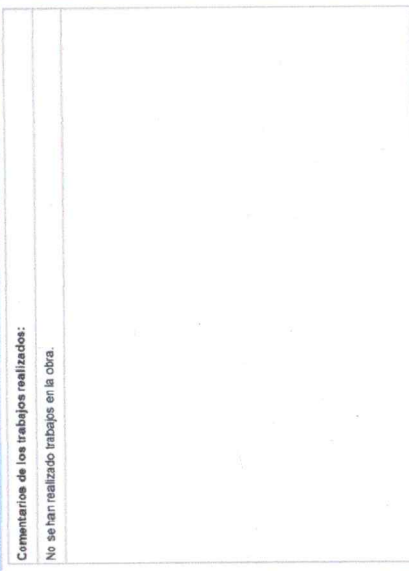


Comentarios de los trabajos realizados:


No se han realizado trabajos en la obra.



F4:

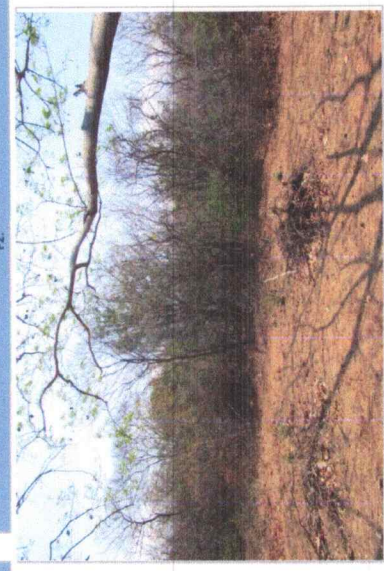

F5:



F6:

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo

Nombre y firma del titular de la ES

Ing. Victor Hugo Tapaleros Garcia

Nombre y firma del titular de la Obra y Mantenimiento de la ES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

P-1

Nombre de la obra:

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN




EDIFICIO DE 9 AULAS




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México


FOTOS




F1:



F2:



F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. A. E. Cesar Fortunato Casero Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postafixa, se podrán copiar tantas postafixas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO



Porcentaje de avance

0



P-2

Nombre de la obra:

Demolición y construcción del almacén de la Universidad del Istmo Campus Ixtapetec.

REPORTE FOTOGRÁFICO


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

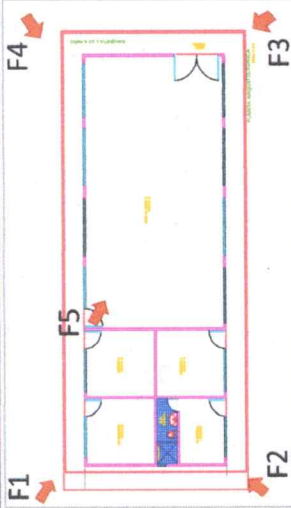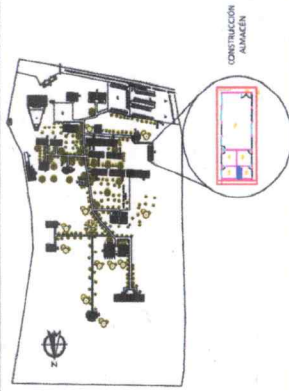

UBICACIÓN DE LÍNEA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapetec
Chihuitan, Ciudad Ixtapetec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

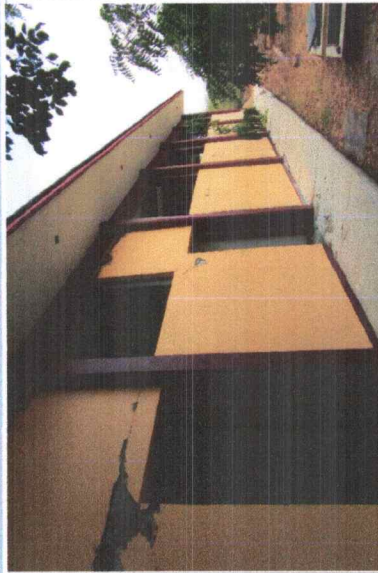

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.



F1



F3

L. A. E. César Fortunato Castro Quiroga

Nombre y firma del Titular de la IES

F2



F4



F5

Ing. Víctor Hugo Casadellanos García

Nombre y firma del Titular de la IES

2020

AÑO



Porcentaje de avance



0

PROCESO P-3

Nombre de la obra:


Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

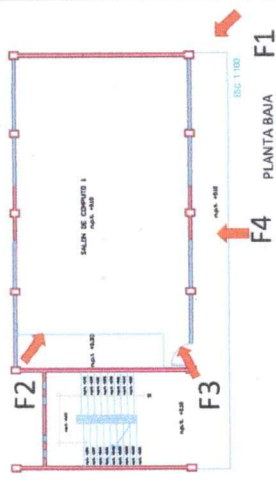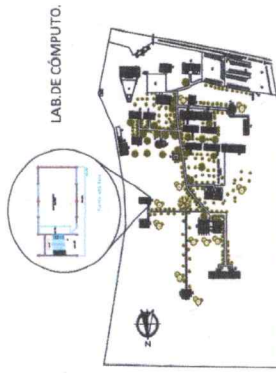


Ubicación de la obra o proyecto
Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec
Chihuitan, Ciudad Ixtapa, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

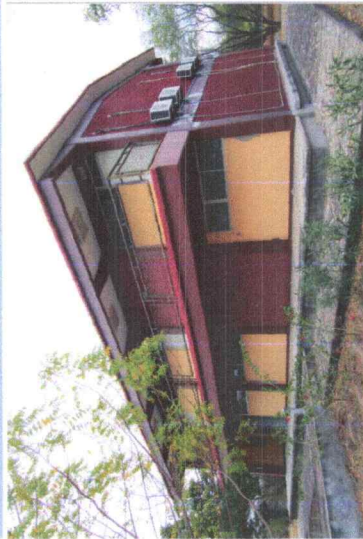

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.

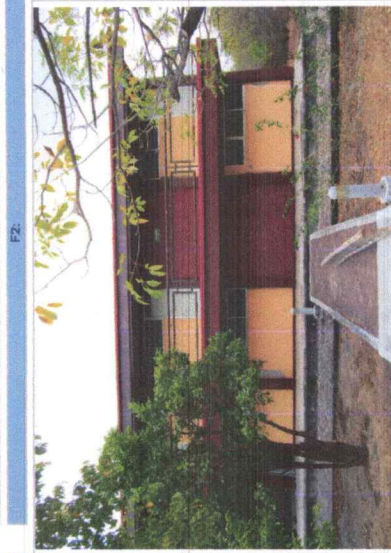

F1:

F2:

F3:

F4:

Nombre y firma del Titular de la IES

L. A. E. Cesar Fortes Salas Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Chelatenos Garcia

2020

AÑO

FAM

FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CONTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-3


Nombre de la obra:

Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Itepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

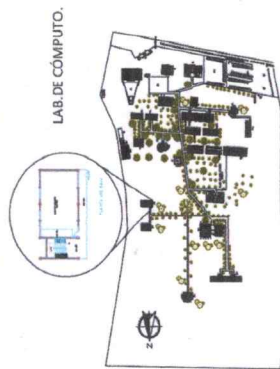

LAB. DE CÓMPUTO.

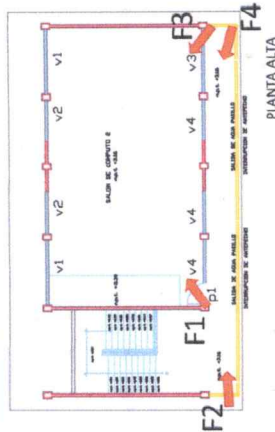

PIANTA ALTA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec
Chihuitan, Ciudad Itepec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS




F1:



F2:



F3:

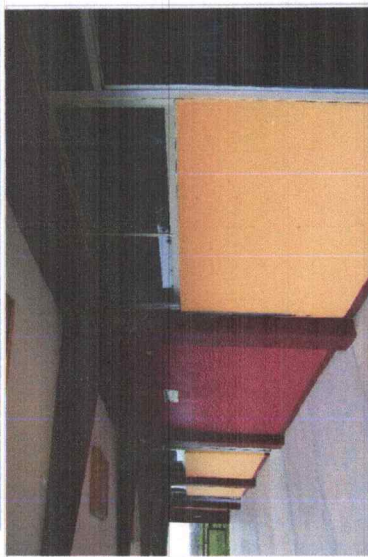

F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. A. E. Cesar Fortinato Cesarino Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2018



Porcentaje de avance


0

PROCESO


P-4 Nombre de la obra:

Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Isttepec.

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

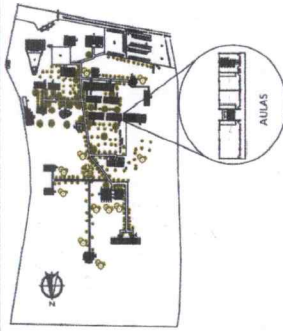


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Isttepec
Chihuitán, Ciudad Isttepec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS



F1

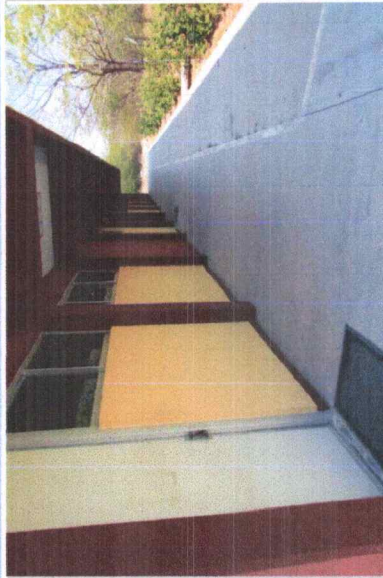


F2



F3



F4

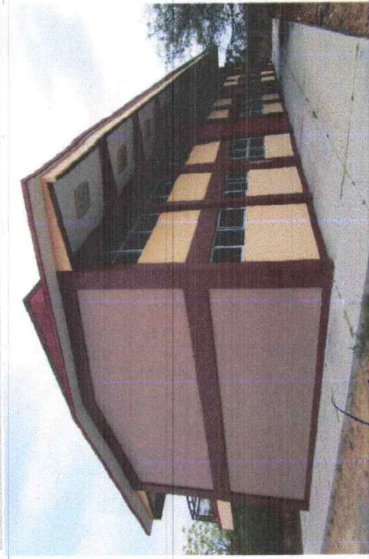

F5

L. A. E. Cesar Forastero Cárdenas Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO

Nombre de la obra:

Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Ixtepepec.

P-4



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

PROGRESO

Porcentaje de avance

0

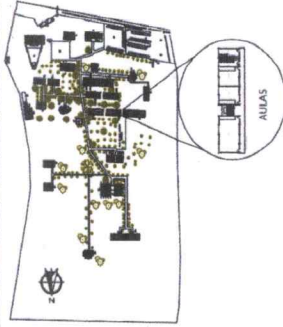


Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepepec Chihuitan, Ciudad Ixtepepec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS



F1

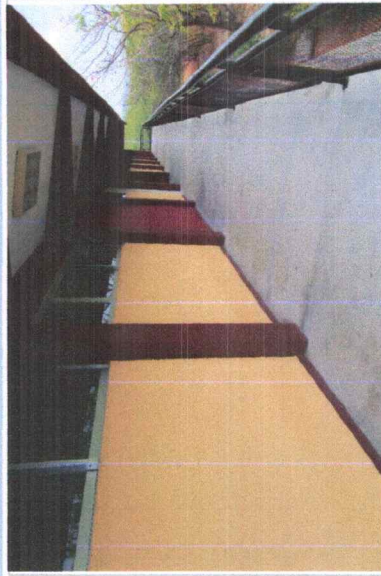

F2

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.



F3

L. A. E. Cesar Fortunato Castro Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de la IES y Mantenimiento de la IES

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MILITARES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0



PROYECTO

P-5

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtapac.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

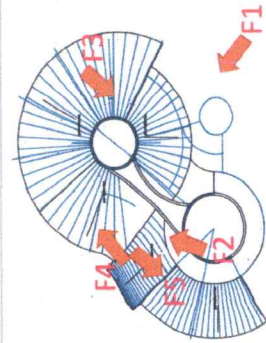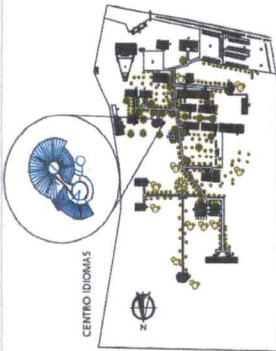

Ubicación de la obra o proyecto

Ciudad: Universidad s/n, Carretera Ixtapac
Chinultán, Ciudad Ixtapac, Oaxaca CP. 70110

FOTOS



F1:




F3:

L. A. E. Cesar Fortulano Castillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES



F2:

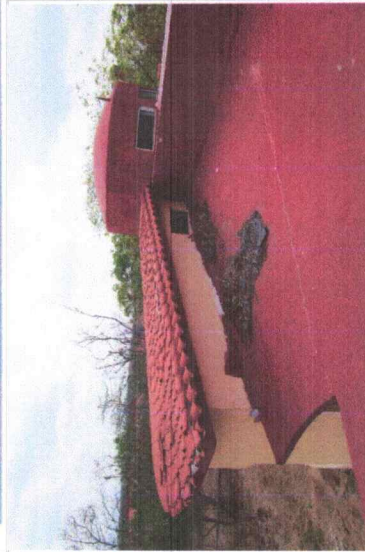

F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.





F5:




Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO

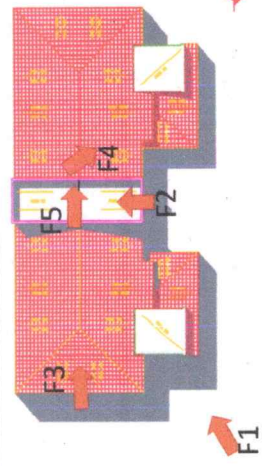PROYECTO P-5 Nombre de la obra: Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Ciudad: Universidad s/n, Carretera Ixtpec Chihuitan, Ciudad Ixtpec, Oaxaca, CP. 70110
PROGRESO Porcentaje de avance: 0	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN  CUBÍCULO DE PROFESORES
REPORTES FOTOGRÁFICOS 	

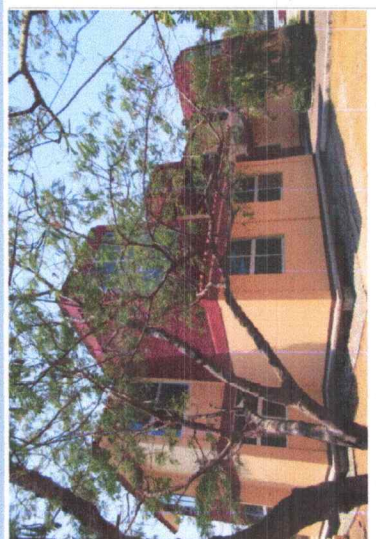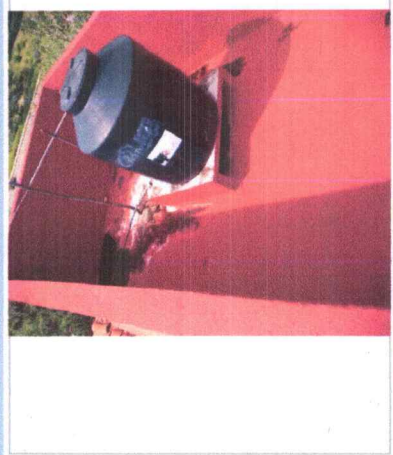FOTOS  F1	 F2	 F3
 F4	 F5	 F6
Comentarios de los trabajos realizados: No se han realizado trabajos en la obra.		
Nombre y firma del Titular de la IES L.A. E. Cesar Fortunato Jasso Ortiz Ing. Víctor Hugo Caballeros García		

2020

AÑO



Porcentaje de avance

0

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020



REPORTE FOTOGRÁFICO

P-5 Nombre de la obra:

PROYECTO


Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtapepec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

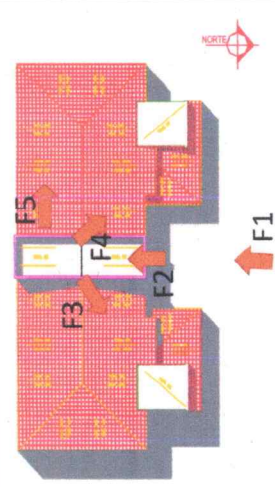

Ubicación de la obra o proyecto
Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapepec
Chihuitan, Ciudad Ixtapepec, Oaxaca, CP. 70110


FOTOS

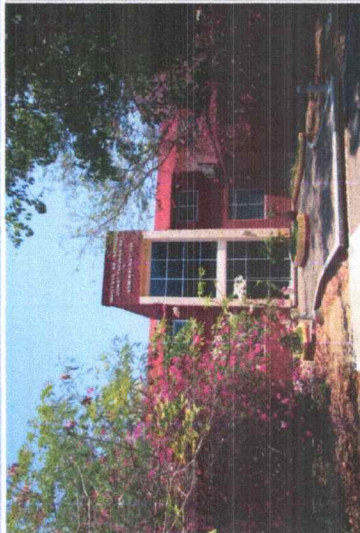

F1



F2

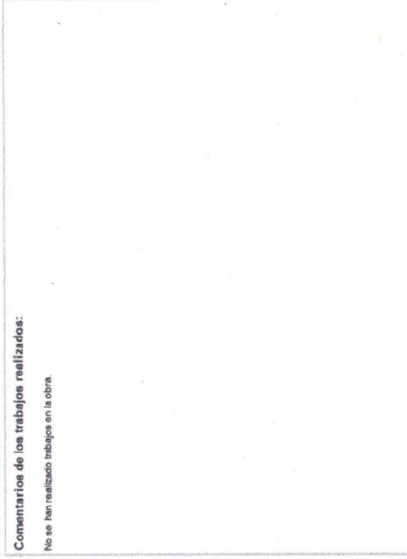

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.



F3



F4



F5

L. A. E. Cesar Fortinato Cordero

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance



0

PROGRESO

P-5 Nombre de la obra

Rehabilitación e impermeabilización de las de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.


CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

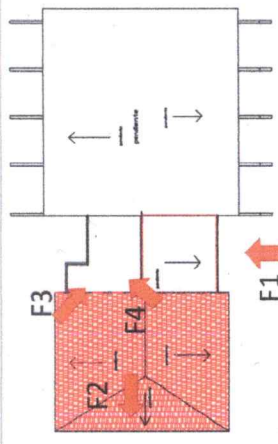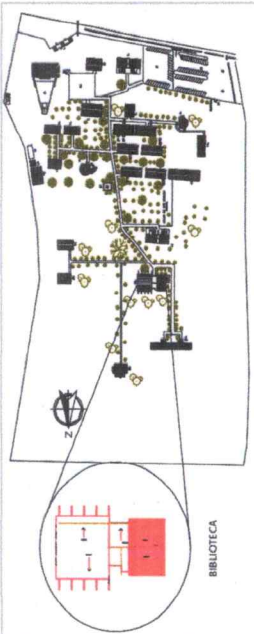

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtpec
Chihuitan, Ciudad Ixtpec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

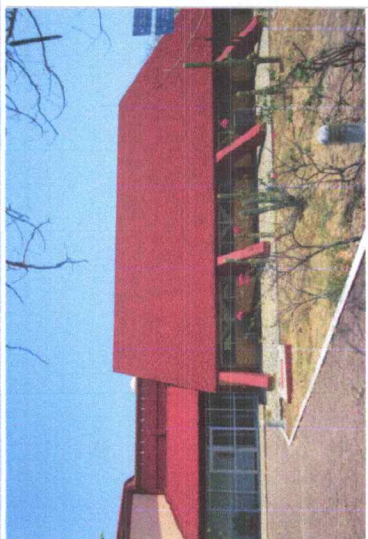

F1



F2



F3



F4

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L.A.E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la IES

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE 31/03/2020



Porcentaje de avance

0

PROYECTO


P-5

Nombre de la obra:



CAFETERÍA

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

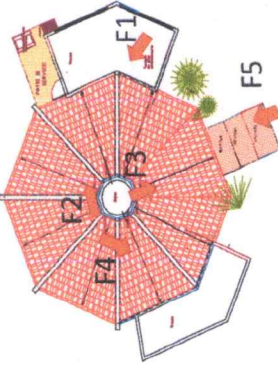

F5

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istpepec
Chihuitan, Ciudad Istpepec, Oaxaca, CP 70110

FOTOS




F1:




F3:

L.A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

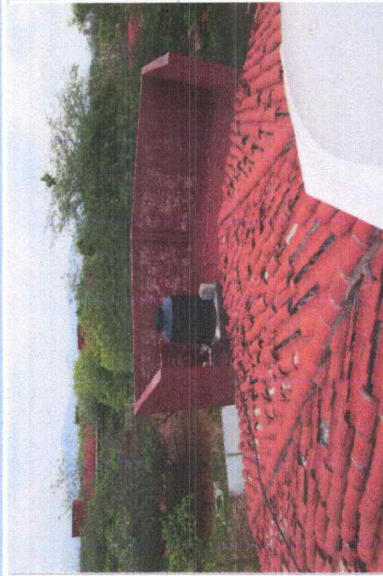

F2:

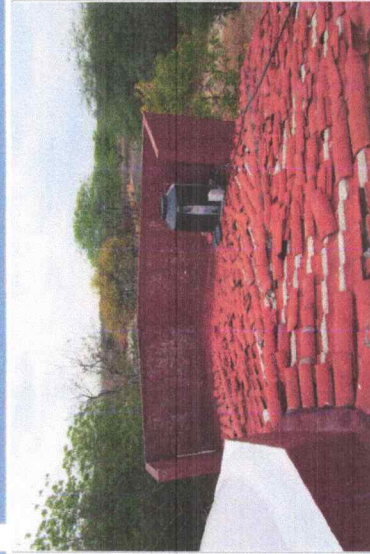

F4:



F5:

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Inteppec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

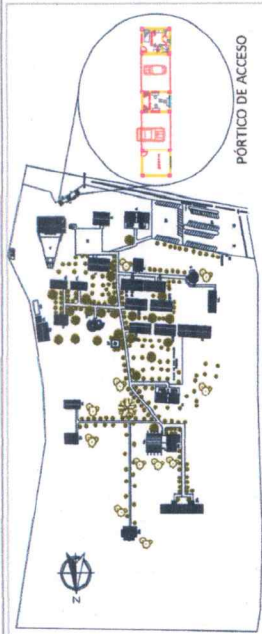

PÓRTICO DE ACCESO




F5


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Inteppec
Chihuitán, Ciudad Inteppec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

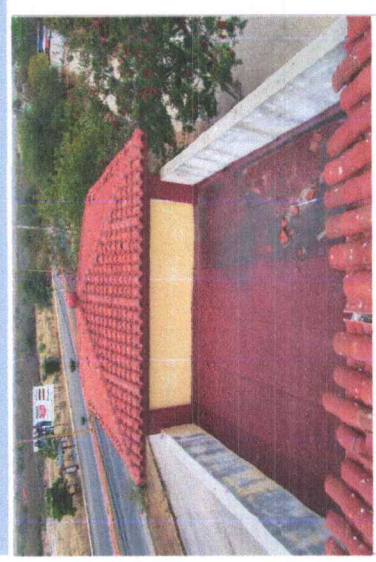

F1:

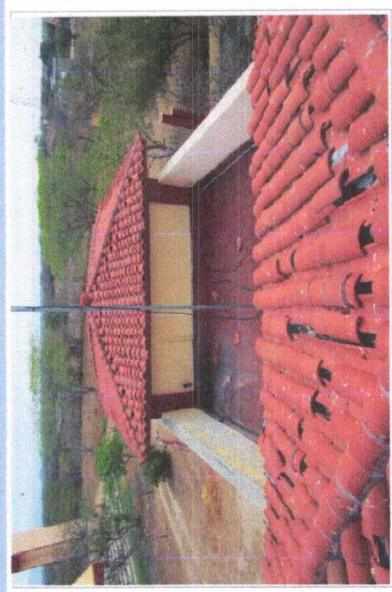

F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra

L.A.E. Cesar Furtado Cardo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Int. Virgilio Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una petatita, se podrán copiar tantas petatitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CONTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROPIEDAD

P-5

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtespec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DEPTO. DE PROFESORES




F1

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtespec
Chihuitan, Ciudad Ixtespec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

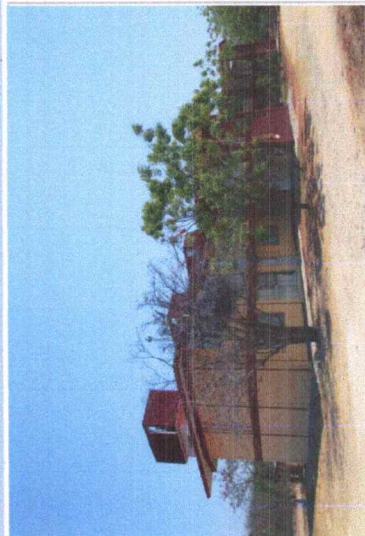

F1:



F2:



F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. A. E. Cesar Fortunio Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Operación y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-5

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.


CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN




VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec
Chinuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca, CP. 70110

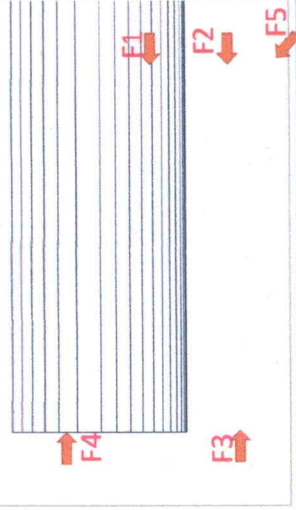

FOTOS

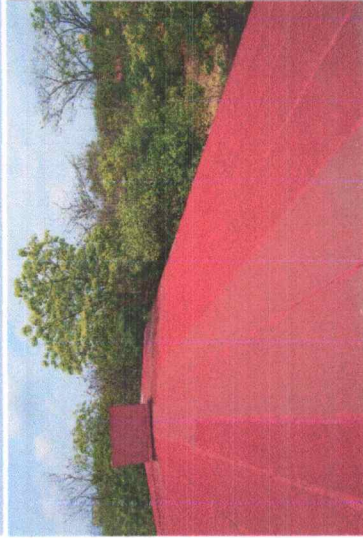

F1:




F2:



F3:



F4:

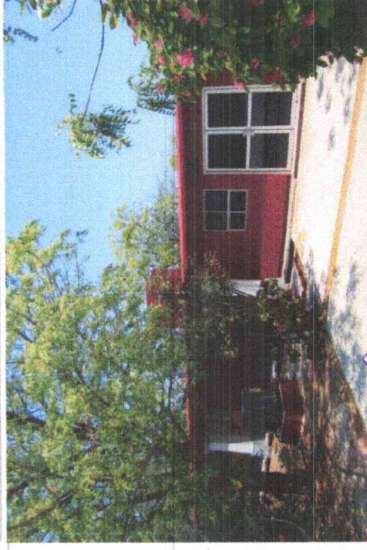

F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L.A.E. Cesar Fortuna Castro Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CONTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtapetec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

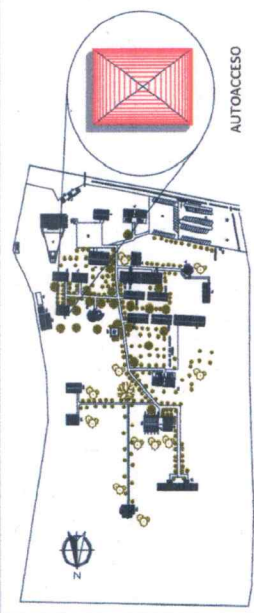


AUTOACCESO

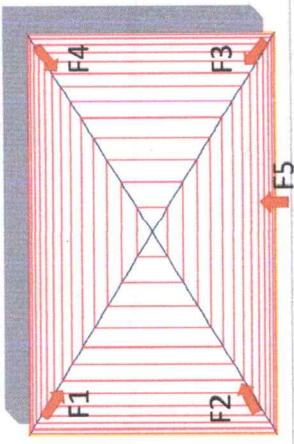

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapetec
Chihuitlan, Ciudad Ixtapetec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS





Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.



F2:

F1:

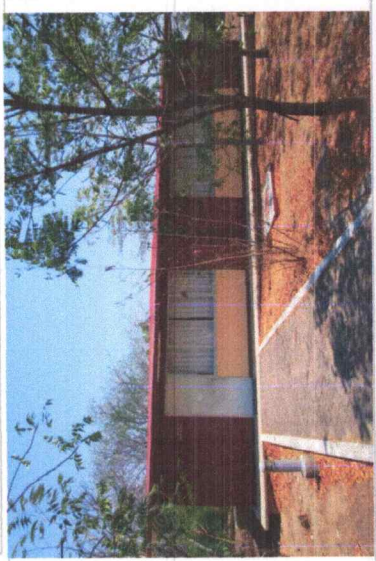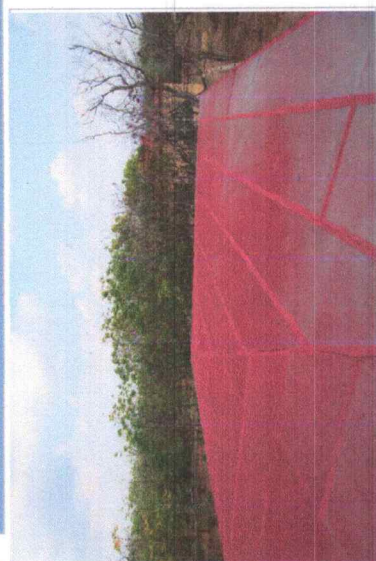

F4:

F3:

F5:

L.A.E. Cesar Fornueto Castellanos

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de las de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtapepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

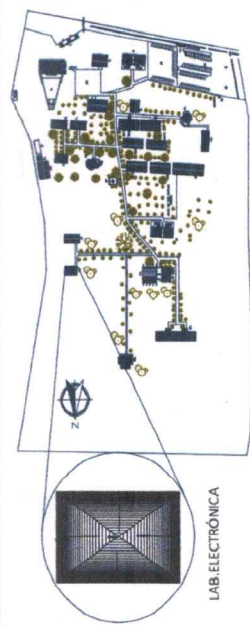

LAB. ELECTRÓNICA



F5

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapepec
Chihuitan, Ciudad Ixtapepec, Oaxaca CP. 70110

FOTOS



F1:




F2:



F3:



F4:

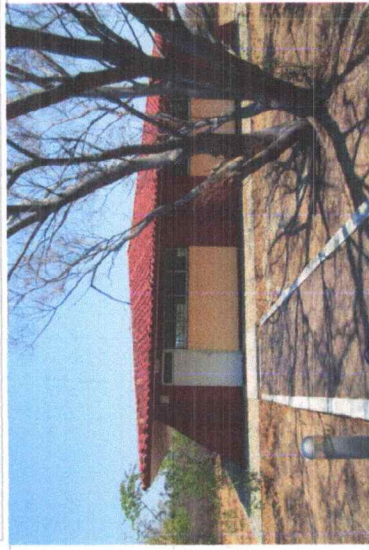

F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. A. E. Cesar Fortinatto García Curi

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomendará que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtapac.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AUDITORIO

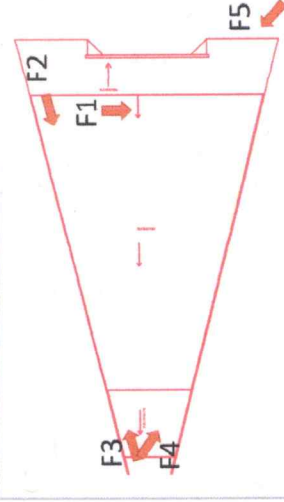


USUBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapac
Chihuahua, Ciudad Ixtapac, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS




F1:

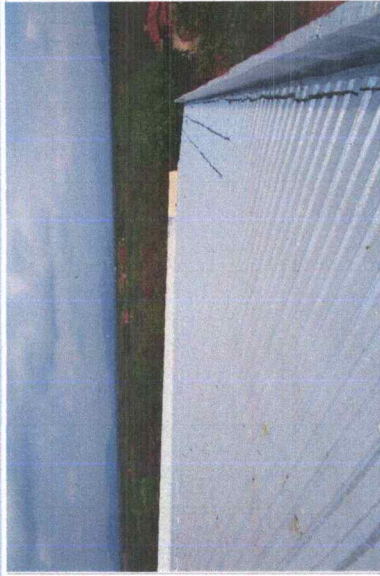


F2:



F3:

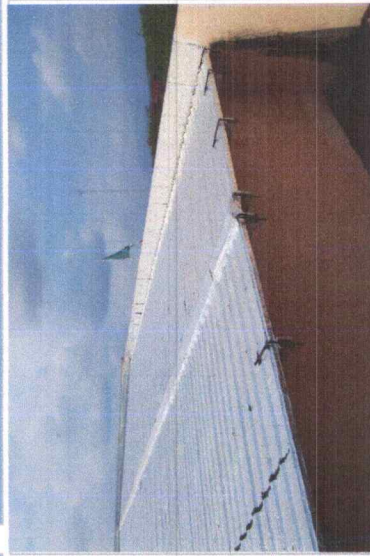

F4:

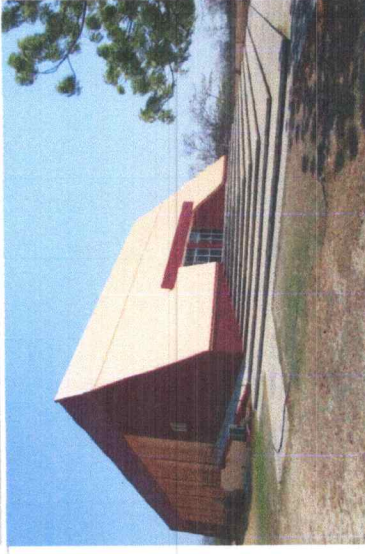

F5:

L. A. E. Cesar Fournier Castillo

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Estelanos García

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CONTEO: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-5

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtapepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

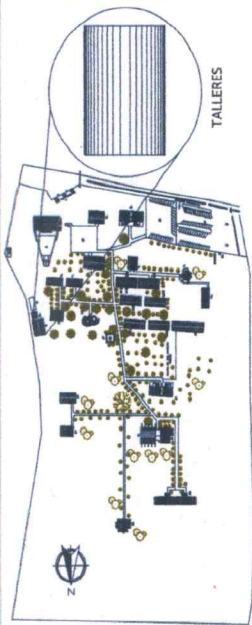

TALLERES

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapepec Chihuitán, Ciudad Ixtapepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS




F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

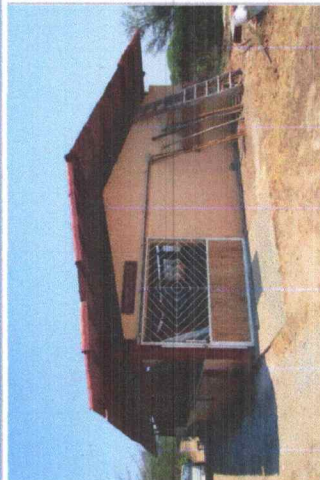

F3:



F4:



F5:

L. A. E. Cesar Fortulio Castro Cruz



Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García



Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

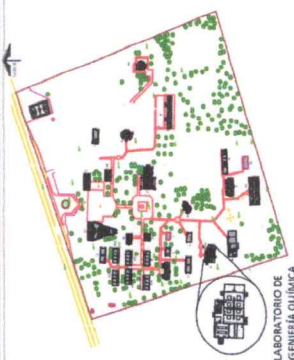P-6 Nombre de la obra: Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.
PROGRESO Porcentaje de avance 0	CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN  LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA
	

FOTOS

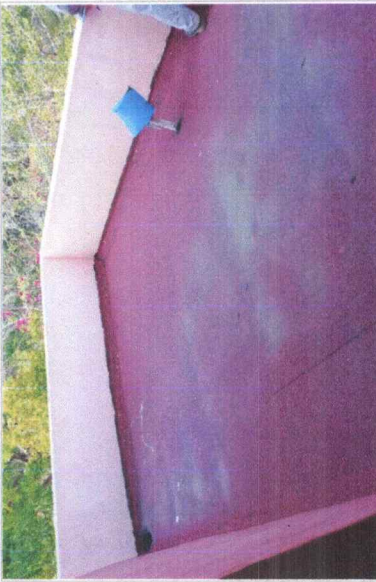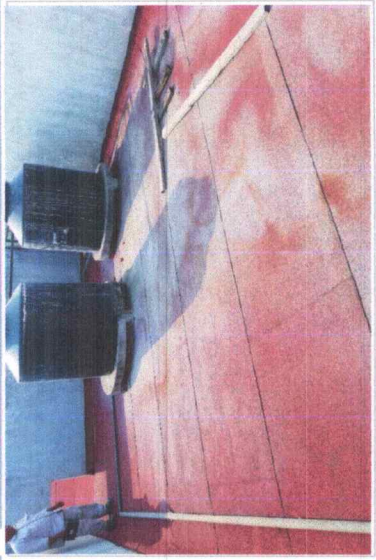 F1:	 F2:
 F3:	 F4:
Comentarios de los trabajos realizados: No se han realizado trabajos en la obra.	
F5: Ing. Víctor Castellanos García Nombre y firma del Responsable de Obras y Mantenimiento de la IES	

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


Proyecto

P-6

Nombre de la obra:


Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis


FOTOS

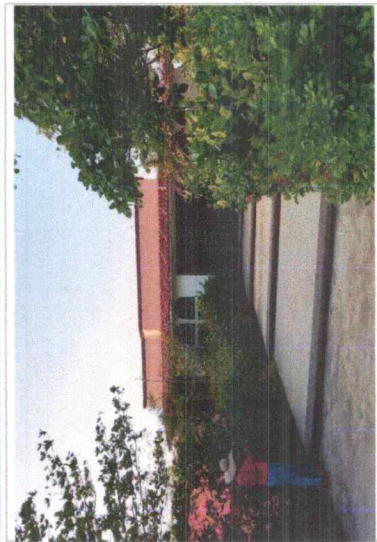

Comentarios de los trabajos realizados:


No se han realizado trabajos en la obra.

VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

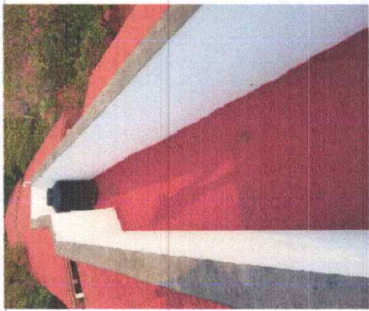

F2

F1

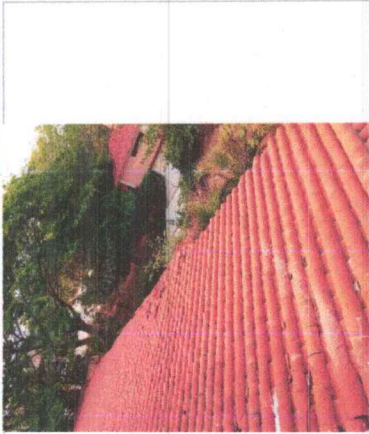

F3

L. A. E. Cesar Fortunato Ruiz Ocaña

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

Mes reportado

enero-marzo
FECHA DE FONTE: 31/03/2019



Porcentaje de avance

0



PROYECTO

P-6

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

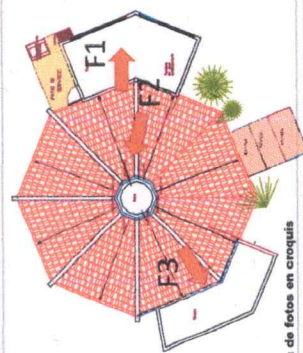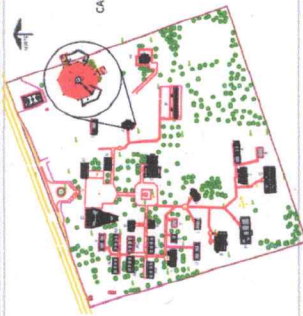

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



CAFETERIA




Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

F2



F3

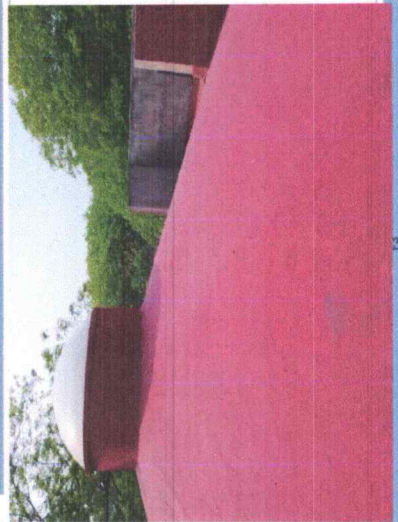

L. A. E. Cesar Fortunato Casero Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE COMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE 31/03/2020



Porcentaje de avance

0

PROYECTO

P-6


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

REPORTE FOTOGRAFICO


CREQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.


FOTOS

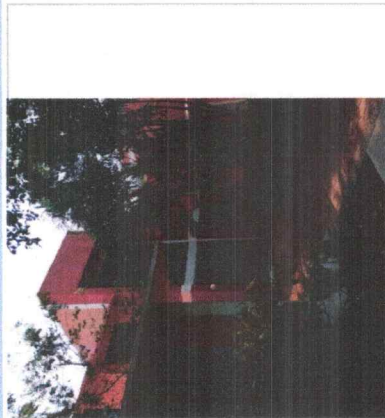

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

CUBICULO DE PROFESORES

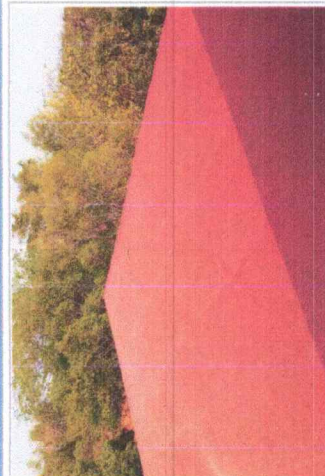

F2

L. A. E. Cesar Fortuño Carrasco

Nombre y firma del titular de la IES



F3

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para «equipo, mantenimiento y adecuaciones», en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRECEDENCIA

P-7


Nombre de la obra:

Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.


SISTEMA FOTOVOLTAICO ACTUALMENTE

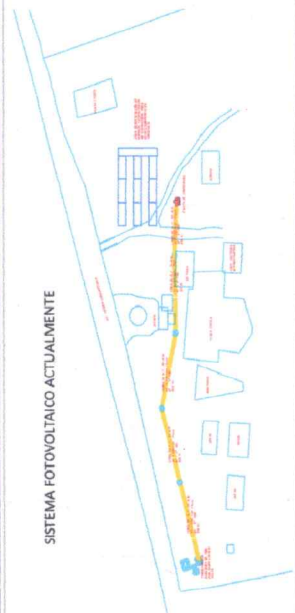


Porcentaje de avance

0


AMPLIACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO



FOTOS

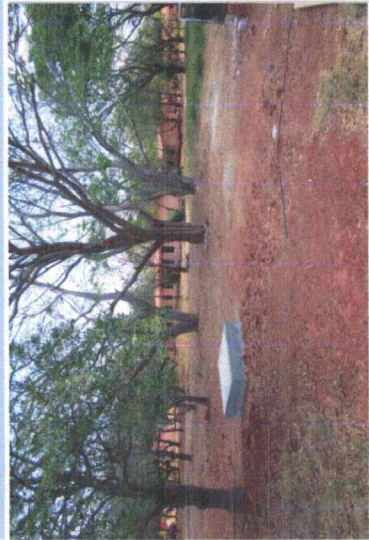


F1:

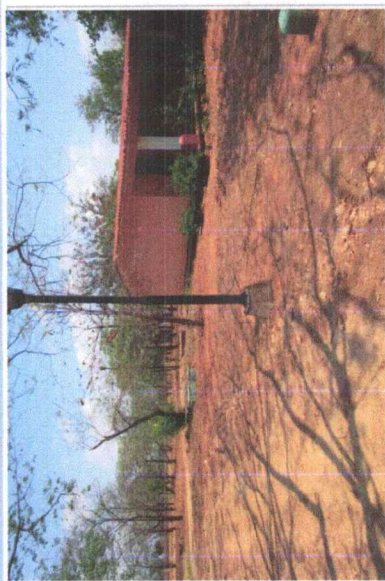


F2:



F3:

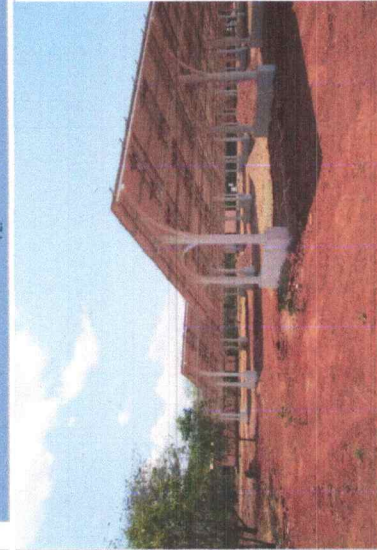

F4:

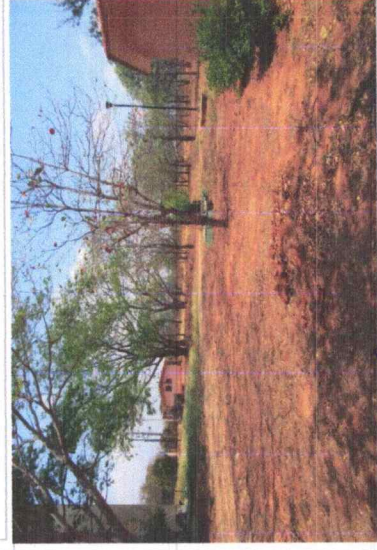

F5:

L. A. E. Cesar Fortino Casado Díaz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la IES y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


PROYECTO

P-8

Nombre de la obra:

Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

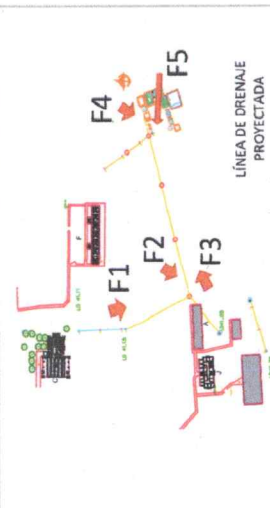

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.


FOTOS

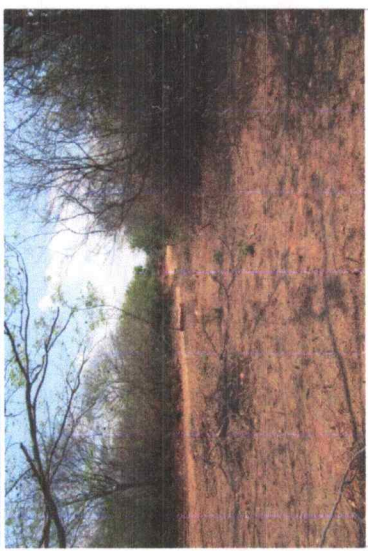

F1:




F2:

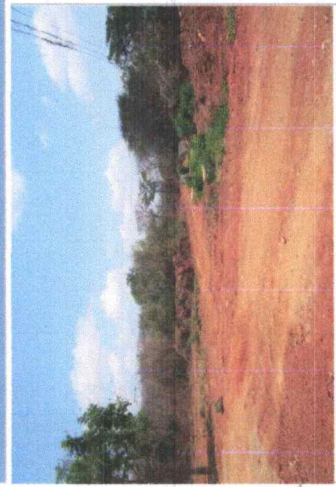

F3:



F4:

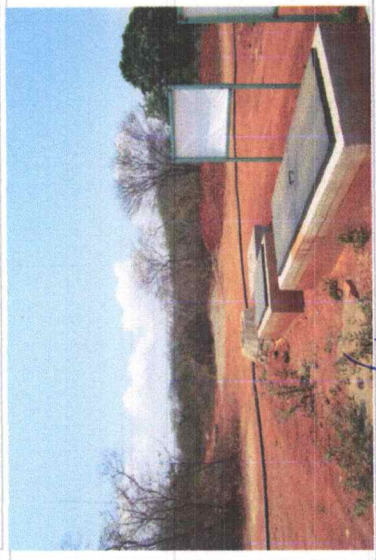

F5:

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.

L.A. E Cesar Fortunato Basalgaray

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Victor Hugo Peralta Los Garcia

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2020



Porcentaje de avance

0


P-3

Nombre de la obra:

Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

PROYECTO


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

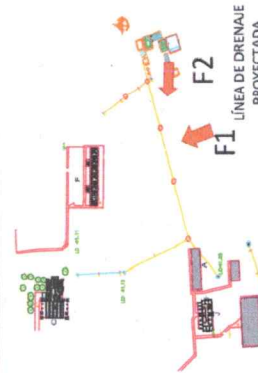


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

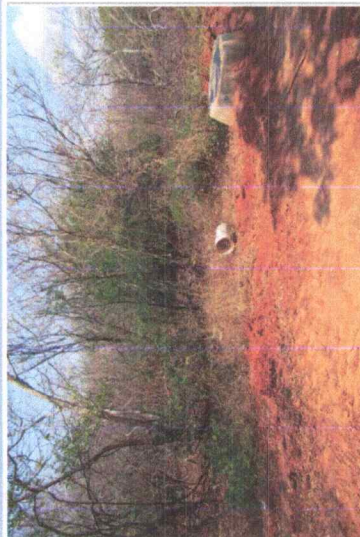

F1:

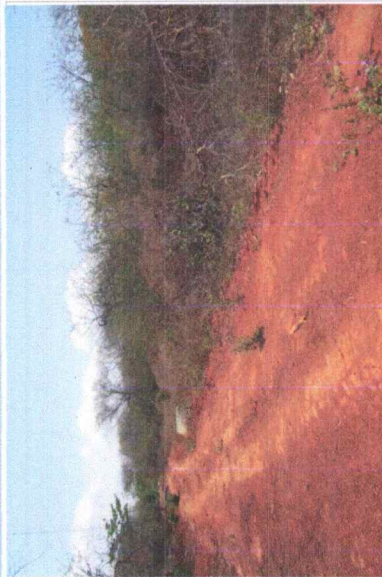

F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo, Oax.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
