

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad del Istmo.**

Entidad federativa: **Oaxaca.**

Clave del IES: **011:20MBU021P**

RESPONSABLES

Planación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández Cargo: Vice-rector de Administración. Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. *209 Correo electrónico: e_cortez@unistmo.edu.mx	Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García. Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento. Teléfono: 971 71 2 70 50 Ext. *209 Correo electrónico: coocavi@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Ya fue inaugurado?				
		Obras de continuidad	Equipamiento	Asesorías e impresos	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta físico)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción
7	Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.				X	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	\$ -	Sistema solar Interconectado de 56.09 kwv	8				100.0	03/10/19	31/03/20	Los trabajos se encuentran concluidos.	SI	No	---	SI	SI	\$6,600,000.00
									TOTAL	8	0.00												
									Biblioteca	1	1182.00												
8	Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.				X	\$ 230,250.00	\$ 230,250.00	\$ -					100.0	05/09/19	31/01/20	Los trabajos se encuentran concluidos.	SI	No	---	SI	SI	\$230,250.00	
									TOTAL	1	1182.00												
10	Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.	X				\$ 929,229.20	\$ 929,229.20	\$ -	Sala de Computo 1	2			100.0	12/11/19	15/01/20	Los equipos se encuentran instalados y funcionando correctamente.	SI	No	---	SI	SI	\$929,229.20	
									Lab. Electrónica	1													
									Autoacceso	2													
									Rectoría	1													
									Biblioteca	3													
									Auditorio	2													
									Vicerrectoría de Admon.	2													
									Módulo de Aulas Tehuantepec	4													
									Biblioteca Tehuantepec	1													
									Cub. De Profs. 1	1													
									Cub. De Profs. 2	1													
									Centro de Idiomas	1													
									Departamento de Red	1													
									TOTAL	22	0.00												
						\$7,759,479.20	\$7,759,479.20	\$0.00															

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se captaran los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio.
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100


3

Nombre de la obra: Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

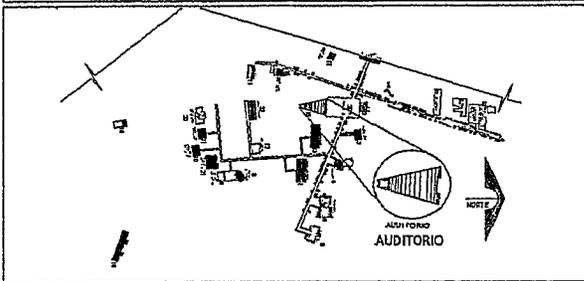


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

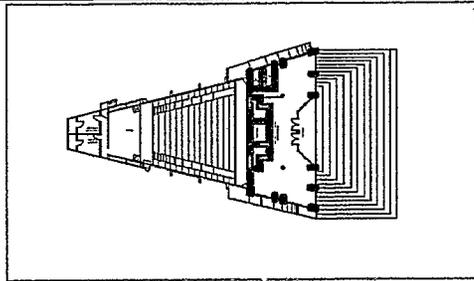


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS




F1:

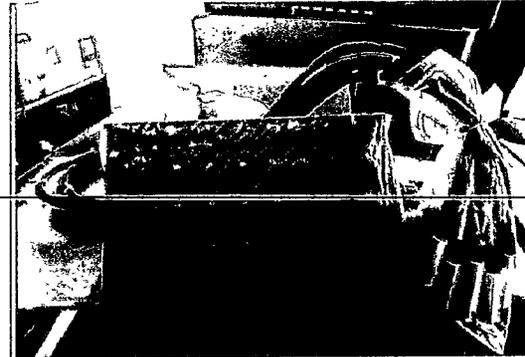


F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada

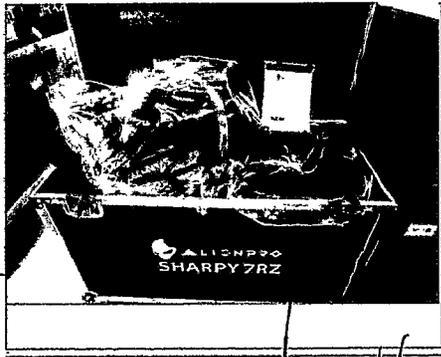

F3:

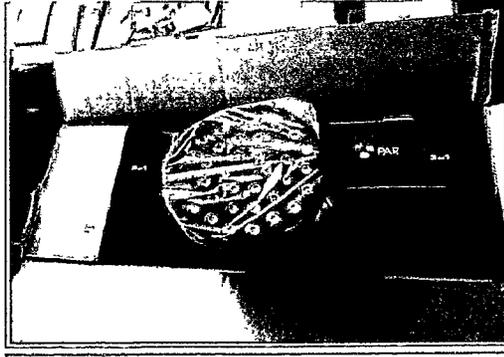

F4:

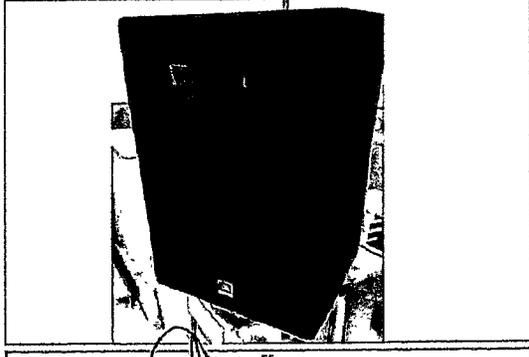

F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomendó que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio.
FIGURA DE CORTE: 00/04/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

97

1 Nombre de la obra: **Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**


CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN

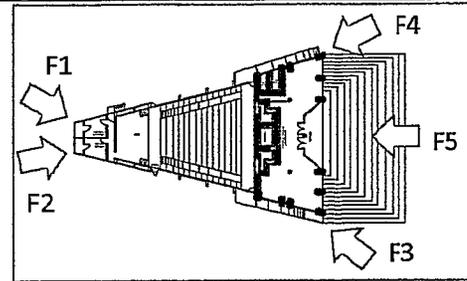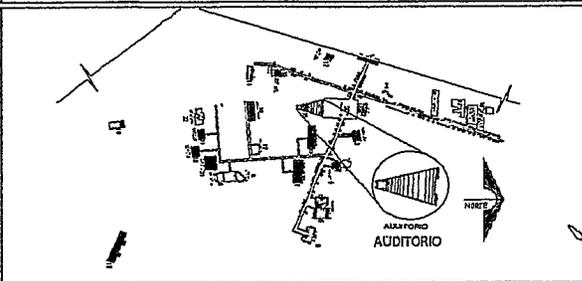

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS

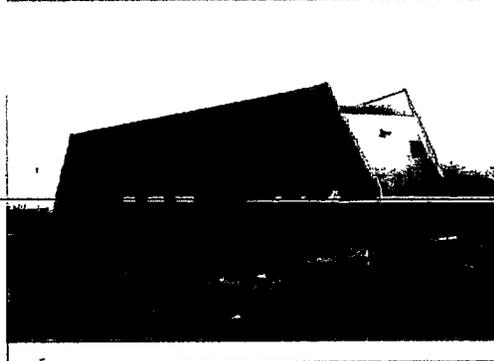


F1:




F2:


Comentarios de los trabajos realizados:
Trabajos de pintura.

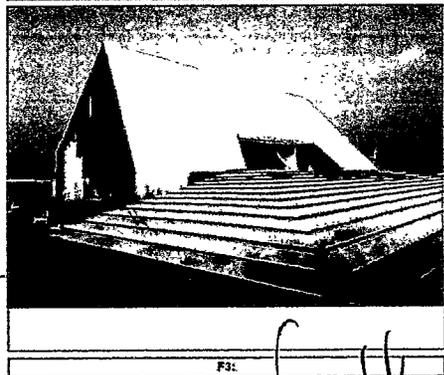

F3:

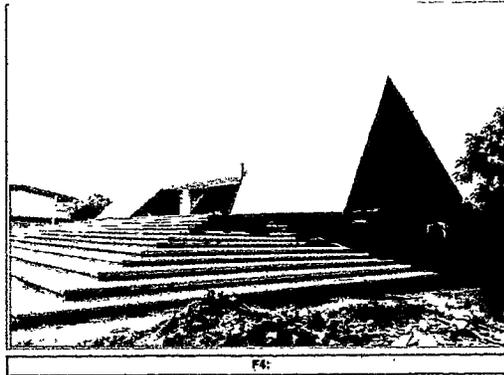

F4:

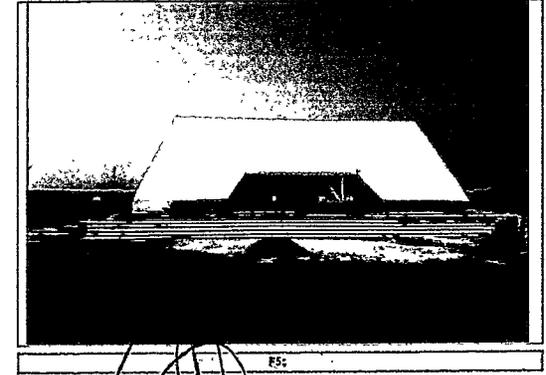

F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio.
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTODRAFICO





Porcentaje de avance

100

2 Nombre de la obra: **Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

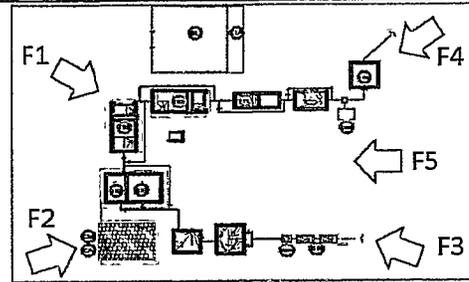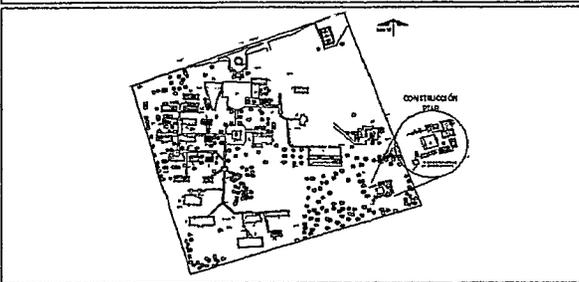


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




F1




F2

Comentarios de los trabajos realizados:
Otra terminada.

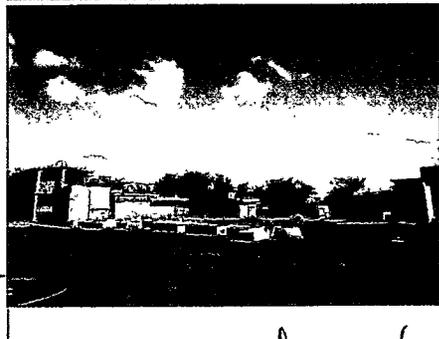

F3

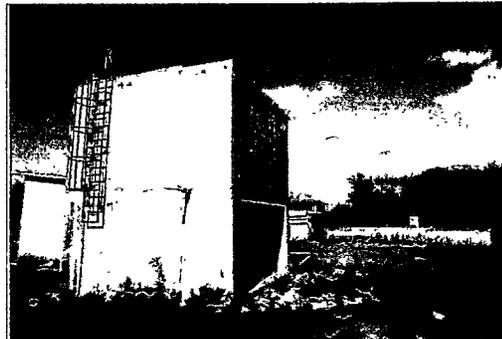

F4



F5

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Vido Hugo Cárdenas García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio.

FECHA DE CONTEXTO 08/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

3

Nombre de la obra: Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

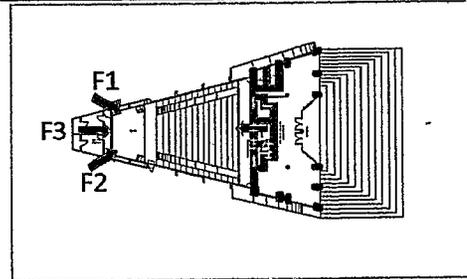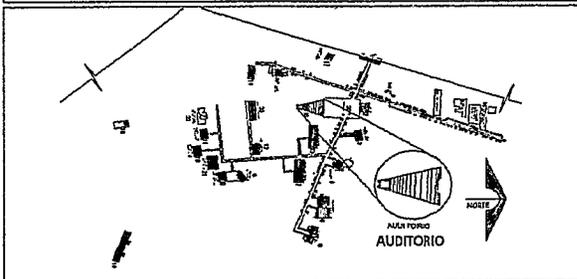


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transítmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1

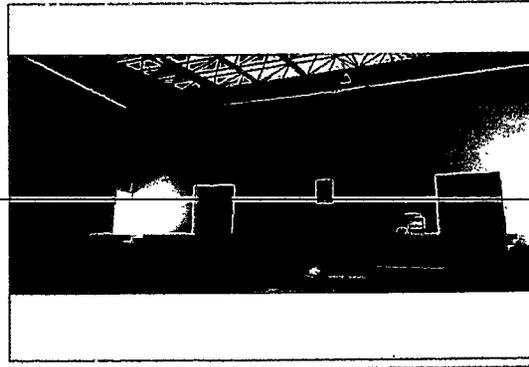


F2

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, se podrán copiar tantas pegatinas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA *
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio.
FECHA DE CURTE 30/06/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

3 Nombre de la obra: Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

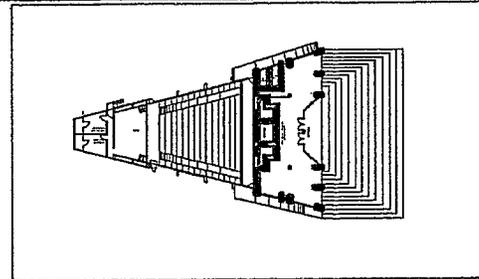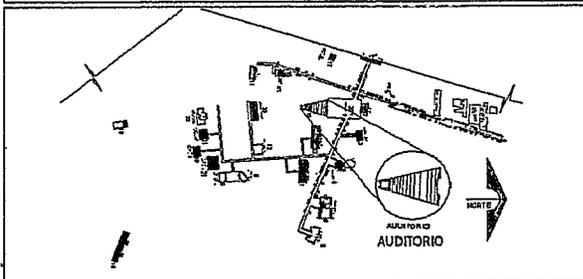

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS




F1:



F2:


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada

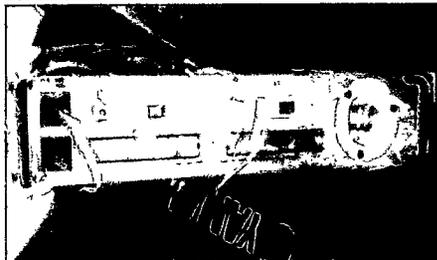

F3:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



F4:



F5:

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio.
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

3 Nombre de la obra: Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

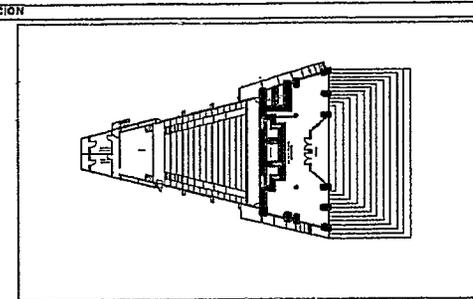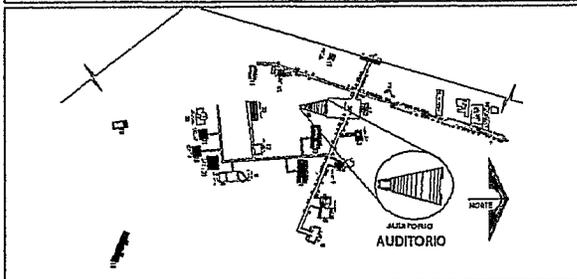


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1C

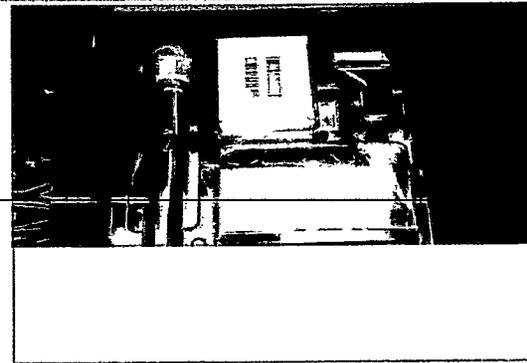


F2

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada



F3



F4

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada

F5

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Rodríguez García

Nombre y firma del Titular de las Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE EXISTENCIA 05/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

98

Nombre de la obra: **Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

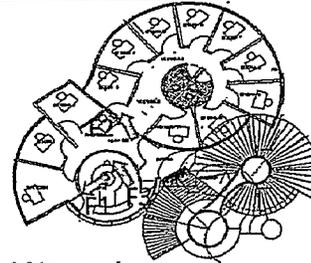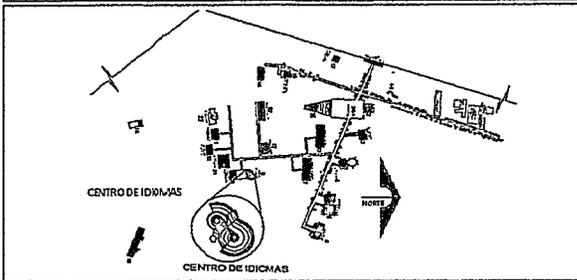


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transísmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
Trabajos de pintura.



L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Fidel Castañero Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance



98

UNISTMO

5

Nombre de la obra: **Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

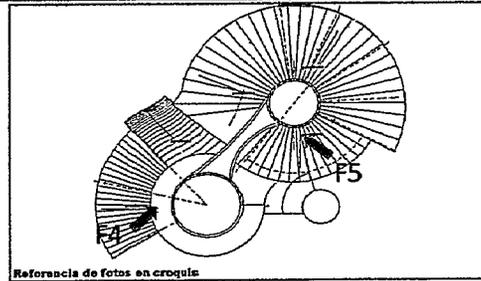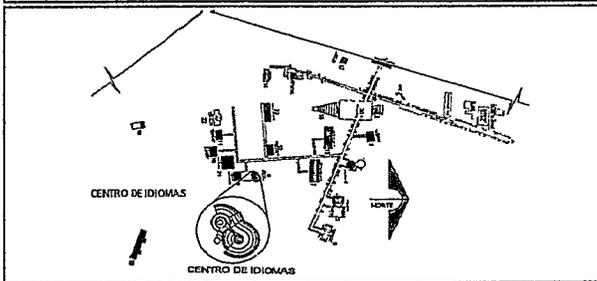


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La Ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos de pintura.

L. A. E. Cesar Fortunato Castilla Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras / Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


100

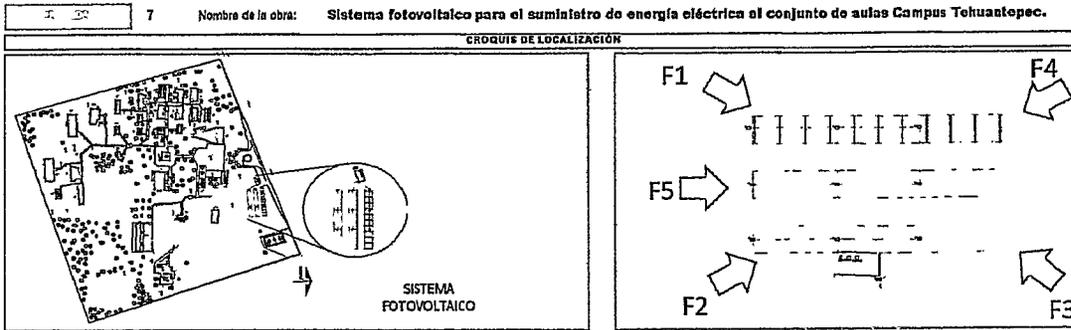

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70780, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

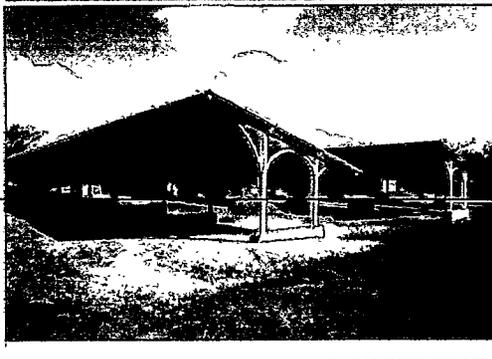

F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F3:



F4:



F5:

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castañeda García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AFG

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

9

Nombre de la obra: Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CRQUIS DE LOCALIZACION

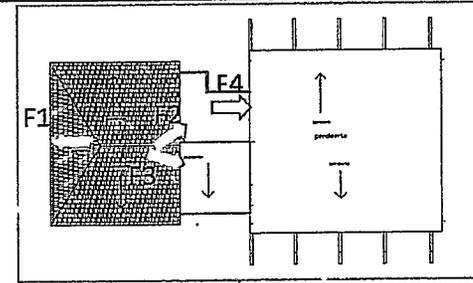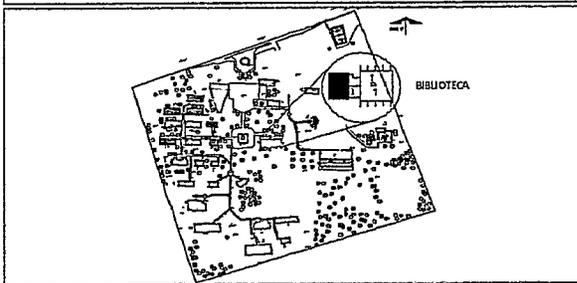

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




BIBLIOTECA




F1


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance



100

67

10

Nombre de la obra: Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

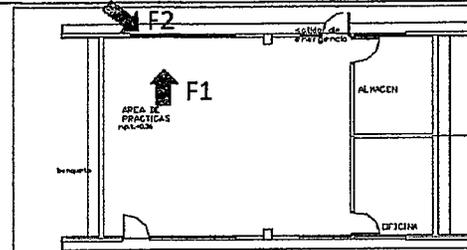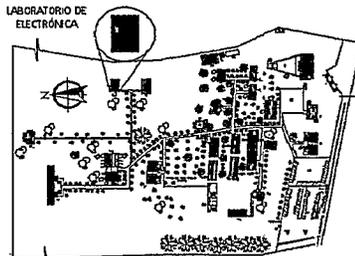


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

#REF1

FOTOS




LABORATORIO DE ELECTRÓNICA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra terminada



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

10

Nombre de la obra: Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Itepec.


CRUCES DE LOCALIZACIÓN

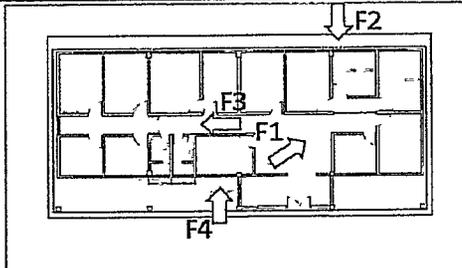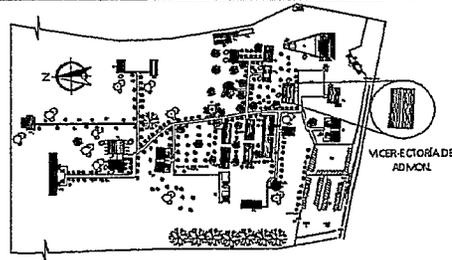


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

#REF!


FOTOS



VICERECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



F1



Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Corón Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castañeros García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FICHA DE CORTE: 30042600

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.**


CRUQUE DE LOCALIZACIÓN

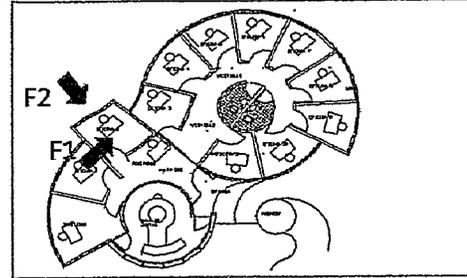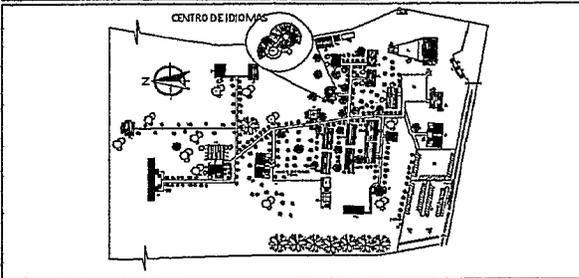


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitars-Istepec S/N, Ciudad Istepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CENTRO DE IDIOMAS



F1

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.



F2

L. C. E. Eugenio Andrés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Blank space for additional comments or notes.

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Itepec.**

croquis de localización

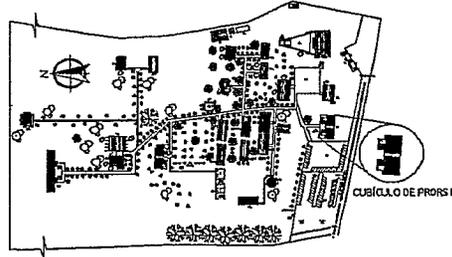


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chiluitán-Itepec S/N, Ciudad Itepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

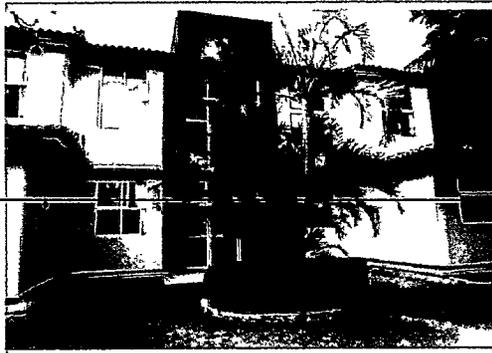

CUBICULO DE PROFRS I



F1: SALA DE JUNTAS

Comentarios de los trabajos realizados:
Otra terminada.



F2

L. C. E. Eugenio Celis Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Arce Aguirre
Nombre y firma del Titular de Cursos y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe recode fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 31/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

100


10

Nombre de la obra: Suministro e instalación de ciimas en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

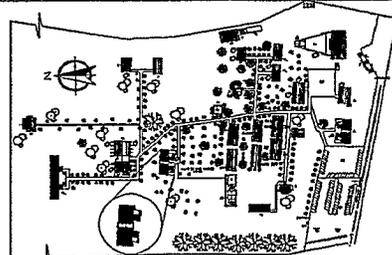

CUICULO DE PROFES II



SALA DE JUNTAS

F1

F2


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtpec S/N, Ciudad Ixtpec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CUICULO DE PROFES I



(A)

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



(B)

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Carreras García

Nombre y firma del Titular del Área de Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y educaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE DATE 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance


100

10 Nombre de la obra: Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

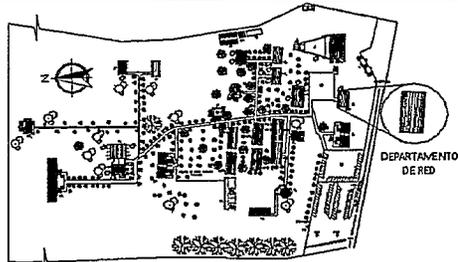

DEPARTAMENTO DE RED




Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chiuñta-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

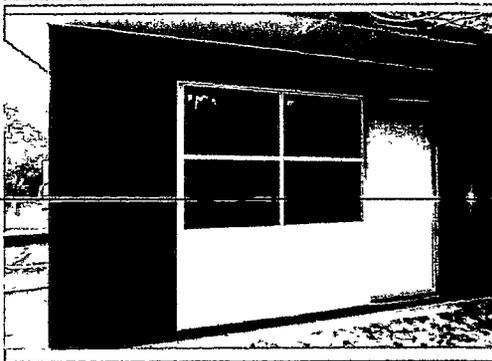

EDIFICIO DE RECTORÍA



F2: DEPARTAMENTO DE RED

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra terminada.



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castaños García

Nombre y firma del Titular de obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance


100

10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AULAS DE DOS NIVELES

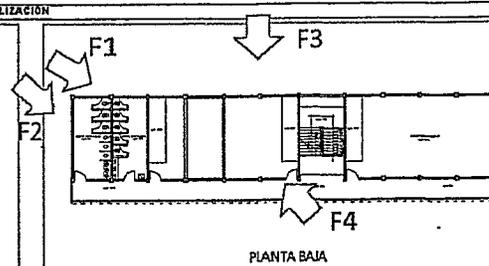

PLANTA BAJA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.



F3:

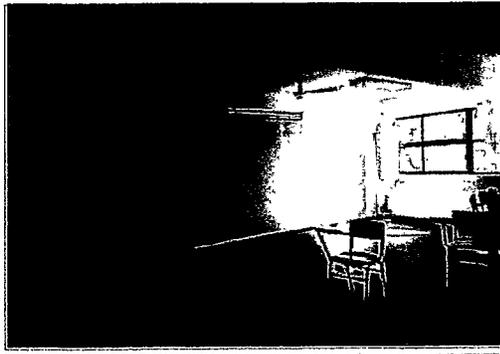

F4: AULA 2F

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Vicio Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


100

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AULAS DE DOS NIVELES



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.



FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.



L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

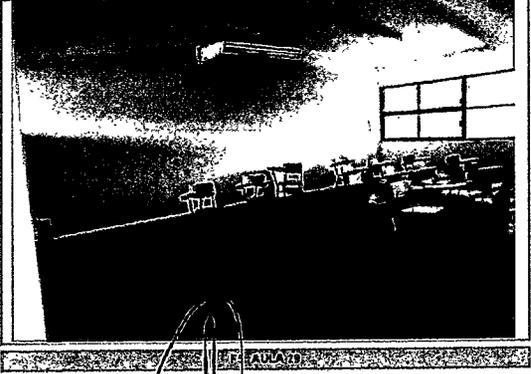

Ing. Víctor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE 30/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100


10

Nombre de la obra: Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus htopec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

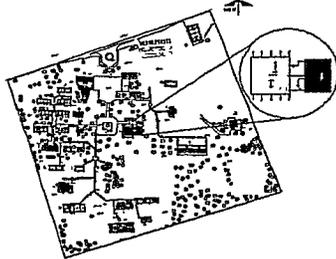

BIBLIOTECA

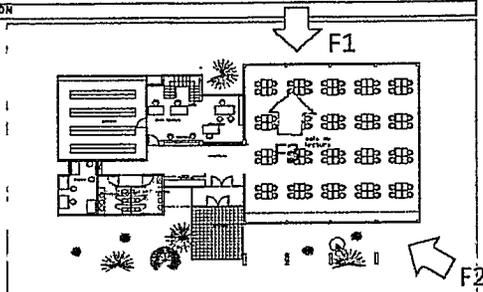


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:

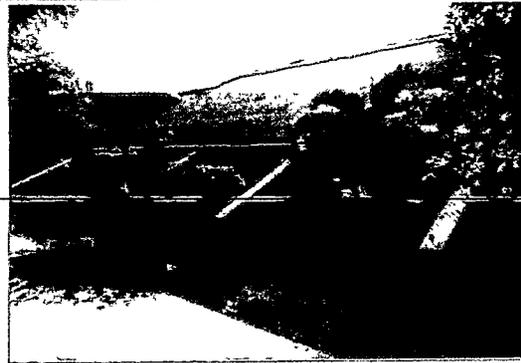


F2:

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.



F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castañeda García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pasta, se podrán copiar tantas pastas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FIRMA DE CORTÉS 20190620

REPORTÉ FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de alicmas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

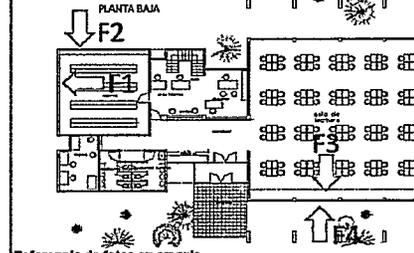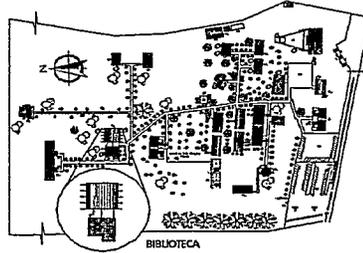


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chiluitán-Ixtepéc S/N, Ciudad Ixtepéc, Oax.
México C.P. 70110.

FOTOS

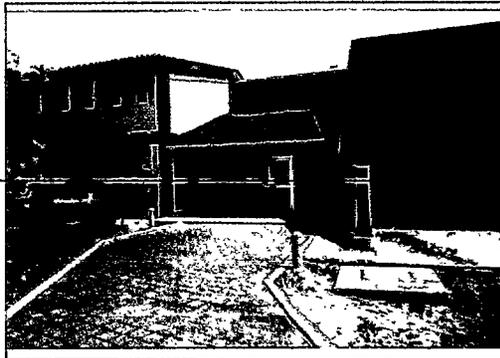


F1: BIBLIOTECA

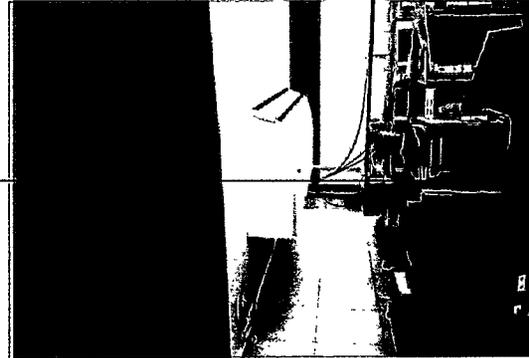


F2: ACERVO PLANTA BAJA


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.

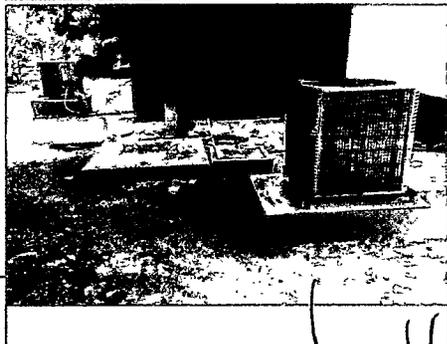

F3



F4: SALA DE LECTURA PLANTA BAJA



F5

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

100


10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

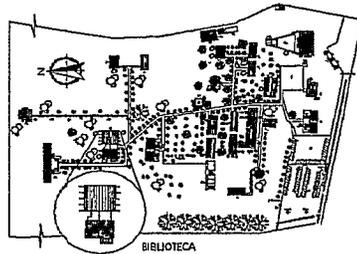

BIBLIOTECA




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

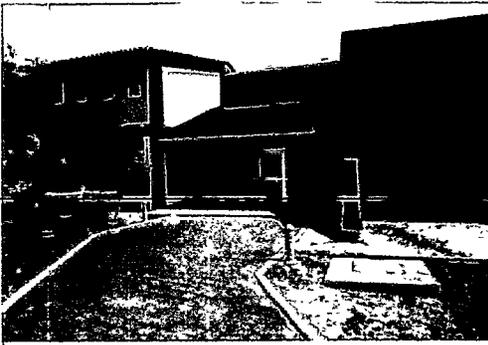


BIBLIOTECA



F1: ACERVO PLANTA ALTA

Comentarios de los trabajos realizados:


Obraterminada.

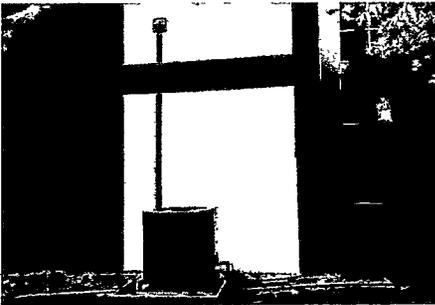

F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

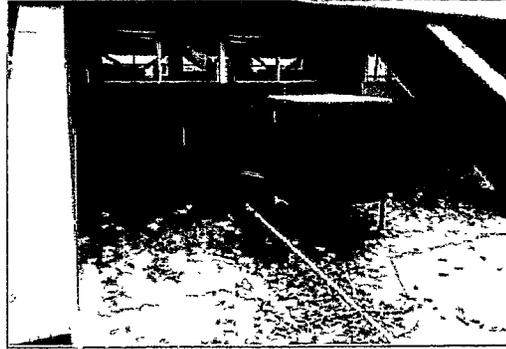

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de obra y mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CRUCIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



LABORATORIO DE AUTOACCESO

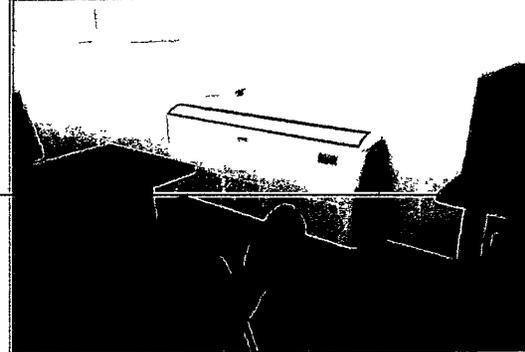


F1

Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Cabezas García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafina, se podrán copiar tantas pastafinas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE DATE: 03/06/2019

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra: Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

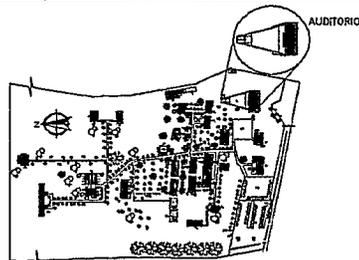


Referencia de fotos en croquis


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Istepec S/N, Ciudad Istepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

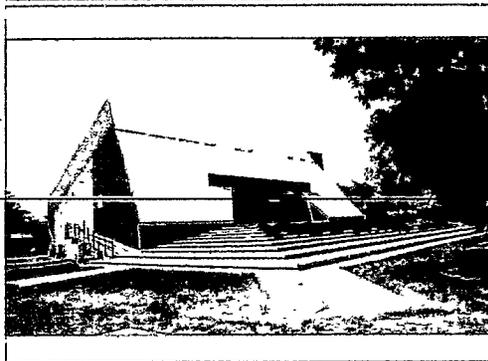

F1 AUDITORIO

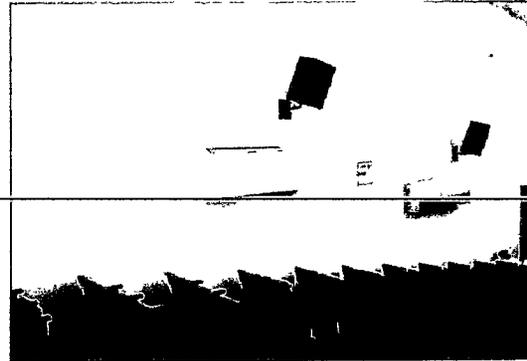

F2


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada



F3



F4

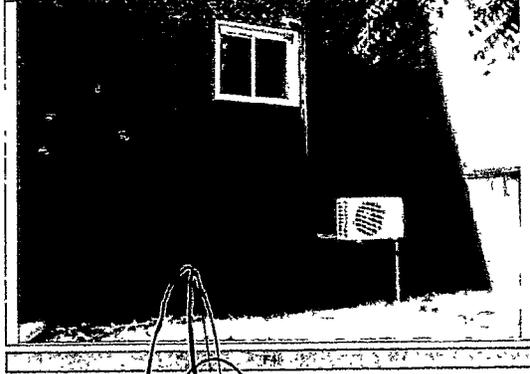

F5

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE VORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

100


10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

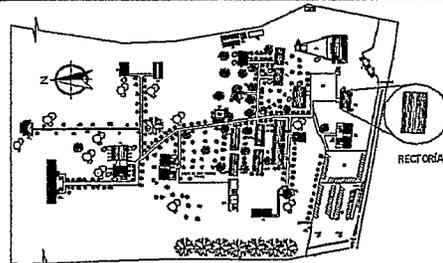

F2




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

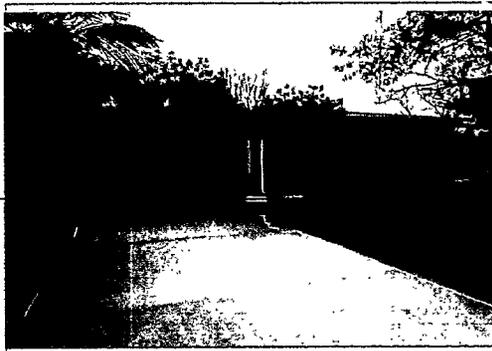


EDIFICIO DE RECTORIA

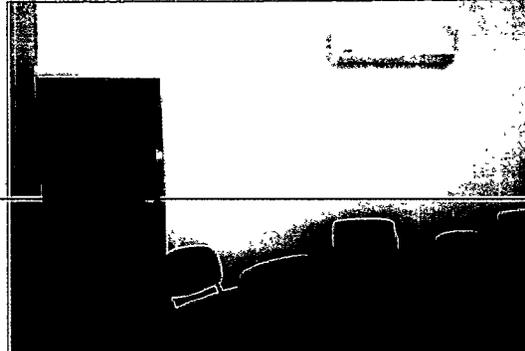

F2: SALA DE JUNTAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas.

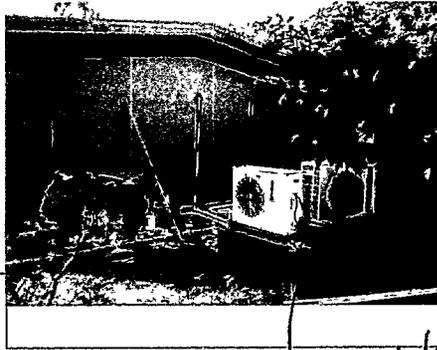

F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castañeras García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
abril-junio
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

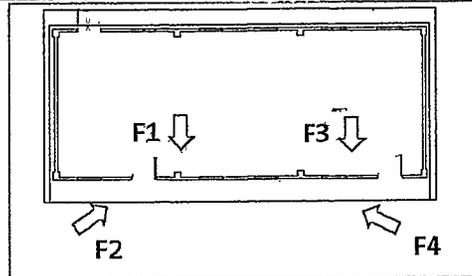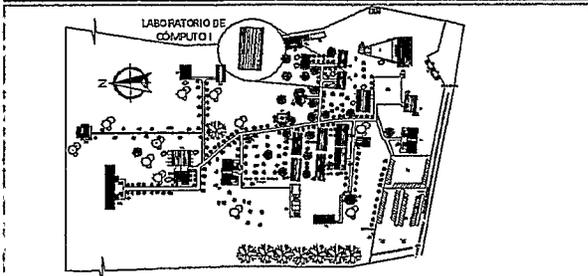

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitas-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

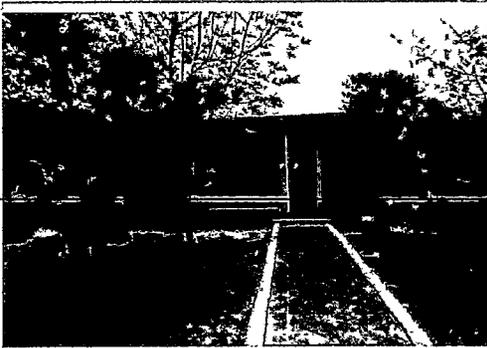

SALA DE COMPUTO 1




F1


Comentarios de los trabajos realizados:
Obra terminada.



F2

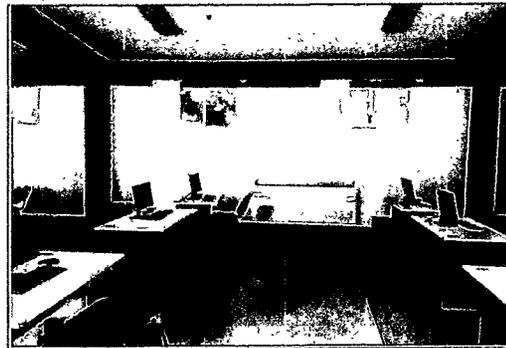

F3

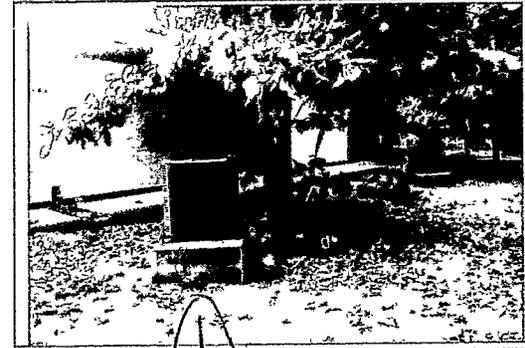

F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castañeros García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
