

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca.

Clave Inst 911: 20MSU0021P

RESPONSABLES

Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Cargo: Vice-rector de Administración

Teléfono: 971 72 270 50 Ext. *308

Correo electrónico: e_cesa@unistmo.edu.mx

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García.

Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.

Teléfono: 971 71 270 50 Ext. *309

Correo electrónico: vcastellanos@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Reasignante	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1			Acciones que sustentan el avance 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas												
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Reconstrucción y restauración	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Ingreso)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa							
P-5	Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.																	No No está concluida.	No		No	No	No								
		GLOBAL DEL PROYECTO																													
P-6	Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec, 2a. Etapa.																	No No está concluida.	No		No	No	No								
		GLOBAL DEL PROYECTO																													
P-7	Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.																	No No está concluida.	No		No	No	No								
		GLOBAL DEL PROYECTO																													
P-8	Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.																	No No está concluida.	No		No	No	No								
		GLOBAL DEL PROYECTO																													

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos realizados, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd/mm/aa.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca.

Clave Inst: 911: 20MSU021P

RESPONSABLES

Planeación

Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Cargo: Vice-rector de Administración.

Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. *208

Correo electrónico: e_cesa@unimio.edu.mx

Obras y Mantenimiento

Nombre: Ing. Victor Hugo Castellanos García.

Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.

Teléfono: 971 71 2 70 50 Ext. *309

Correo electrónico: cocsa@unimio.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Entidad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Causas)	Ya fue inaugurado?		Cuenta con Actas						
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Proyecto sustentable	Mantenimiento				Atención a personas	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inaugural)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa			
P-5	Rehabilitación impermeabilización de las de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Itepec.	X			\$ 1,982,910.00	\$ -	\$ 1,982,910.00	GLOBAL DEL PROYECTO										La obra se encuentra en proceso de Licitación por parte de la institución.	No No está concluida.	No		No	No	No	No		
								Cenaro de Idiomas	1	178.98																	
								Cubs Profs	1	348.81																	
								IECA	1	348.81																	
								Biblioteca	1	600.00																	
								Cafetería	1	180.00																	
								Pórtico	1	200.00																	
								Depto Profs	1	509.88																	
								Vicerrectoría Administrativa	1	332.01																	
								Autoacceso	1	284.83																	
								Lab Electrónica	1	132.31																	
Auditorio	1	602.43																									
Talleres	1	234.00																									
								TOTAL	11	3,925.82																	
P-6	Rehabilitación impermeabilización de las de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	X			\$ 788,868.77	\$ -	\$ 788,868.77	Cafetería	1	259.81											La obra se encuentra en proceso de Licitación por parte de la institución.	No No está concluida.	No		No	No	No
								Vicerrectoría Académica	1	294.04																	
								Lab Ing Química	1	78.84																	
								Cubs Profs.	1	343.12																	
																TOTAL	4	775.61									
P-7	Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	X			\$ 1,519,787.44	\$ -	\$ 1,519,787.44	Excavación para Línea de Cable Inverso	1	45.05											La obra se encuentra en proceso de Licitación por parte de la institución.	No No está concluida.	No		No	No	No
								Excavación para Línea de Cable	1	36.00																	
								Climas	5	Pza																	
								Luminarias	5	Pza																	
								Climas	8	Pza																	
																TOTAL	15	81.05									
P-8	Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	X			\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	Red Sanitaria	1	270.00											La obra se encuentra en proceso de Licitación por parte de la institución.	No No está concluida.	No		No	No	No
																TOTAL	1	270.00									

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

En esta sección se redacta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el reporte fotográfico.

Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0

C.A.

P-1

Nombre de la obra: Construcción de un edificio de nuevas aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

DIBUJO DE LOCALIZACIÓN

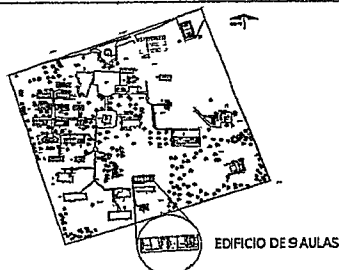

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

Año

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE 30/04/2020

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0


P-1

Nombre de la obra:

Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN


EDIFICIO DE 9 AULAS



F1

F3

PLANTA ALTA

F2

F4

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
 Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
 Oaxaca, México.

FOTOS


F1:



F2:



F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Salazar García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma tema, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO






Porcentaje de avance

0

P-2

Nombre de la obra: Demolición y construcción del almacén de la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

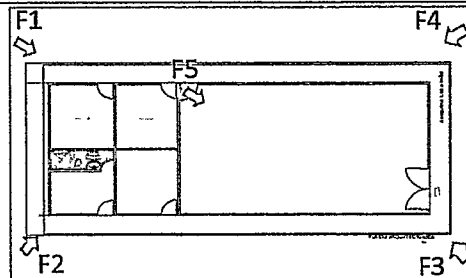CONSTRUCCIÓN
ALMACÉN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitán,
Ciudad Ixtotec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

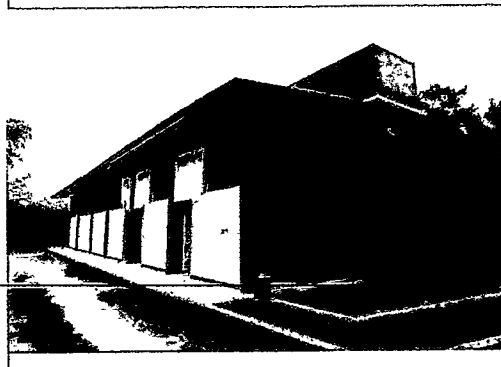

F1




F2

Comentarios de los trabajos realizados:


No se han realizado trabajos en la obra.



F3

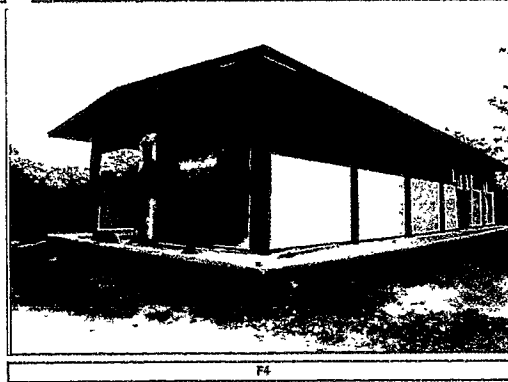

F4

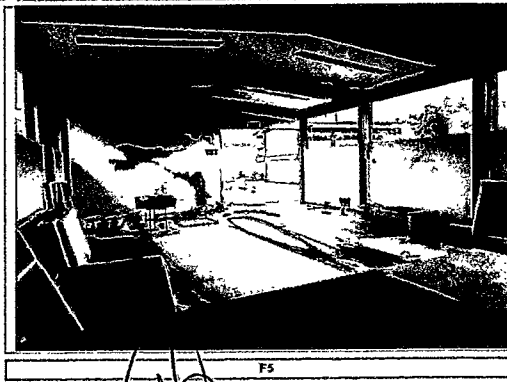

F5

L. C. E. Eusebio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Ortiz Torres García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CONTABILIZACIÓN

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0

P-3

Nombre de la obra:

Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtapac.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

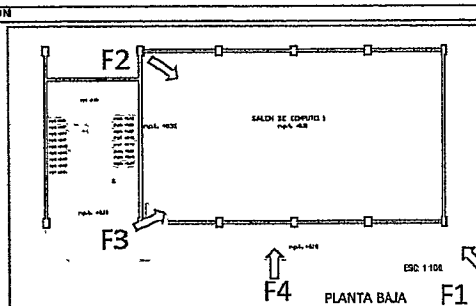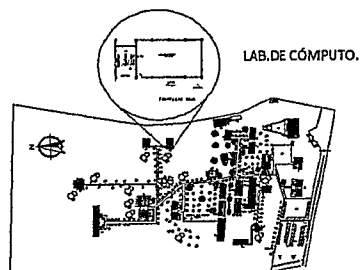

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapac
Chihuitán, Ciudad Ixtapac, Oaxaca, CP. 70110


FOTOS



F1:



F2:

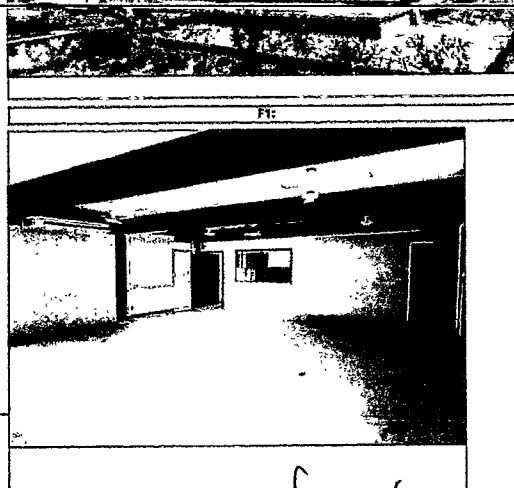

F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Cortés García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE PORTE: 04/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0



Código

P-3

Nombre de la obra:

Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

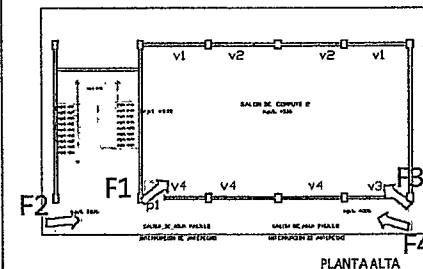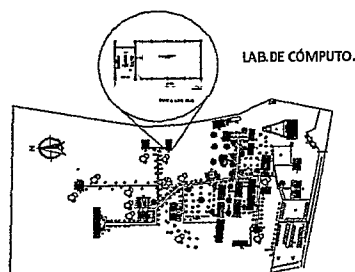

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtpec-Chihuitán, Ciudad Ixtpec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

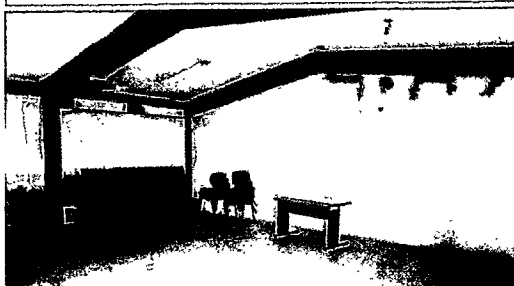


F1:



F2:



F3:

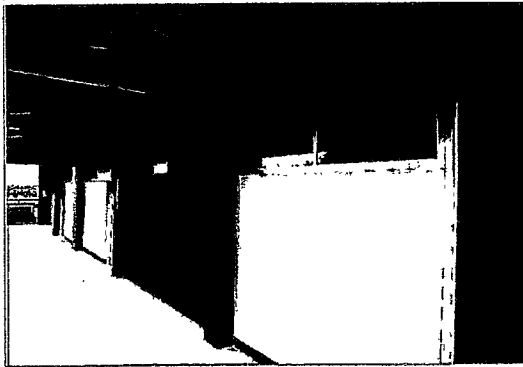

F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Edgar Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma de Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

0

P-4 Nombre de la obra: Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

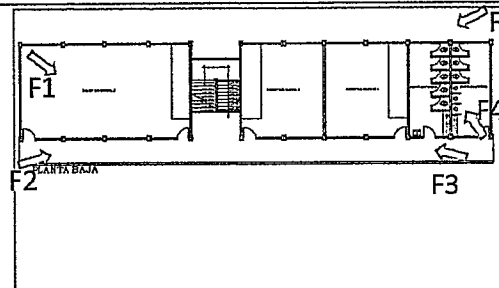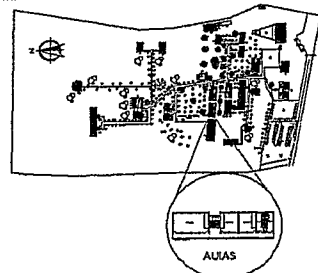

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec
Chihuitán, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:


No se han realizado trabajos en la obra.



F3



F4

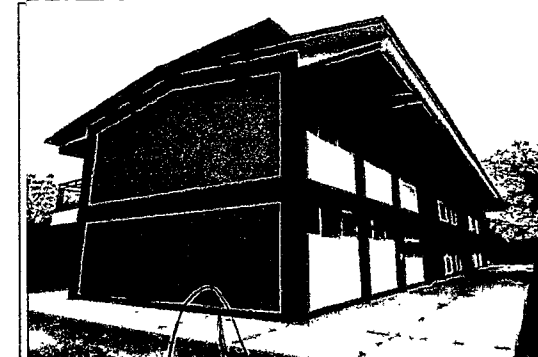

F5

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AUG

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

0


CICLO I

P-4


Nombre de la obra:

Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Ixtapepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

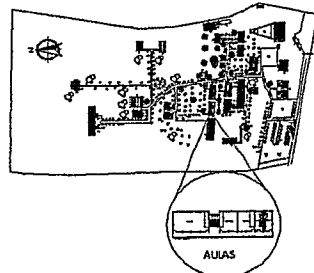

AULAS




F2 PLANTA ALTA

F3

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapepec
Chihuitan, Ciudad Ixtapepec, Oaxaca, CP. 70110


FOTOS

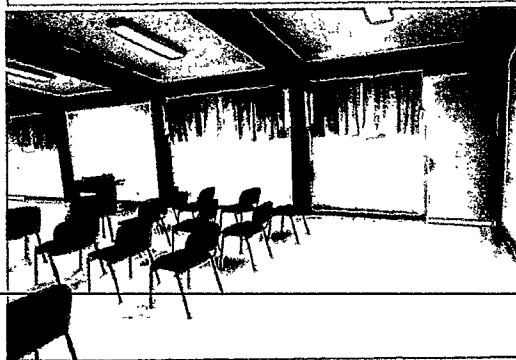

F1



F2

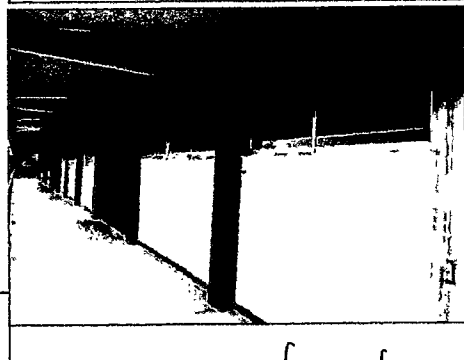

F3

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

ANO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

P-5

Nombre de la obra: Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

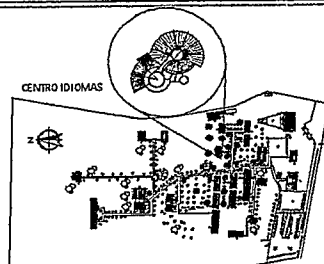

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtpec Chihuitán,
Ciudad Ixtpec, Oaxaca, CP. 70110


FOTOS




F1:



F2:

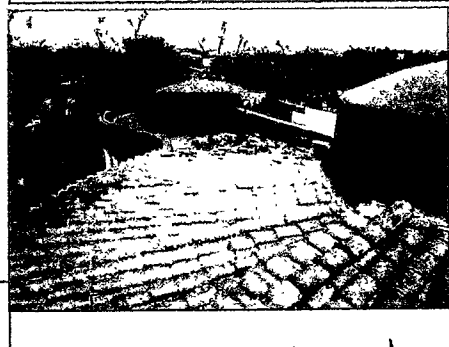

F3:

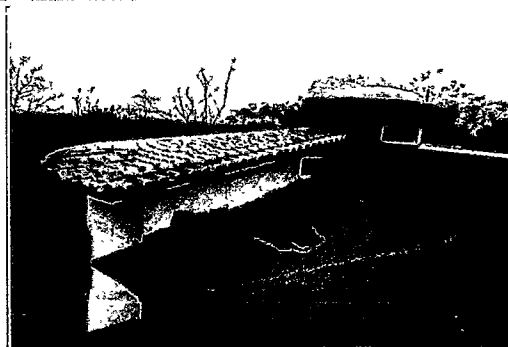

F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pesetina, se podrán copiar tantas pesetinas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance



0

P-5

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

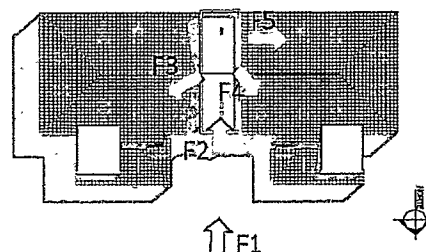INSTITUTO DE ESTUDIOS
CONSTITUCIONALES Y
ADMINISTRATIVOS (IECA)

F1


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtpec Chihuitán,
Ciudad Ixtpec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS




F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

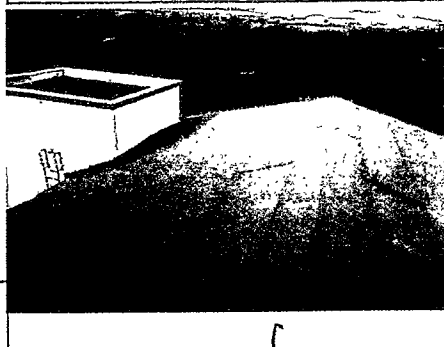

F3



F4



L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
abril-junio
 FECHA DE CURRIR: 30/06/2020


REPORTE FOTOGRAFICO


Porcentaje de avance


0

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtapepec.
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


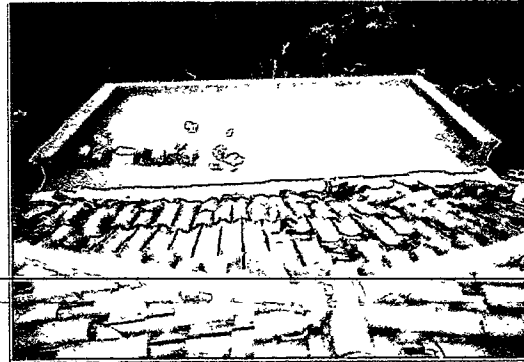
BIBLIOTECA

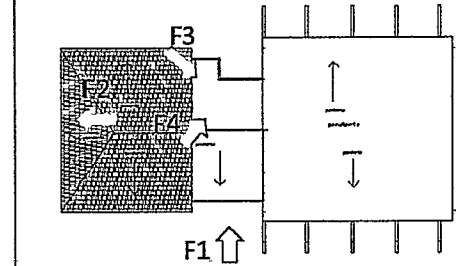
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


 Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapepec Chihuahua.
 Ciudad Ixtapepec, Oaxaca. CP. 70110

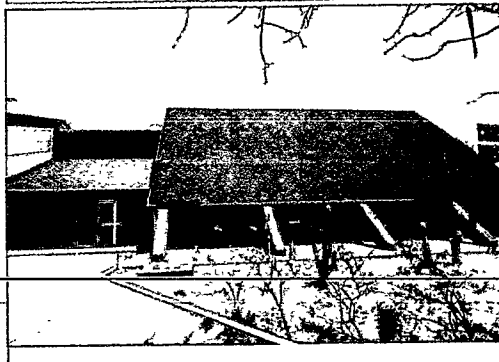FOTOS


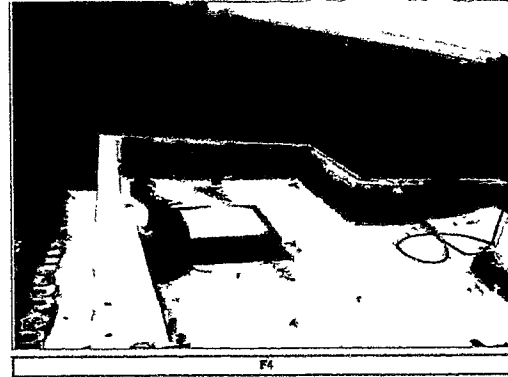
F1



F2

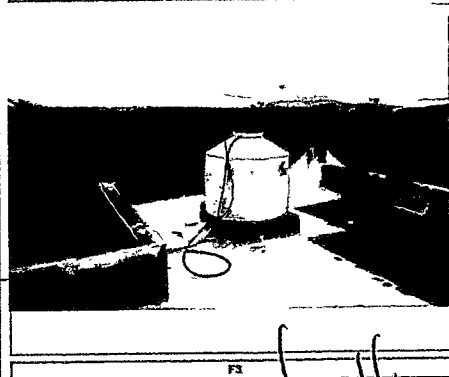

F3



F4

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
abril-junio
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Porcentaje de avance


0

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

GRUPO DE LOCALIZACIÓN




PÓRTECO DE ACCESO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


 Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitán,
 Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

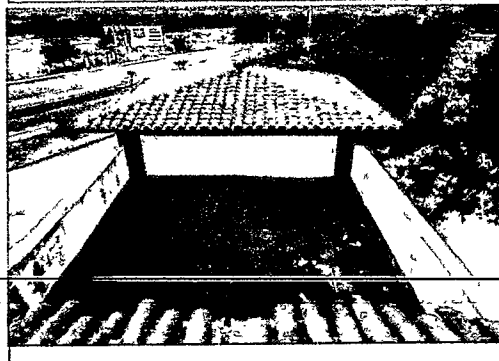FOTOS


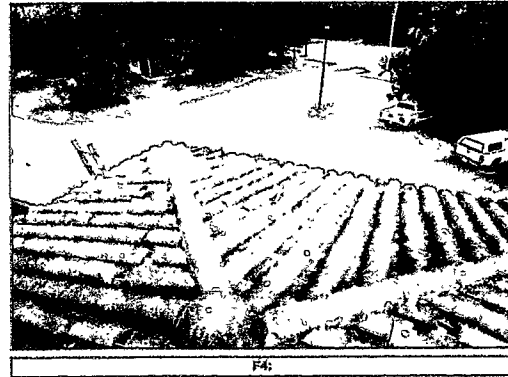
F1:

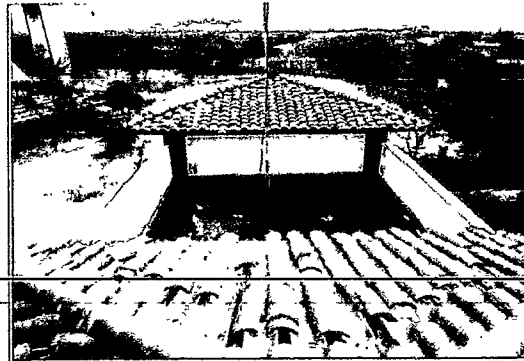

F2:

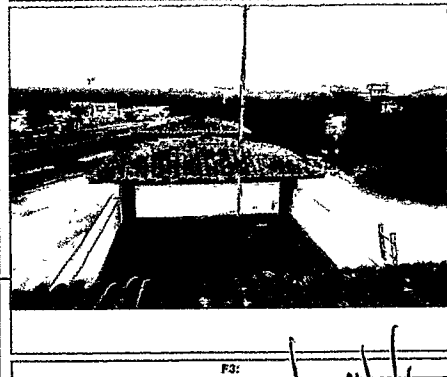

F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0

P-5

Nombre de la obra:

Rehabilitación e Impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec.

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN


DEPTO. DE
PROFESORES

F1


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec Chihuitan,
Ciudad Istepec, Oaxaca. CP. 70110


FOTOS

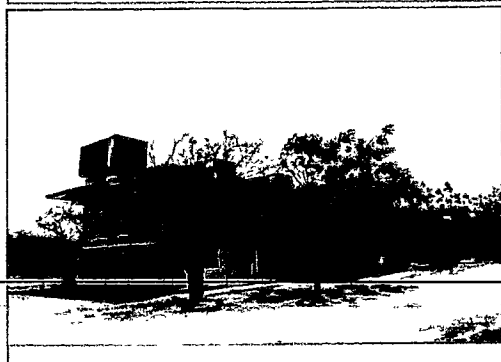

F1:

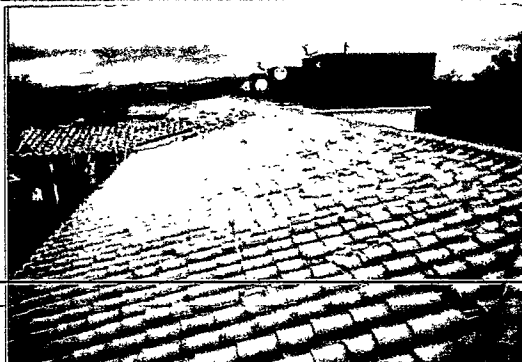

F2:

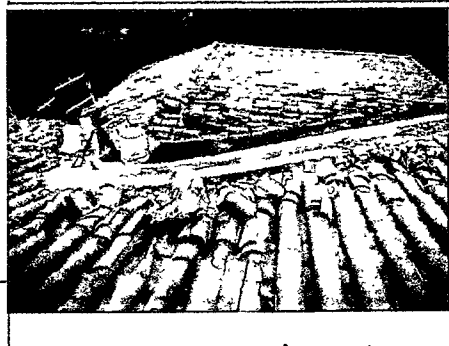

F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castañeda García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020 AÑO	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado abril-junio FECHA DE CORTE: 30/06/2020										
REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL													
 Porcentaje de avance 0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">P-5</td> <td style="width: 90%;"> Nombre de la obra: Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec. </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec Chihuitán, Ciudad Istepec, Oaxaca. CP. 70110 </td> </tr> </table>			P-5	Nombre de la obra: Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec.	ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN				UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec Chihuitán, Ciudad Istepec, Oaxaca. CP. 70110	
P-5	Nombre de la obra: Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec.												
ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN													
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO													
Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec Chihuitán, Ciudad Istepec, Oaxaca. CP. 70110													
FOTOS													
F1:		F2:											
F3:		F4:											
F5:		F5:											
Nombre y firma del Titular de la IES 		Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES 											
Comentarios de los trabajos realizados: No se han realizado trabajos en la obra.													
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.													

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AUTOACCESO

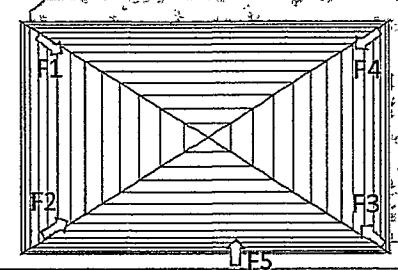

F5


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitán.
Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110


FOTOS




F1:

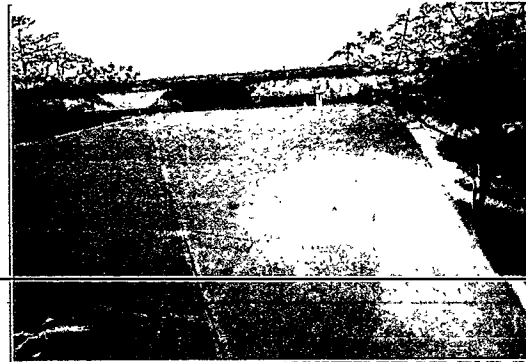

F2:



F3:

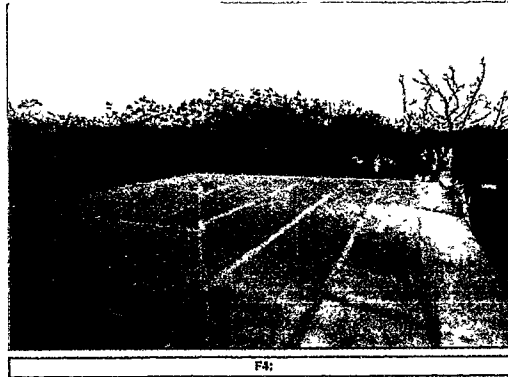

F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


0

P-5


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



LAB. ELECTRONICA




F5


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan,
Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110


FOTOS

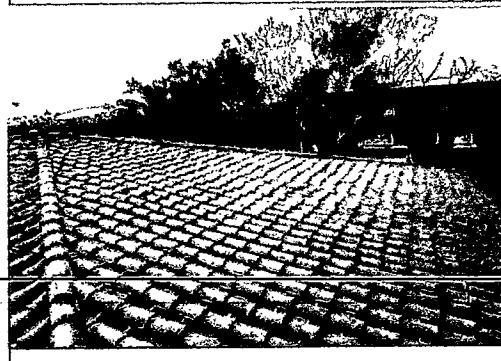


F1:

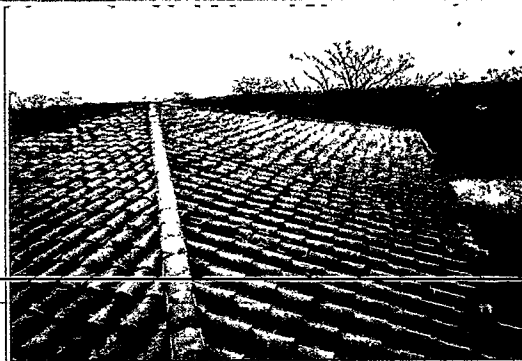


F2:

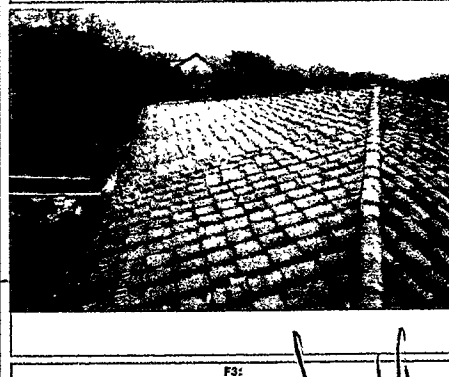

F3:

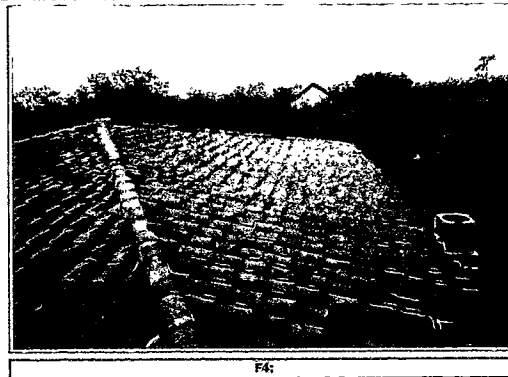

F4:

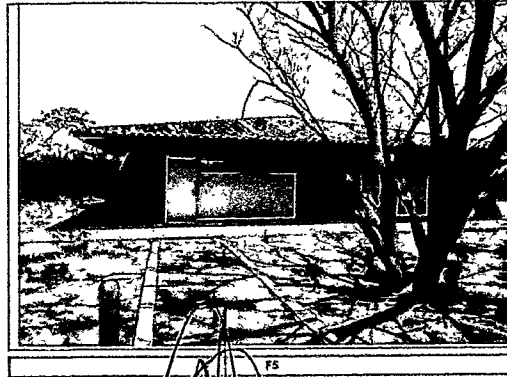

F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0


P-5

Nombre de la obra: Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AUDITORIO

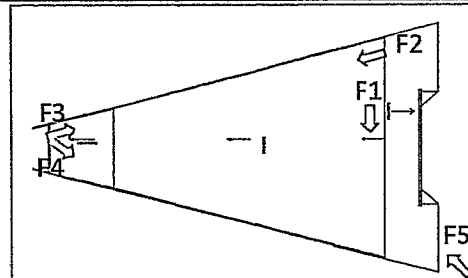


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec Chihuitán,
Ciudad Istepec, Oaxaca, CP. 70110


FOTOS




F1:

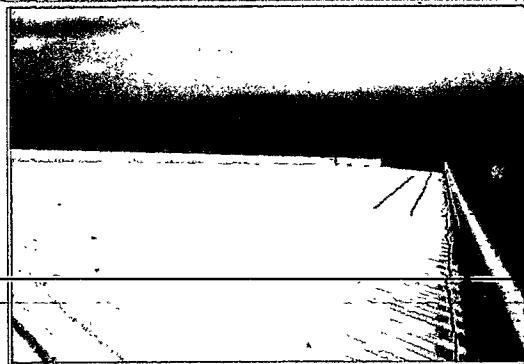

F2:

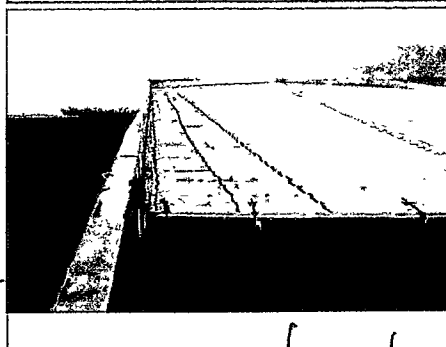


F3:

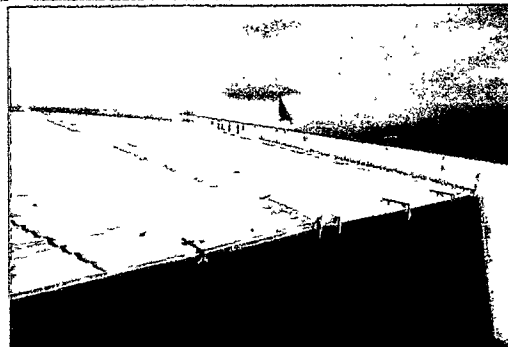

F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

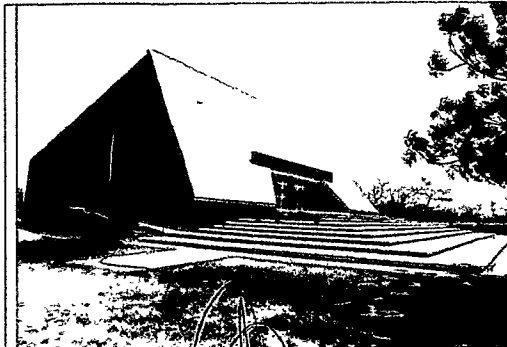

F5:

L. C. E. Eusebio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellano García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Fortentaje de avance


0

P-5

Nombre de la obra:


Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

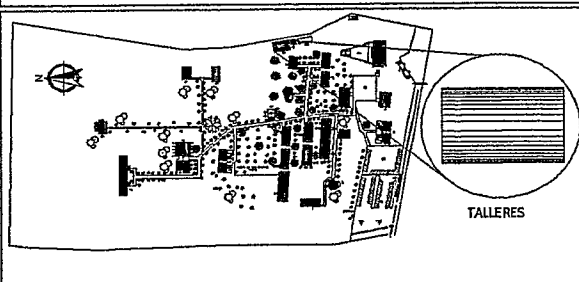

TALLERES


FOTOS

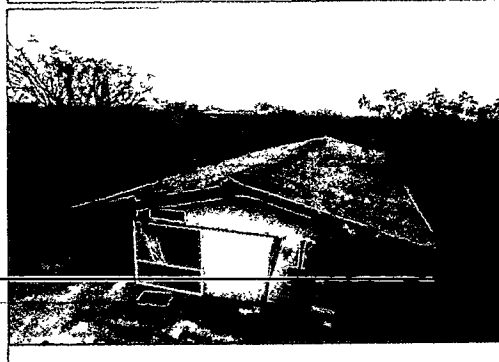

F1:



F2:

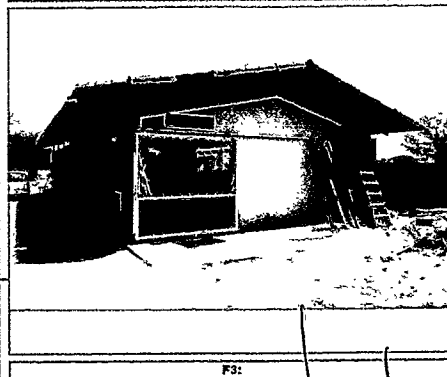

F3:

L.C.E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec Chihuitán,
Ciudad Istepec, Oaxaca. CP. 70110

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

P-6 Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

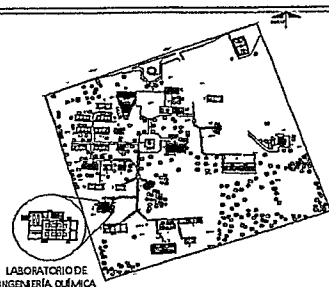LABORATORIO DE
INGENIERÍA QUÍMICA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
Oaxaca, México.

FOTOS




F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


No se han realizado trabajos en la obra.

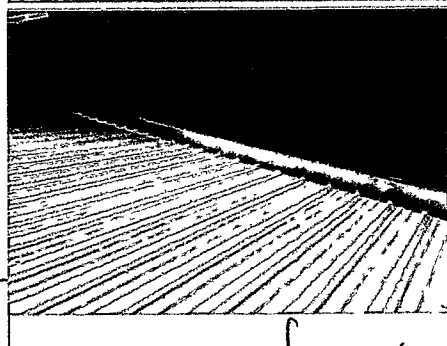

F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Cárdenas García

Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE AFORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance



0

P-6

Nombre de la obra:

Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

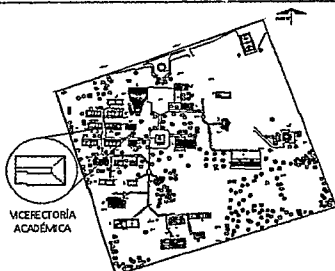VICERECTORÍA
ACADÉMICA

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
Oaxaca, México.

FOTOS




VICE-RECTORÍA ACADÉMICA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

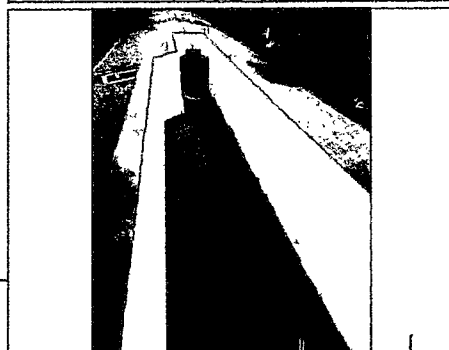

F2



F3

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Casillas Garofa

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/04/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance



0

P-6

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de las de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

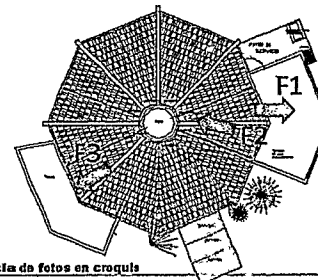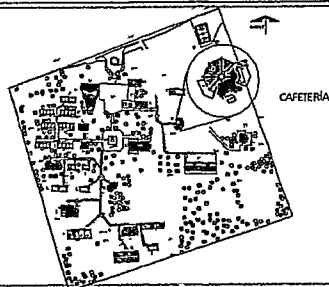


Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

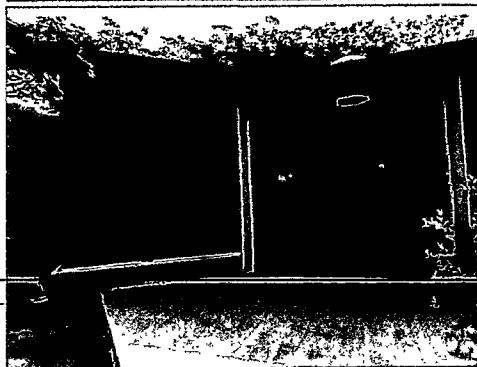


CAFETERÍA

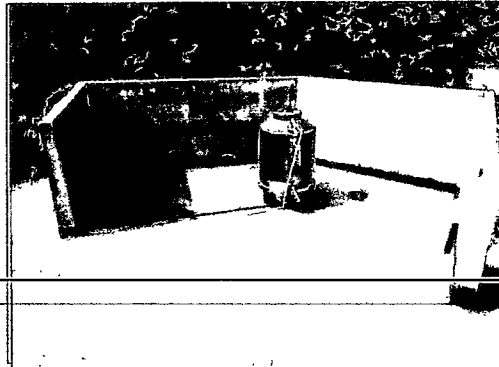

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

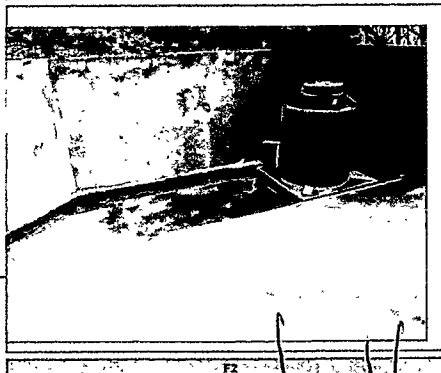

F2



F3







L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castañeros García

Nombre y firma del Titular de la IES Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

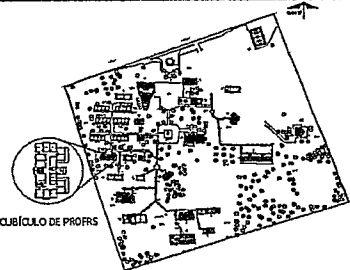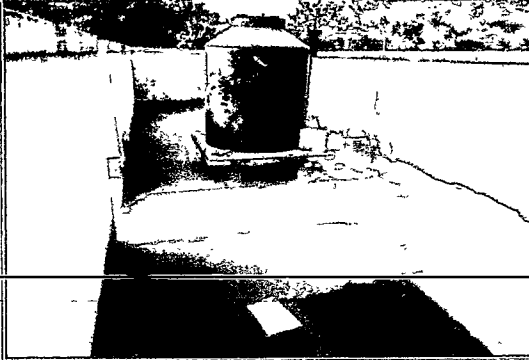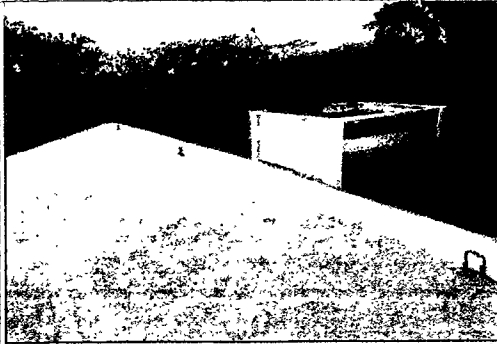2020 AÑO	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado abril-junio FECHA DE CURTE: 30/06/2020
REPORTE FOTOGRÁFICO			
 UNIVERSIDAD DEL ISTMO OAXACA Porcentaje de avance 0	P-6 Nombre de la obra: Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa. CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN  CUBÍCULO DE PROFES CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN  UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.		
FOTOS			
 F1  F2	 F3  F4	Comentarios de los trabajos realizados: No se han realizado trabajos en la obra.	
 L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández. Nombre y firma del Titular de la IES		 Ing. Víctor Hugo Castellanos García Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES	
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.			

2020 AÑO	FAM FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Mes reportado abril-junio FECHA DE CORTE: 30/06/2020
REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL			
 Porcentaje de avance 	P-7 Nombre de la obra: Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
 SISTEMA FOTOVOLTAICO		 AMPLIACIÓN SISTEMA FOTOVOLTAICO	
FOTOS			
 F1:		 F2:	
 F3:		 F4:	
 F5:		 F6:	
Nombre y firma del Titular de la IES L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.		Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES Ing. Víctor Hugo Castellanos García	
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.			

2020

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
abril-junio
 FECHA DE CORTE: 30/06/2020



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL


Forcastaje de avance

0

P-8

Nombre de la obra:

Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.
ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:




F2:



F3:

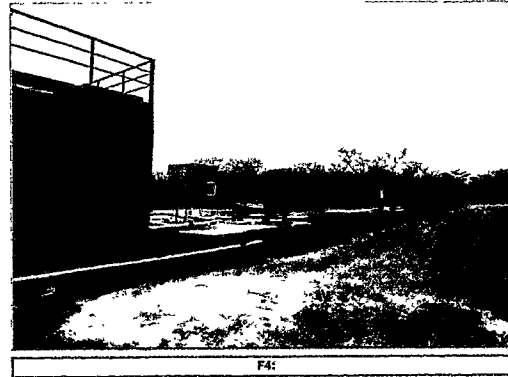

F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance



0

P-8

Nombre de la obra:

Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

DIBUJO DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castañero García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
