

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CIERTE 31/08/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad Federativa: Oaxaca.

Clave inst 911: 20MSU021P

RESPONSABLES

Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Cargo: Vicerrector de Administración

Teléfono: 911 72 2 70 50 Ext. *206

Correo electrónico: e.cortes@unismo.edu.mx

Nombre: Ing. Victor Hugo Castellanos García.

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 911 71 2 70 50 Ext. *309

Correo electrónico: cocasah@unismo.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto ejercido	Reservante	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto 1		Acciones que sustentan el sistema 2	Acciones por realizar	% de avance	Fechas 3		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Cualquier)	Cuenta con Actas				
						Español/Equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con los datos eventos?	¿Calidad y cantidad inaugurado?	¿Se han autorizado los trabajos?	¿Se han autorizado los trabajos?
1	Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x	\$ 3,195,675.22	\$ 3,195,675.22	\$ -	S. Espectadores Fero Sanitarios Vestibulo Vestidores	1 1 4 1 2	193.00 44.00 26.00 162.00 24.00	Trabajos de pintura	97.0	11/09/19	15/11/20	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	SI	No	SI	SI	\$3,195,675.22	
2	Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x	\$ 3,050,200.00	\$ 3,050,200.00	\$ -	TOTAL Mezclador 1 y 2 Cuarto de Análisis y Cuarto de máquinas Biorreactor 1 y 2 Sedimentador 1 Fibra 1 Fibra 2 Generación de Ozono Tanque de almacenamiento Tanque de lodos	9 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12	448.00 26.62 49.73 194.54 35.53 35.52 14.49 14.49 3.57 15.21 128.48		100.00	21/09/19	31/03/20	Obra Terminada.	SI	No	SI	SI	\$3,050,200.00	
3	Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x	\$ 1,338,678.65	\$ 1,338,678.65	\$ -	Consola de control Luminaria con 5 lentes Microfono vocal Interactiva Technologies SceneStation305 Luminaria freestanding de led Extensión para señal DMX Altevoz de 1000 W Subwoofer Altevoz 12" Procesador de audio Mezcladora de 24 canales Telón de boca Instalación de tuberías Proyector BeamQ Pantalla retroproyector	1 12 13 1 2 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1	8.66		100.00	25/10/19	31/03/20	Obra Terminada.	SI	No	SI	SI	\$1,338,678.65	
5	Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	TOTAL Oficinas Pastillo y Vestibulo Sala de Juntas Sanitarios	44 12 1 1 2	8.66 114.62 26.86 17.95 6.42	Trabajos de pintura	98.0	23/08/19	15/11/20	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	SI	No	SI	SI	\$700,000.00	
			\$8,283,953.87	\$8,283,953.87	\$0.00	TOTAL	18	165.85											

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 De capturar los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 31/09/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca.

Clave Inst 911: 20MSU0021 F

Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Cargo: Vice-rector de Administración.
Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. 206
Correo electrónico: e_cesam@bianni.unistmo.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García.
Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.
Teléfono: 971 71 2 70 50 Ext. 209
Correo electrónico: cocsevnh@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹		Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas						
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Accesorios / Otros				Mantenimiento	Proyecto sustentado				Espacio/equipo	cantidad			metros cuadrados	Inicio	Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inauguración)	Acto administrativo de Entrega- Recepción
7	Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.			x	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,000.00	\$ -	Sistema solar interconectado de 58.08 kw	8				GLOBAL DEL PROYECTO	100.0	03/10/19	31/03/20	Los trabajos se encuentran concluidos.	Si	No		Si	Si	\$6,600,000.00
9	Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.			x	\$ 230,250.00	\$ 230,250.00	\$ -	Biblioteca	1	1192.00			GLOBAL DEL PROYECTO	100.0	05/09/19	31/01/20	Los trabajos se encuentran concluidos.	Si	No		Si	Si	\$230,250.00
10	Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.		x		\$ 929,229.20	\$ 929,229.20	\$ -	Sala de Computo	2				GLOBAL DEL PROYECTO	100.0	12/11/19	15/01/20	Los equipos se encuentran instalados y funcionando correctamente.	Si	No		Si	Si	\$929,229.20
					\$7,759,479.20	\$7,759,479.20	\$0.00	TOTAL	22	0.00													

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre.
FECHA DE CORTE: 31/09/2019

REPORTÉ FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

97

PROYECTO **1**

Nombre de la obra: **Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

GRUPO DE LOCALIZACIÓN

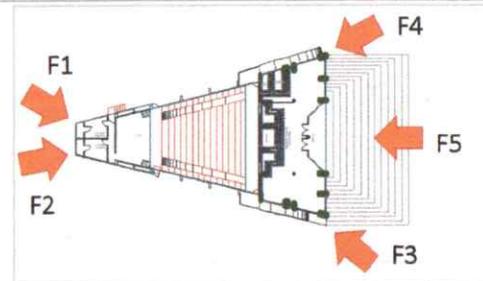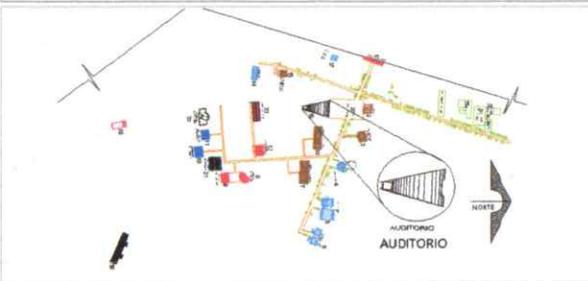

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70162

FOTOS




F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos de pintura.

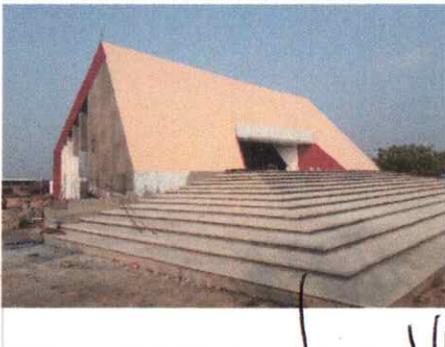

F3:



F4:

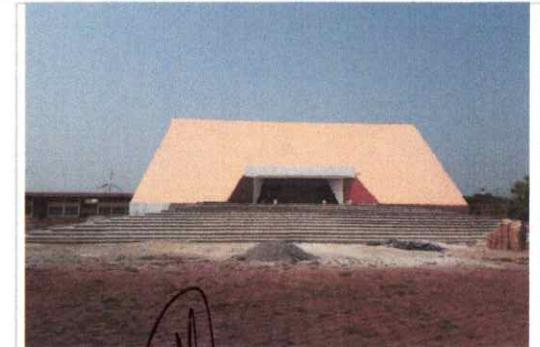

F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Nicanor Huerta Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre.
FECHA DE CORTE: 31/09/2019

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

100

PROYECTO **2**

Nombre de la obra: **Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

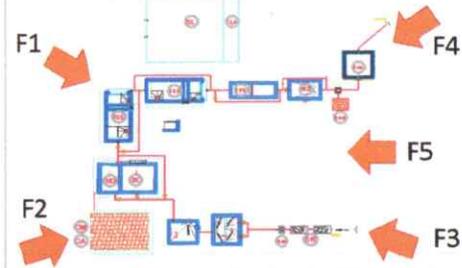


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Cludad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




F1

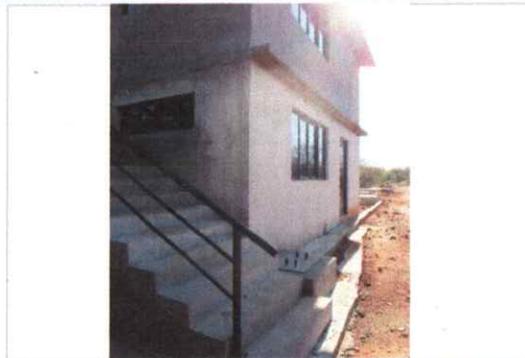

F2

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada.

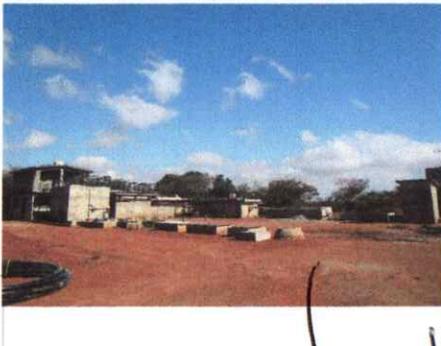

F3



F4

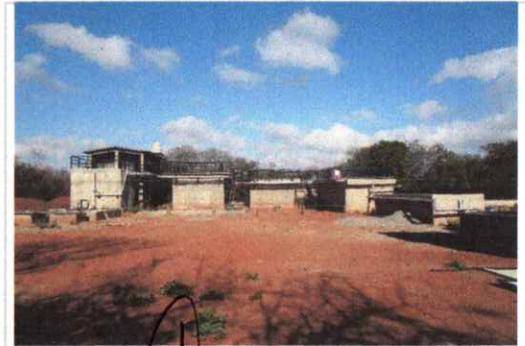

F5

[Signature]
L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

[Signature]
Ing. Víctor Manuel Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre.

FECHA DE CORTE: 31/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

PRIOIDAD 3

Nombre de la obra: Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

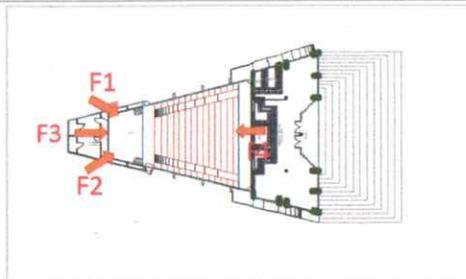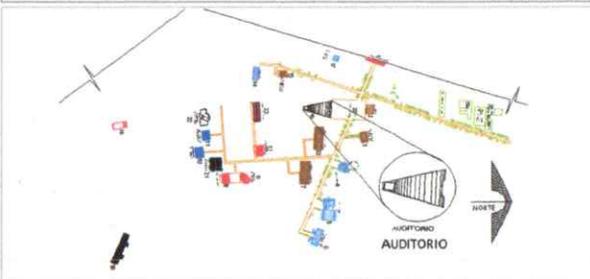

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102


FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Galván García

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSTARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre.
FECHA DE CORTE: 31/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100

Nombre de la obra: **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
[Handwritten signature]
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Gutiérrez García
[Handwritten signature]
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre.
FECHA DE COORTE: 31/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100

PROGRAMA: 3 Nombre de la obra: **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
[Handwritten Signature]

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Aguilanos García
[Handwritten Signature]

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestifera, se podrán copiar tantas pestiferas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre.
FECHA DE CURTE: 31/08/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

Fase: 3

Nombre de la obra: **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

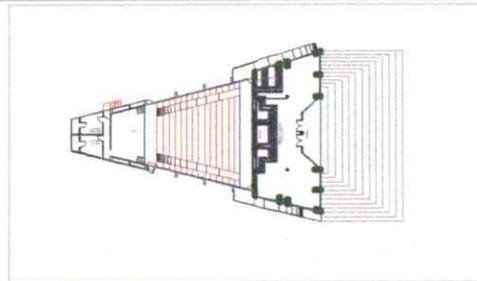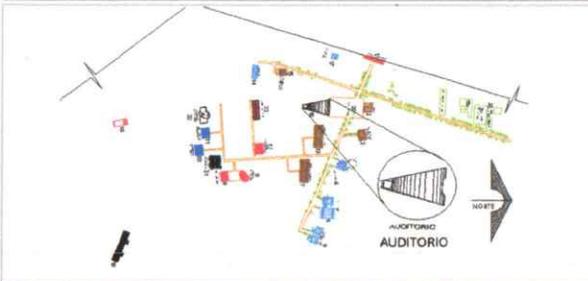

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca C. P. 70102

FOTOS

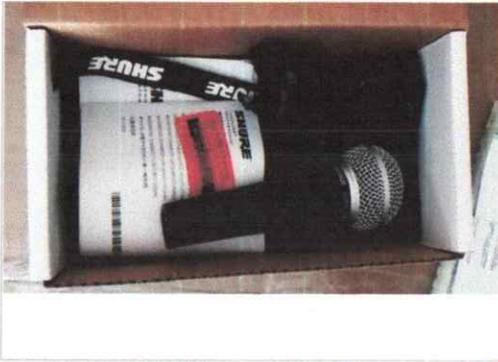

F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se aneca una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre.
FECHA DE CORTE: 31/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

98

PRIORIDAD **5**

Nombre de la obra: **Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

CRONIS DE LOCALIZACIÓN

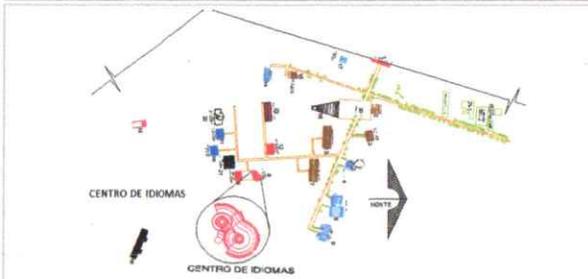

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos de pintura.



F3

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre.
FECHA DE CORTE: 31/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

98

PRORIDAD **5**

Nombre de la obra: **Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN

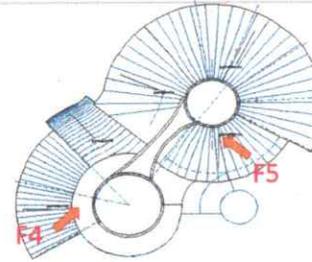

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos de pintura.

L. C. E. Eugenio Cortes Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Juan Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre.
FECHA DE CORTE: 31/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100


PRIORIDAD 7

Nombre de la obra: **Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.**

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN



SISTEMA FOTOVOLTAICO

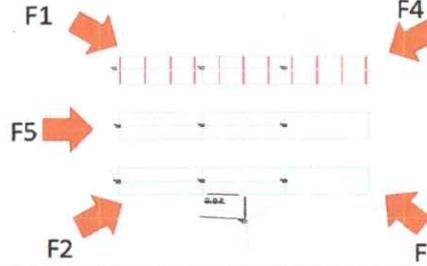

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Ora terminada



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Comas Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Guadalupe Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

100

PROCESO 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**


ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

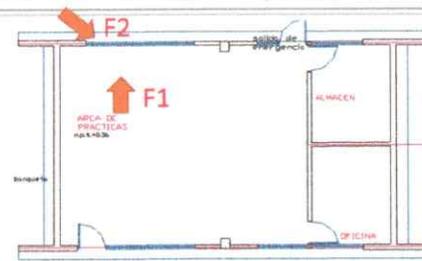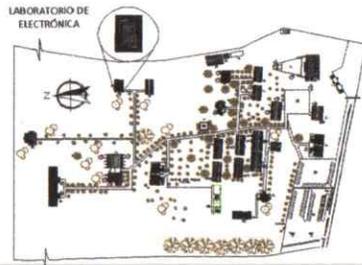

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

#REF1

FOTOS

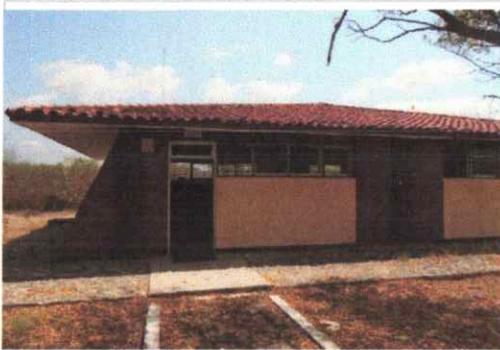

LABORATORIO DE ELECTRONICA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas.



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/06/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100


Prioridad 10

Nombre de la obra: Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CRONIS DE LOCALIZACIÓN

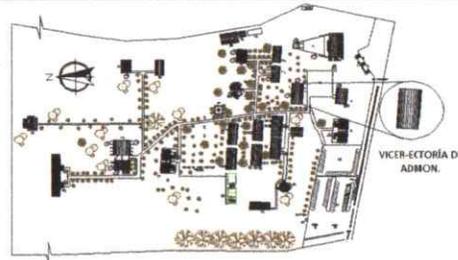


VICE-RECTORÍA DE ADMÓN.



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

#REF1

FOTOS

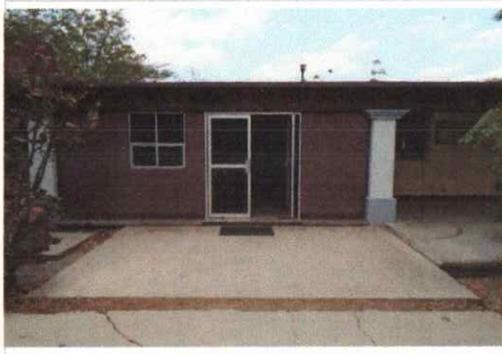


VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada.

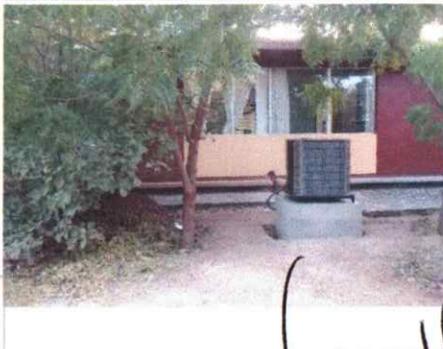

F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ina. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CREARTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO

PRIMORDIA **10**


Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.**



Porcentaje de avance

100

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

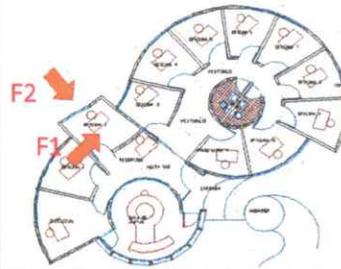

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Istepec S/N, Ciudad Istepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CENTRO DE IDIOMAS



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra temada.



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victoriano Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100

Prioridad **10**

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

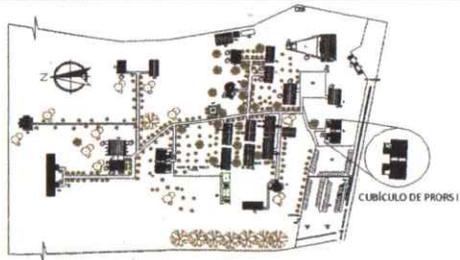

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CUBICULO DE PROFRS I



F1: SALA DE JUNTAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100

PRECEDENCIA: 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

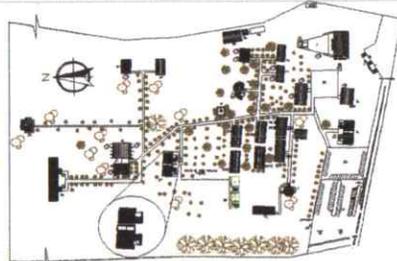

CUBÍCULO DE PROFES II



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CUBÍCULO DE PROFES II



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada.



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras / Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100

PROYECTO 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN

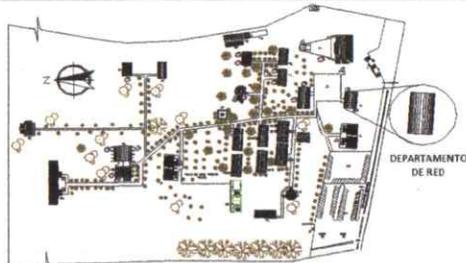

DEPARTAMENTO DE RED

DEPARTAMENTO DE RED



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



EDIFICIO DE RECTORÍA



FL. DEPARTAMENTO DE RED

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas.



F2

L. C. E. Eugenio Cortes Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castañanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anega una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100

PRIORIDAD 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AULAS DE DOS NIVELES



PLANTA BAJA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.

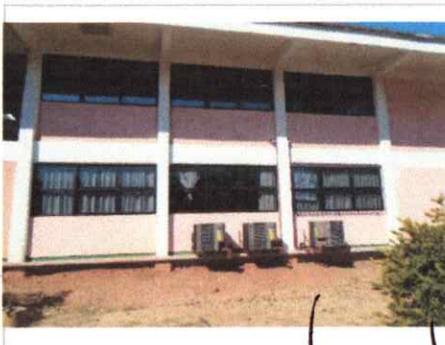

F3:

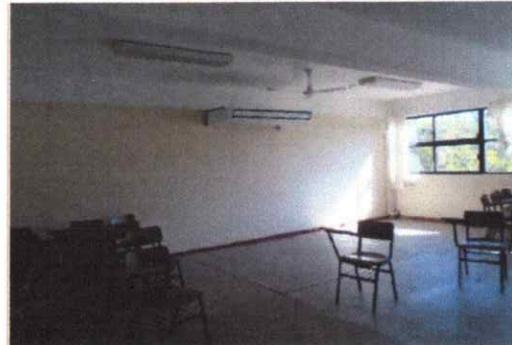

F4: AULA 26

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Responsable Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERTARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100

PROYECTO 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




AULAS DE DOS NIVELES



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

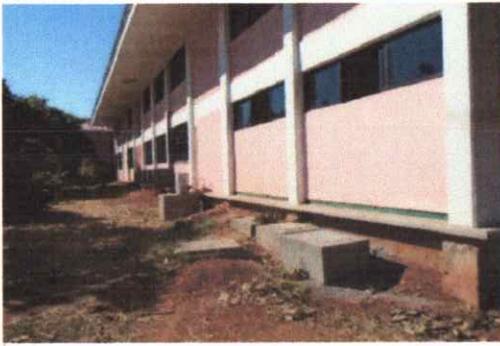

F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3: AULA 27

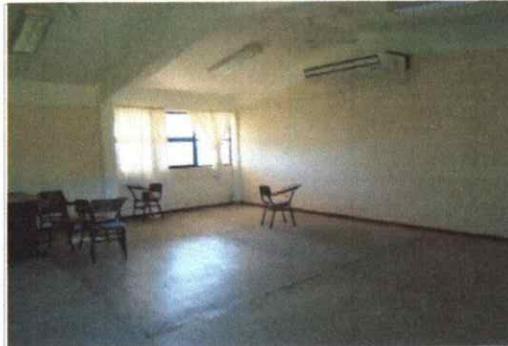

F4: AULA 28



F5: AULA 29

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100

#PRIORIDAD 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



BIBLIOTECA



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

PRORIDAD 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

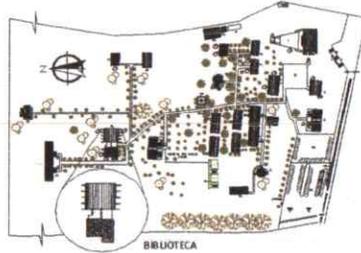


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Istepec S/N, Ciudad Istepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

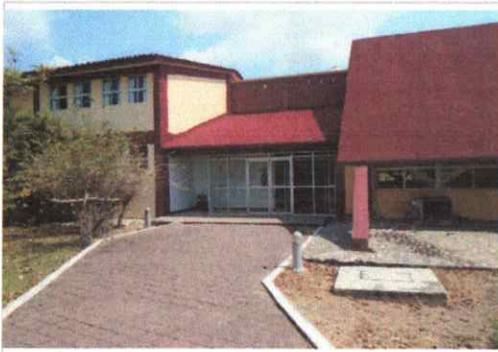

BIBLIOTECA



F1: ACERVO PLANTA BAJA

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2



F3: SALA DE LECTURA PLANTA BAJA



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100

Procesos 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

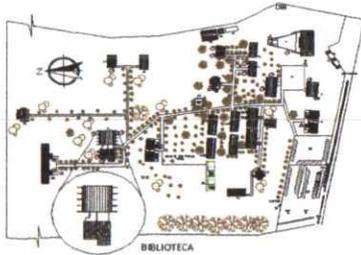

BIBLIOTECA



Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS




BIBLIOTECA

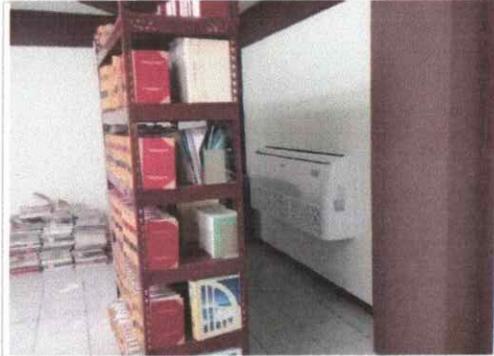

F1: ACERVO PLANTA ALTA

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada.

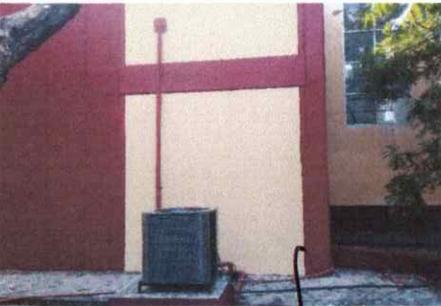

F2



L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

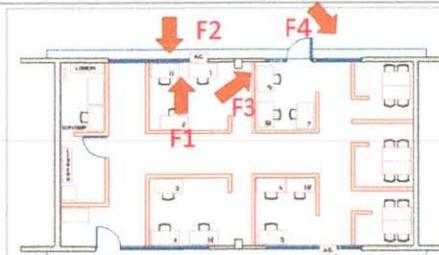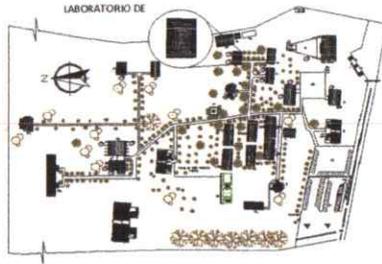

Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



LABORATORIO DE AUTOACCESO

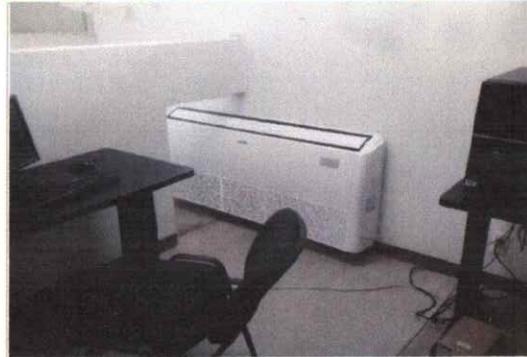

F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSTARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

PROYECTO 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CRONIS DE LOCALIZACIÓN

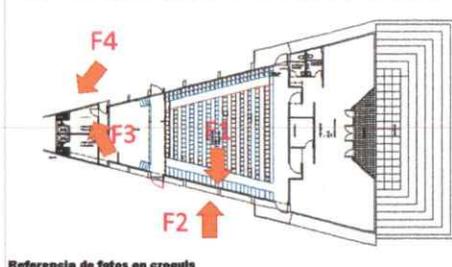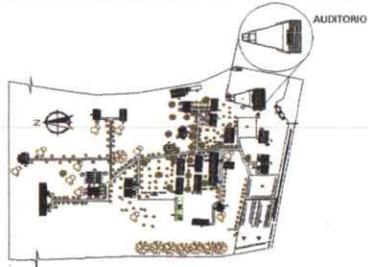


Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

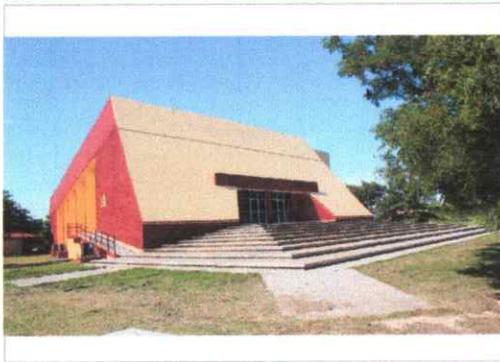

AUDITORIO



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100

PRECISIÓN 10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

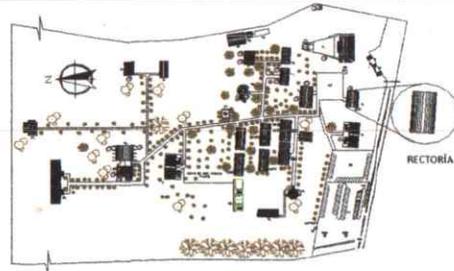

RECTORÍA

F2




Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

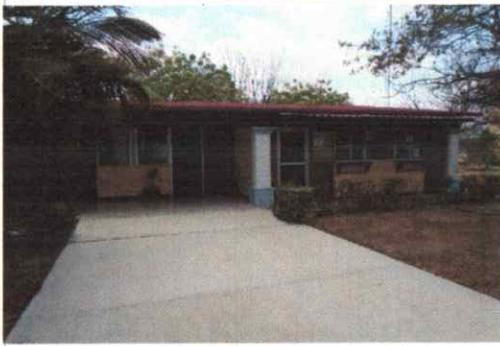

EDIFICIO DE RECTORÍA



F1: SALA DE JUNTAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100

PROYECTO: 10 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

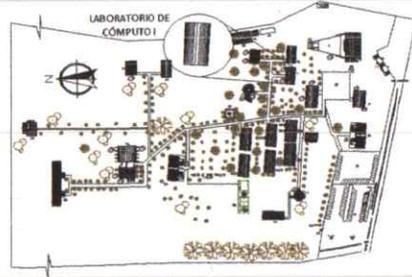

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



SALA DE CÓMPUTO I



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra leída.



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado: julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100

PRORIDAD 9

Nombre de la obra: Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

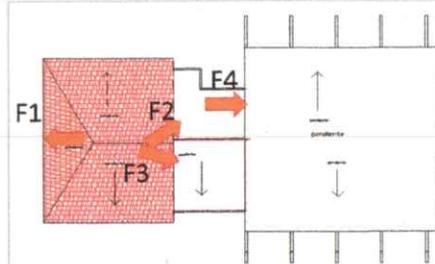


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




BIBLIOTECA

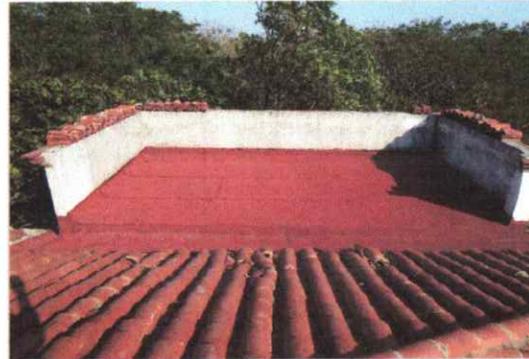

F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada.

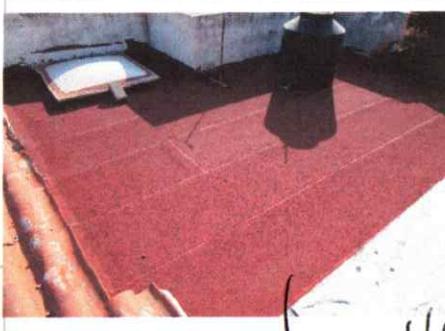

F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
