

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/20

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo.
Entidad federativa: Oaxaca
Clave Inst 911: 20MSU021P
Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.
Cargo: Vice-rector de Administración
Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. 306
Correo electrónico: c_cesar@unismo.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García.
Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento
Teléfono: 971 71 2 70 50 Ext. 309
Correo electrónico: cocasari@gmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Reservante	Alcance del proyecto en cuanto a aspectos físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fecha ³		Observaciones	¿El subproyecto se inauguró? (Sí/No)	Cuenta con Actas				
		Obras de infraestructura	Educación	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con Actas del evento?	¿Cuenta con Actas de Inauguración?	¿Cuenta con Actas de Entrega de Obra?	¿Cuenta con Actas de Recepción?
P-1	Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x			\$ 6,821,341.65	\$ 2,858,898.75	\$ 5,962,462.90	Aulas	9	448.02			30.00	20/07/20	07/12/20	La obra se encuentra en proceso constructivo mediante el contrato de obra pública número: OP/TEH/EON/1-2020 de fecha 17 de julio de 2020.	No	No	No	No	No	No
								Escaleras	1	79.06												
								Sanitarios	2	49.78												
								Pasillos	1	156.94												
								Vestíbulo	1	32.21												
								TOTAL	14	765.91												
P-2	Demolición y construcción del almacén de la Universidad del Istmo Campus Itepec.	x			\$ 3,668,661.06	\$ 1,177,929.75	\$ 2,490,691.31	Almacén	1	112.00			30.00	03/08/20	21/12/20	La obra se encuentra en proceso constructivo mediante el contrato de obra pública número: OP/ITE/EON/3-2020 de fecha 31 de julio de 2020.	No	No	No	No	No	No
								Área Mto.	1	12.90												
								Área Intendencia	1	6.54												
								Bodega	1	13.07												
								Sanitario	1	4.01												
								Pasillo	1	29.62												
								TOTAL	7	193.26												
P-3	Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Itepec.		x		\$ -	\$ -	\$ -						0.00	01/07/20	28/09/20	La Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación Pública autorizó el traspaso de este recurso a la P-4 mediante la referencia DPI-1044-20 del Oficio Número 511/2020-2030 por lo que esta prioridad queda cancelada.	No	No	No	No	No	No
								TOTAL	0	6.00												
P-4	Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Itepec.	x			\$ 1,852,559.00	\$ -	\$ 1,852,559.00	Planta Baja	1	58.71			0.00	01/11/20	31/12/20	La obra se encuentra en agrupación de las bases de convocatoria para la revisión por parte de Contraloría del Estado de Oaxaca.	No	No	No	No	No	No
								Planta Alta	1	58.71												
								TOTAL	2	117.42												
					\$14,342,461.78	\$ 6,036,728.50	\$18,395,693.28															

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

ARO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad del Istmo.**
Entidad federativa: **Oaxaca.**
Clave Inst 911: **20MSU021P**
Nombre: **L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.**
Cargo: **Vice-rector de Administración.**
Teléfono: **971 72 2 70 50 Ext. *206**
Correo electrónico: **c_cesar@elavni.unistmo.edu.mx**

RESPONSABLES

Planeación	Obras y Mantenimiento
Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández. Cargo: Vice-rector de Administración. Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. *206 Correo electrónico: c_cesar@elavni.unistmo.edu.mx	Nombre: Ing. Victor Hugo Castellanos García. Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento. Teléfono: 971 71 2 70 50 Ext. *309 Correo electrónico: cocavh@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Ya fue inaugurada?																								
		Obra de continuidad	Equipamiento	Manejo de residuos				Proyecto sustentable	Espacio/equipo	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega Recepción (Acta Inicial)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Inicio de Acta Administrativa																			
P-5	Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Itepec.	x			\$ 1,952,910.00	\$ 1,381,695.52	\$ 561,214.48	Cubi. Profs.	1	346.81	---	---	80.00	13/07/20	30/10/20	La obra se adjudicó mediante contrato de obra pública número: OP/XT/AC/02-2020 de fecha 10 de julio de 2020. Se realizó el convenio Ampliatorio al Monto de Ejecución Número UNISTMO/COM-02/2020 de fecha 10 de octubre del 2020.	No No está concluida.	No	---	No	No	No																				
								IECA	1	346.81																																
								Biblioteca	1	600.00																																
								Cafetería	1	180.00																																
								Pédico	1	200.00																																
								Depto. Profs	1	509.86																																
								Autocceso	1	264.83																																
								Lab. Electrónica	1	132.31																																
								Auditorio	1	602.43																																
								TOTAL	9	3,182.85																																
P-6	Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	x			\$ 706,896.77	\$ 127,178.26	\$ 579,718.51	Cafetería	1	259.81	---	---	100.00	13/07/20	30/09/20	La obra se adjudicó mediante contrato de obra pública número: OP/TEH/OA/1-2020 de fecha 10 de julio de 2020. Se realizó el convenio Ampliatorio al Monto de Ejecución Número UNISTMO/COM-01/2020 de fecha 20 de agosto del 2020.	No No está concluida.	No	---	No	No	No																				
								Vicerectoría Académica	1	294.04																																
								Lab. Inge. Química	1	78.84																																
								Cubi. Profs.	1	343.12																																
								Auditorio	1	96.00																																
								Sanitarios Generales	1	126.29																																
								TOTAL	6	1197.89																																
								P-7	Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	x															\$ 1,518,787.44	\$ 419,410.24	\$ 1,100,377.20	Excavación para Línea de Cable Invecor	1	45.05	---	---	15.00	03/08/20	21/11/20	La obra se encuentra en proceso constructivo mediante el contrato de obra pública número: OP/TEH/OA/02-2020 de fecha 31 de julio de 2020.	No No está concluida.	No	---	No	No	No
																												Excavación para Línea de Cable Climas	1	36.00												
																												Luminarias	5	Pza												
Climas	8	Pza																																								
TOTAL	15	81.85																																								
P-8	Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x			\$ 500,000.00	\$ 299,692.20	\$ 200,307.80				Red Sanitaria	1	270.00	---	---	40.00	03/08/20	30/10/20	La obra se encuentra en proceso constructivo mediante el contrato de obra pública número: OP/TEH/OA/03-2020 de fecha 31 de julio de 2020.	No No está concluida.	No	---						No	No	No												
											TOTAL	1	270.00																													
											TOTAL	1	270.00																													
					\$4,759,944.21	\$2,227,974.21	\$2,523,568.00																																			

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

30


PRIORIDAD **P-1**

Nombre de la obra: **Construcción de un edificio de nuevo aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CRONIS DE LOCALIZACIÓN



EDIFICIO DE 9 AULAS



PLANTA BAJA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Limpieza, trazo, nivelación y excavación de terreno; mejoramiento de suelo con material de banco compactado con rodillo vibrocompactador; elaboración de plantilla de concreto; elaboración de losa de cimentación; elaboración de contralabes; elaboración de columnas y muros de concreto.



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eulenio Cortés Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Manuel Capellanos García

Nombre y firma del titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

30

PROYECTO

P-1


Nombre de la obra:

Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



EDIFICIO DE 9 AULAS



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Limpieza, trazo, nivelación y excavación de terreno; mejoramiento de suelo con material de banco compactado con rodillo vibrocompactador; elaboración de plantilla de concreto; elaboración de losa de cimentación; elaboración de contratrabes; elaboración de columnas y muros de concreto.



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



PRIOIDAD **P-2** Nombre de la obra: **Demolición y construcción del almacén de la Universidad del Istmo Campus Istepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

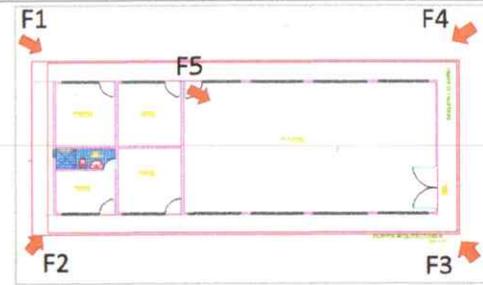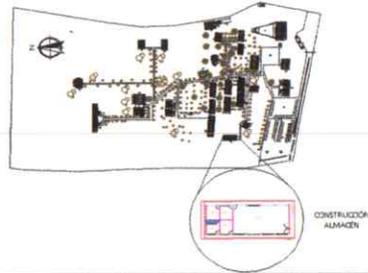

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec-Chihuitan, Ciudad Istepec, Oaxaca. CP. 70110

Porcentaje de avance

30

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:
Limpieza, trazo, nivelación y excavación de terreno; mejoramiento de suelo con material de banco compactado con rodillo vibrocompactador, elaboración de plantilla de concreto armado y cimbrado de losa de cimentación.



L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

0

PROYECTO P-4


Nombre de la obra: **Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

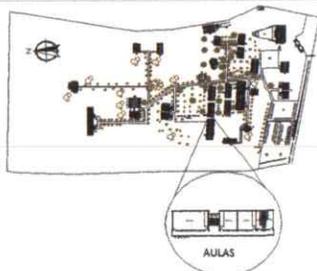


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec Chihuitan, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, CP. 70110



FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

La obra se encuentra en agrupación de las bases de convocatoria para la revisión por parte de Contraloría del Estado de Oaxaca.



F3



F4



F5

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

0

PROYECTO P-4

Nombre de la obra: **Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Itepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

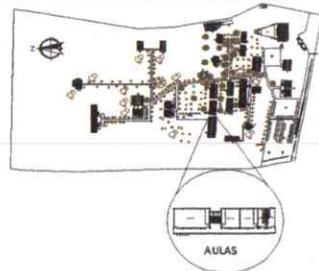


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec Chihuitan, Ciudad Itepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1

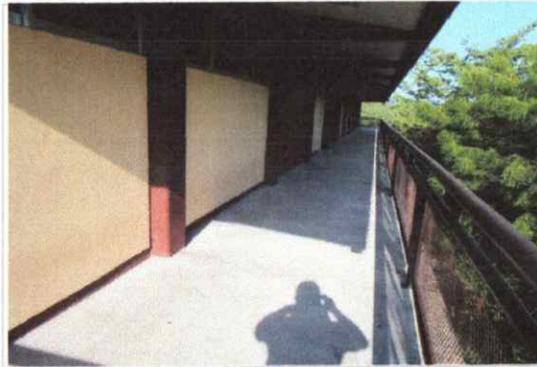

F2



F3

Comentarios de los trabajos realizados:

La obra se encuentra en agrupación de las bases de convocatoria para la revisión por parte de Contraloría del Estado de Oaxaca.

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

80


P-5

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



CUBICULO DE PROFESORES




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS




F1

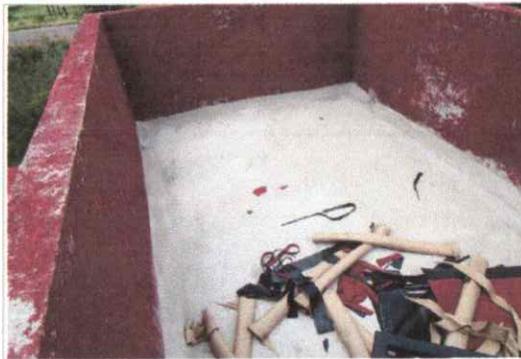


F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante actual, renovación de losa, retiro de leja y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.

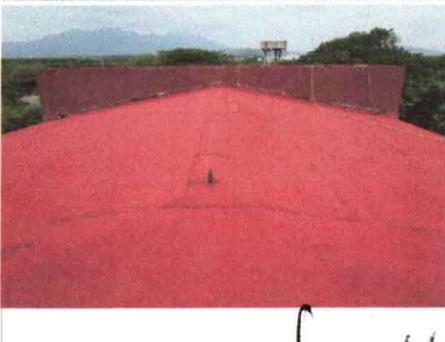

F3

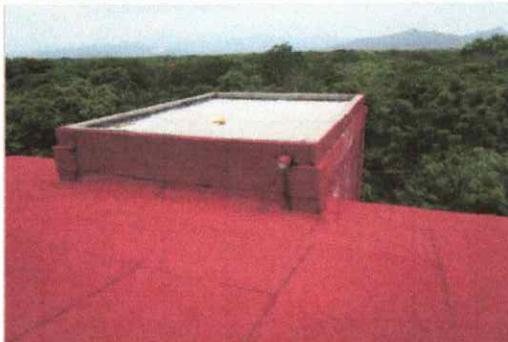

F4



F5

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castañeros García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance


80

PRIORIDAD **P-5** Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de techos de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CRONIS DE LOCALIZACIÓN



INSTITUTO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS (IECA)

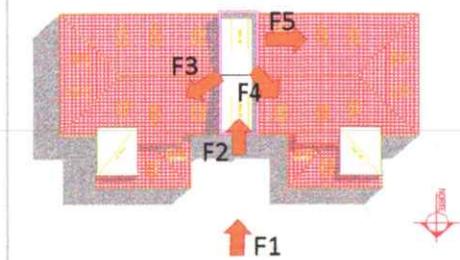

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1



F2


Comentarios de los trabajos realizados:
Retiro de impermeabilizante actual, renovación de losa, retiro de teja y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.



F3



F4

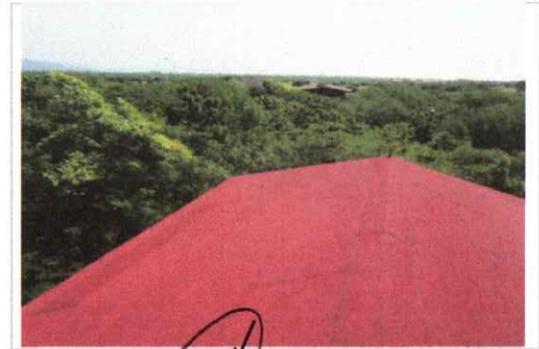

L. C. E. Eugenio Cortés-Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

80


Prioridad **P-5**

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



BIBLIOTECA

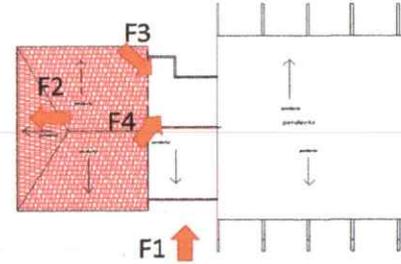

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec Chihuitan,
Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante actual, renovación de lasa, retiro de teja.



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

80


PROYECTO: P-5

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN




CAFETERÍA

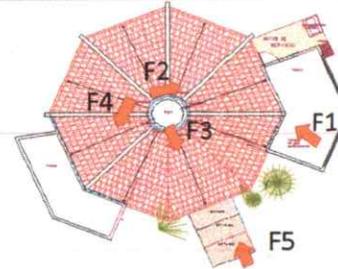

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan
Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110


FOTOS

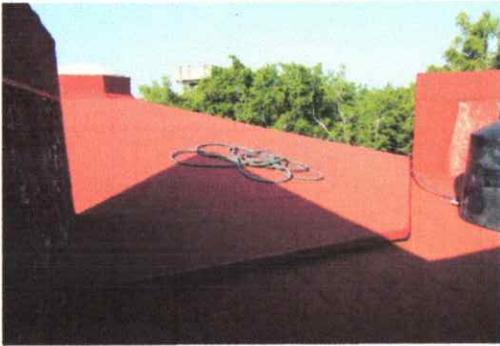

F1:



F2:

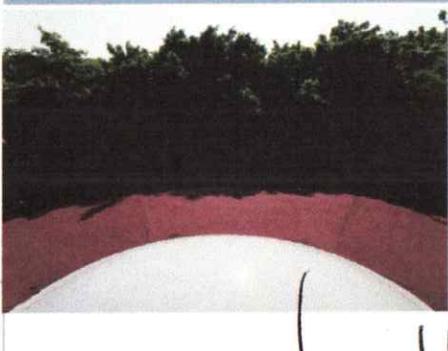

F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante actual, nivelación de losa, retiro de teja y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PROYECTO **P-5**

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



F5

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec, Chihuitan,
Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110

Porcentaje de avance

80

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Retiro de impermeabilizante actual, renovación de losa, retiro de teja y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.



F3:



F4:

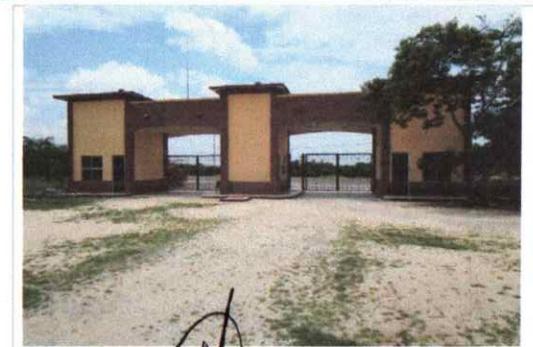

F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

80

PROYECTO P-5

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CRUCES DE LOCALIZACIÓN



DEPTO. DE PROFESORES



F1

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante actual, retiro de teja y suministro.



F3:



F4:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

80

PROYECTO **P-5** Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

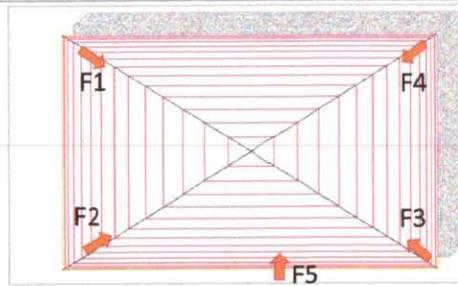

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec Chihuitan, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante actual y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Hernández García

Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

30


PROYECTO P-5

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

GRUPO DE LOCALIZACIÓN



LAB. ELECTRONICA



F5

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan,
Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110


FOTOS



F1:



F2:

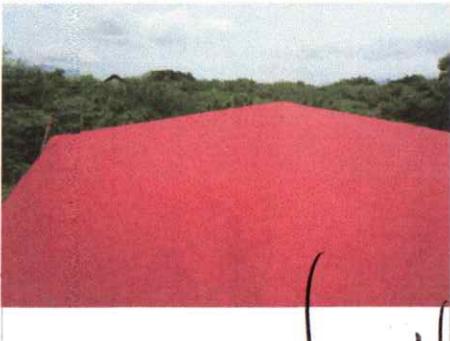

F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante, retiro de teja y suministro y colocación de espuma de poluretano.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSTARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance


80

PROYECTO P-5 Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec.**

CRUCES DE LOCALIZACIÓN



AUDITORIO

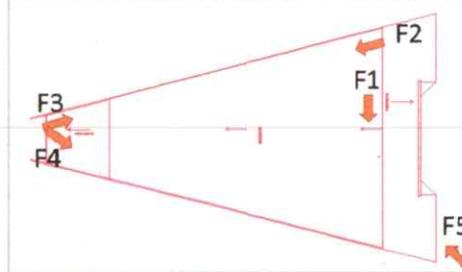

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec: Chihuitan,
Ciudad Istepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS




F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Retiro de impermeabilizante actual y suministro y colocación de espuma de poluretano.

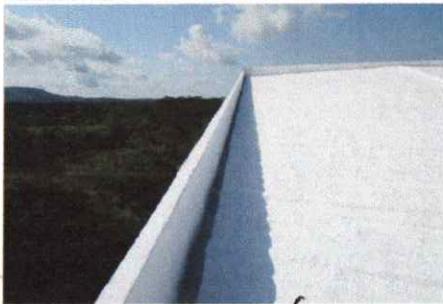

F3:



F4:

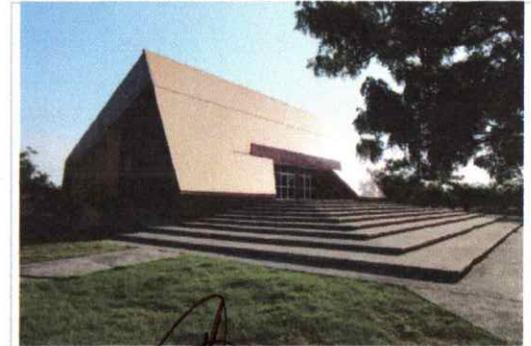

F5:

L. C. E. Eusebio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Manuel Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio_septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD **P-7** Nombre de la obra: **Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

SISTEMA FOTOVOLTAICO ACTUALMENTE

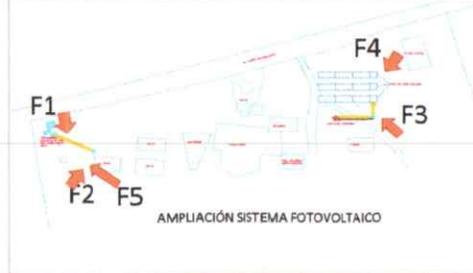

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Porcentaje de avance

15

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Trazo y nivelación de área a excavar, excavación para colocar línea de ductería para tablero de aires acondicionados en aulas.

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Manuel Arellano García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

40

PROCESO: P-8 Nombre de la obra: **Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Trazo, nivelación y excavación de líneas de drenaje, suministro e colocación de líneas de drenaje, demolición de firme de concreto, lambrín y loseta de cerámica, cambio de línea sanitaria e hidráulica. Retiro de mamparas.



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportario
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

40

PROYECTO P-8

Nombre de la obra: **Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

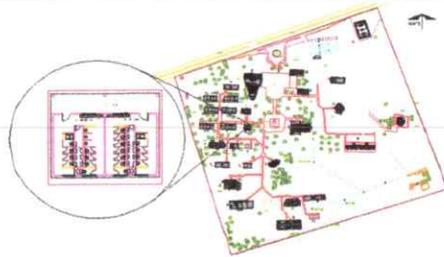

SANITARIOS GENERALES

PLANTA MULTICODERX SANITARIOS

F1

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Trazo, nivelación y excavación de líneas de drenaje, suministro e colocación de líneas de drenaje, demolición de firme de concreto, lambrín y loseta de cerámica, cambio de línea sanitaria e hidráulica. Retiro de mamparas.

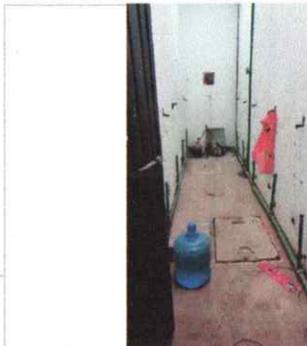

F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100


PROYECTO: P-6

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN




LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

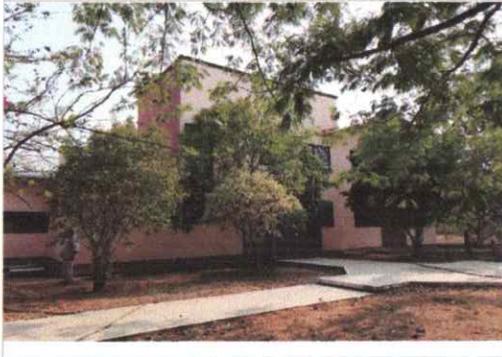

F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante actual, renovación de lasas y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.



F3:



F4:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Yvonne Rodríguez García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance


100

Proyecto: P-6 Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



VICERECTORÍA ACADÉMICA



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




VICERECTORÍA ACADÉMICA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilización actual, nivelación de losa, retiro de teja y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.

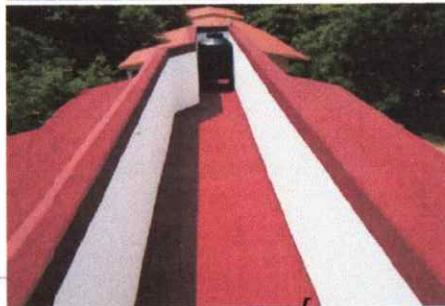

F2



F3

L. C. E. Eusebio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castañeda García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance


100

PRIMARÍA P-6 Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CAFETERÍA

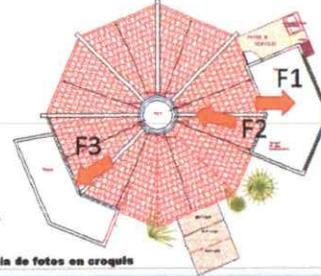


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

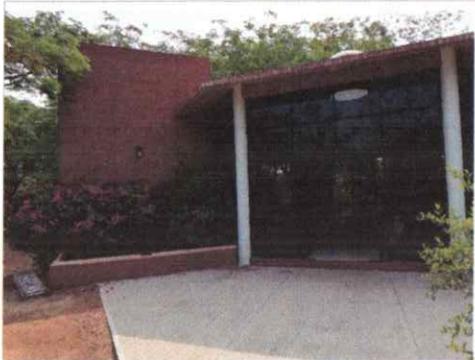

CAFETERÍA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Retiro de impermeabilizante actual, renovación de lasas y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.



F2



F3

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ina. Victoria Eugenia Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

100


PRIMARÍA P-6

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CUBICULO DE PROFES




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



CUBICULO DE PROFESORES

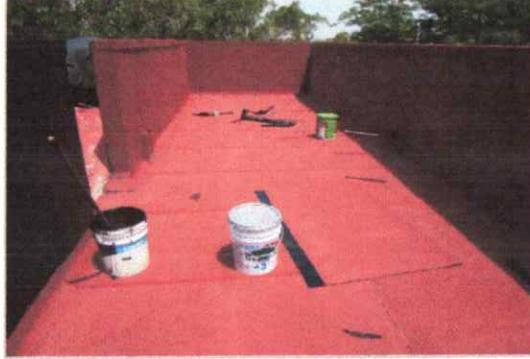

F1


Comentarios de los trabajos realizados:
Retiro de impermeabilizante actual, nivelación de losa y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.



F2



F3

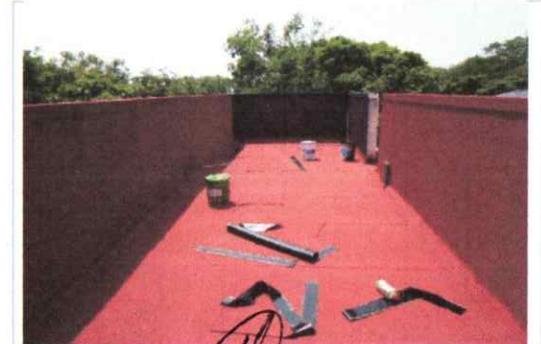

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

100

PRIORIDAD **P-6** Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

CRUCES DE LOCALIZACIÓN

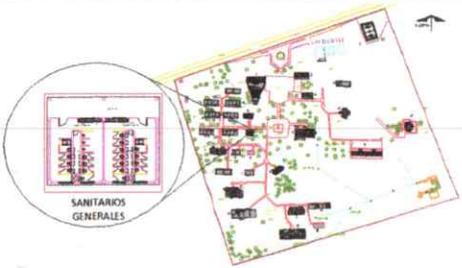

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70780, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




SANITARIOS GENERALES




F1


Comentarios de los trabajos realizados:
Retiro de impermeabilizante actual, renovación de lasa, retiro de teja y suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado.

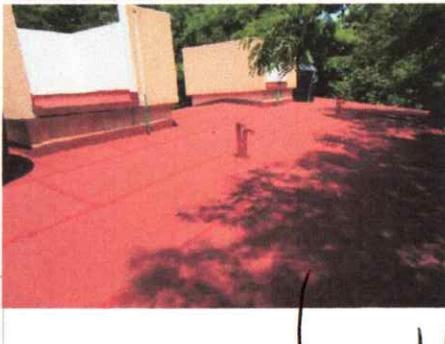

F2

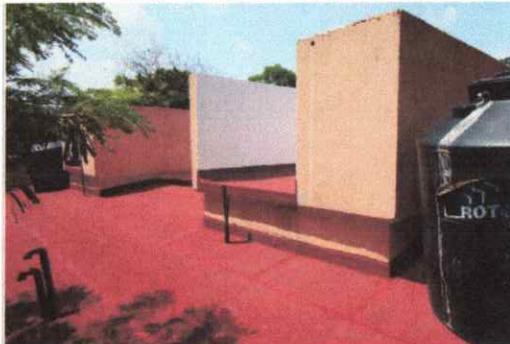

F3

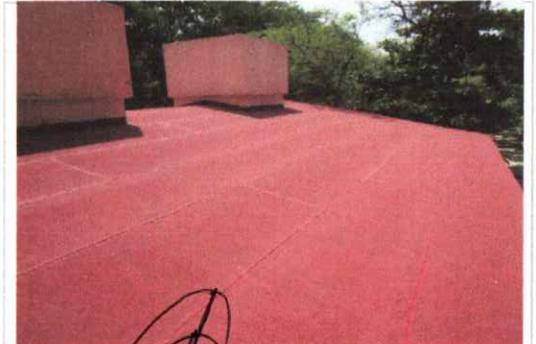

F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
julio-septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/2020

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avances

100


PRIMORDIAL

P-6


Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AUDITORIO

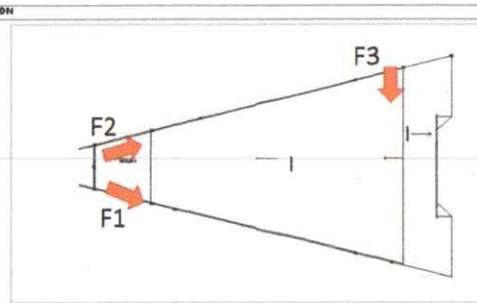

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




AUDITORIO



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

suministro y colocación de impermeabilizante prefabricado, suministro y colocación de lamina galvanizada en canalón de desague.

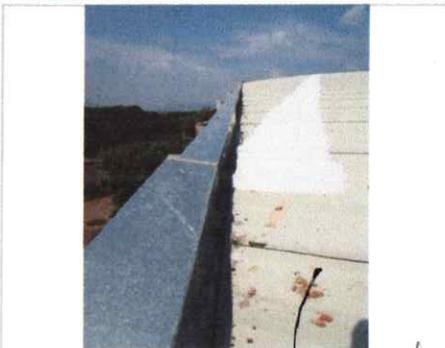

F2



F3

L. C. E. Eusebio Cortez Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
