

2020

AÑO



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad del Istmo.**
Entidad federativa: Oaxaca.
Clave Inst: 911.20MSU0021P

RESPONSABLES

Nombre: **L. C. E. Eugenio Cortés Hernández**
Cargo: **Vice-rector de Administración**
Teléfono: **971 72 2 70 50 Ext. *206**
Correo electrónico: **vica_admin@unismo.edu.mx**

Nombre: **Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia**
Cargo: **Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.**
Teléfono: **971 71 2 70 50 Ext. *309**
Correo electrónico: **ccocavh@unismo.edu.mx, depto.supobras@unismo.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser integrados? (Casos)	Ya fue inaugurada?					
		Obras de construcción	Equipamiento	Adquisición de mobiliario	Mantenimiento				Proyecto sustantivo	Espacios/equipos	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	Cuenta con Actos				
																				¿Cuenta con foto de evento?	¿Cuándo y dónde inauguró?	Est. según Disposición (Acto Inauguración)	Acta Administrativa (Acto Inauguración)	Monto de Acta Administrativa
P-1	Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.				X	\$ 7,026,019.02	\$ -	\$ 7,026,019.02	Mezclador 1 y 2 Cuarto de Análisis y Cuarto de Muestras Biombrador 1 y 2 Sedimentador 1 Sedimentador 2 Filtro 1 Filtro 2 Ultrasonación de Peces Tanque de Almacenamiento Tanque de lodos	2 1 2 1 1 1 1 1 1	26.52 58.48 104.34 35.52 35.52 14.48 14.48 3.57 16.21 128.48	---	---	0.00	03/05/21	30/10/21	El proyecto se encuentra en el proceso de Liberación ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No	No	---	No	No	\$0.00	
P-2	Reparación del laboratorio de cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.		X			\$ 1,635,659.08	\$ -	\$ 1,635,659.08	Planta Baja Plantas: Alta	1 1	175.84 215.92	---	---	0.00	03/05/21	10/08/21	El proyecto se encuentra en el proceso de Liberación ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No	No	---	No	No	\$0.00	
P-3	Construcción de un sistema fotovoltaico para la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.			X		\$ 7,900,000.00	\$ -	\$ 7,900,000.00	Sistema de Paneles Solares Interconectados	1	2000.00	---	---	0.00	03/05/21	31/09/2021	El proyecto se encuentra en el proceso de Liberación ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No	No	---	No	No	\$0.00	
P-4	Equipamiento con luminarias solares en alumbrado exterior y de luminarias interiores en edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.			X		\$ 827,171.34	\$ -	\$ 827,171.34	Luminaria Solar Luminaria de sobre poner LED	10 120	Pza Pza	---	---	0.00	03/05/21	15/07/21	El proyecto se encuentra en el proceso de Liberación ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca.	No	No	---	No	No	\$0.00	
						\$16,188,749.44	\$0.00	\$16,188,749.44	TOTAL	130	Pza													

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.
² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

2021

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

0

PRORIDAD 1

Nombre de la obra: **Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Universidad del Istmo Campus Itepec.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




CONSTRUCCIÓN PPAR

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec Chihuitan, Ciudad Itepec, Oaxaca, CP. 70110

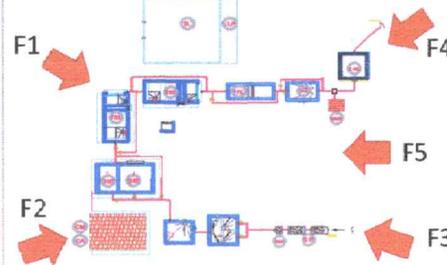

FOTOS

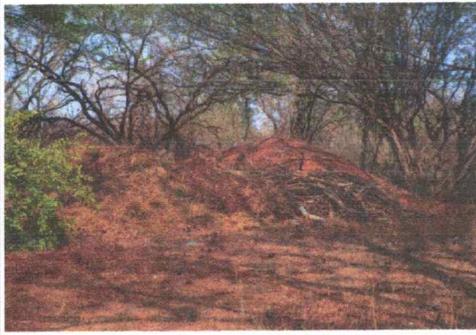

F1




F2

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.



F3

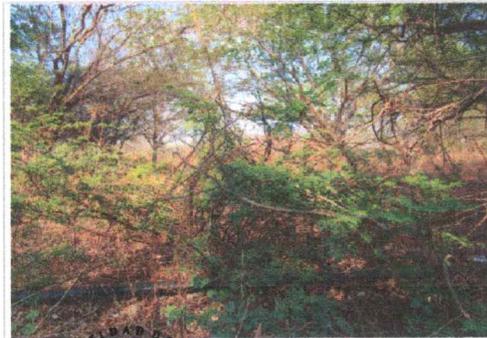

F4



F5

[Signature]
L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



[Signature]
Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, si pudieran copiar estas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma fotografía antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

P-2

Nombre de la obra:

Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

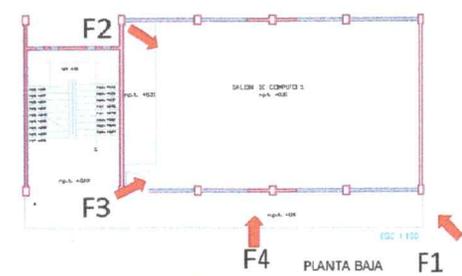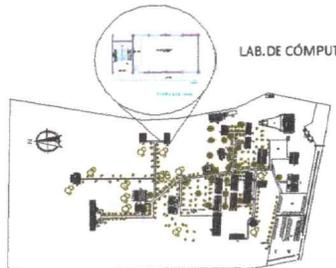

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtpec Chihuitan, Ciudad Ixtpec, Oaxaca, CP. 70110



Porcentaje de avance

0

FOTOS

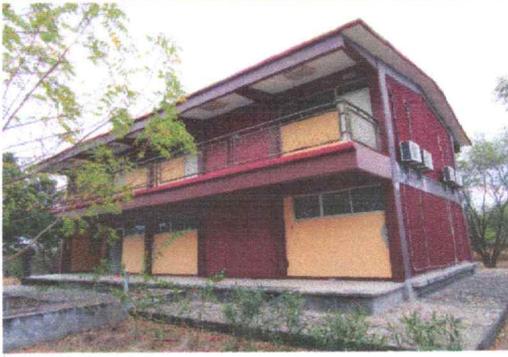

F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos.



F3:



F4:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se pueden copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar, para el antes, durante y después de la obra.

2021

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0


PROYECTO P-2

Nombre de la obra: Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

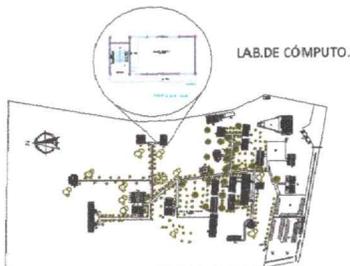

LAB. DE CÓMPUTO.

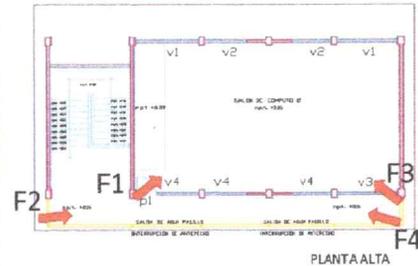

PLANTA ALTA


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtpec Chihuitan, Ciudad Ixtpec, Oaxaca, CP. 70110


FOTOS




F1:

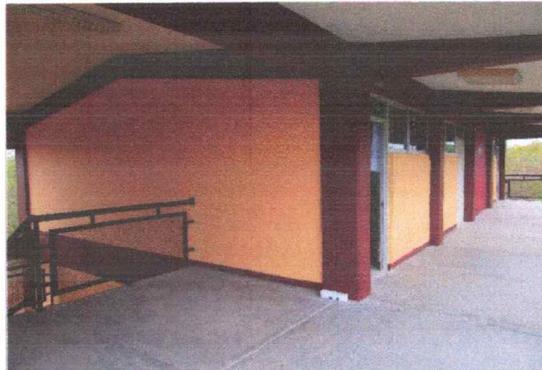

F2:

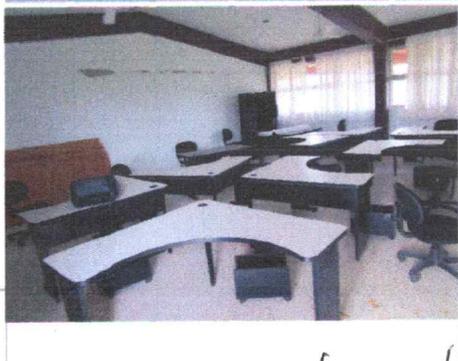

F3:

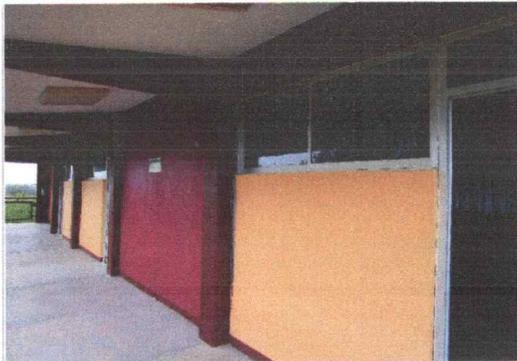

F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Viktor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRECEDENCIA P-3

Nombre de la obra: **Construcción de un sistema fotovoltaico para la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n. Carretera Ixtotec Chihuitan.
Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS




F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.




F3:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



F4:

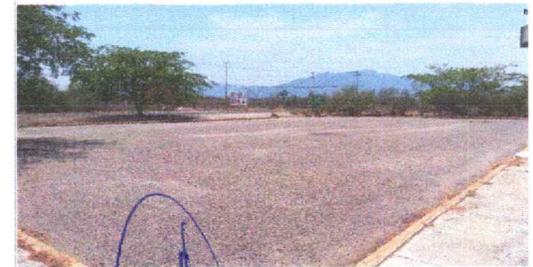

F5:

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una foto de cada una de las etapas de la obra, así como se ve necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma foto, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRORIDAD: P-4 Nombre de la obra: Equipamiento con luminarias solares en alumbrado exterior y de luminarias interiores en edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.


CROQUIS DE LOCALIZACION

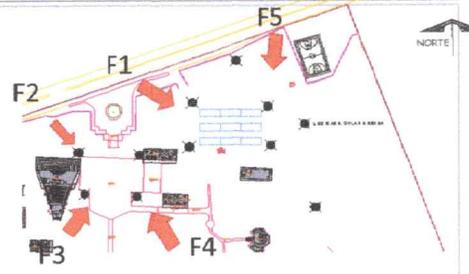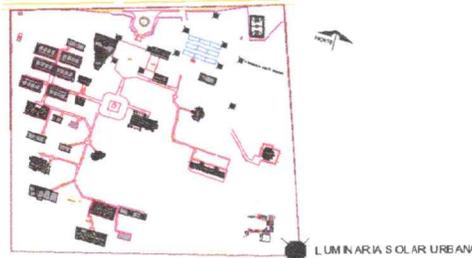

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n. Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 79780, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

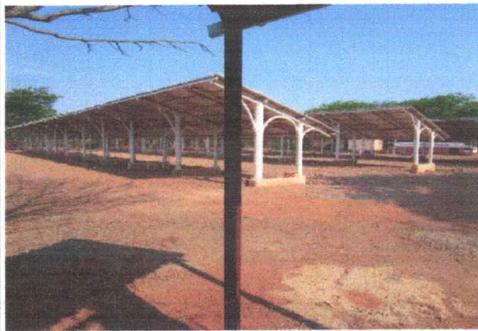

F1:



F2:


Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.



F3:



F4:

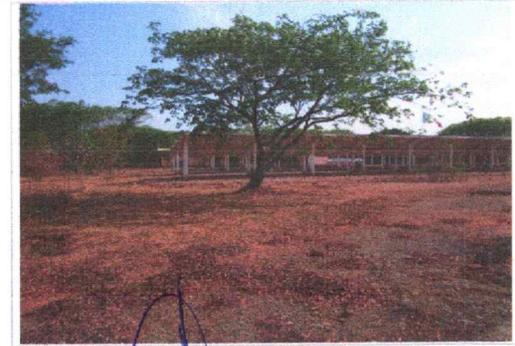

F5:

L. C. E. Eugenio Cortez Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRORIDAD P-4 Nombre de la obra: Equipamiento con luminarias solares en alumbrado exterior y de luminarias interiores en edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

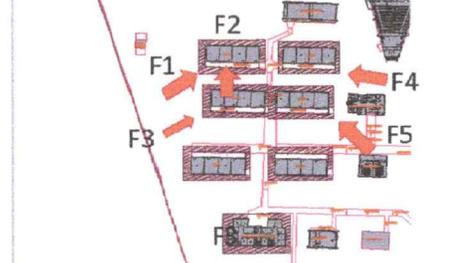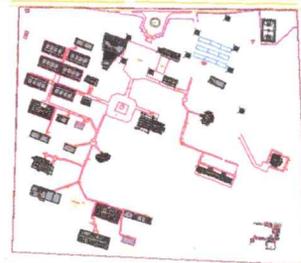


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70780, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

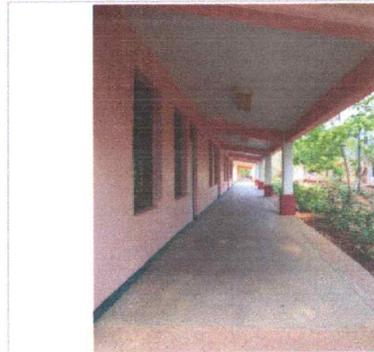


F1:

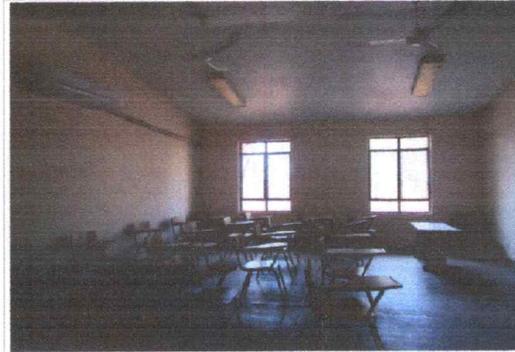

F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


No se han realizado trabajos en la obra.

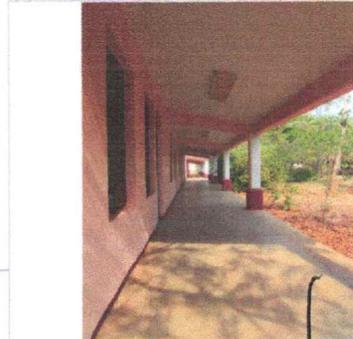

F3:



F4:

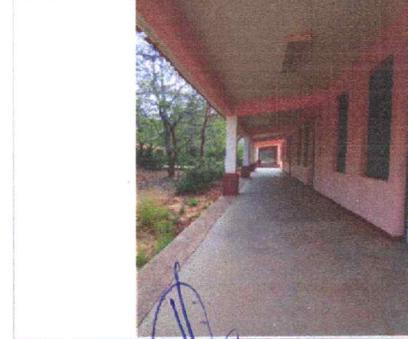

F5:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del titular de la IES



Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se indica cómo, en estas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PROYECTO P-4 Nombre de la obra: Equipamiento con luminarias solares en alumbrado exterior y de luminarias interiores en edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

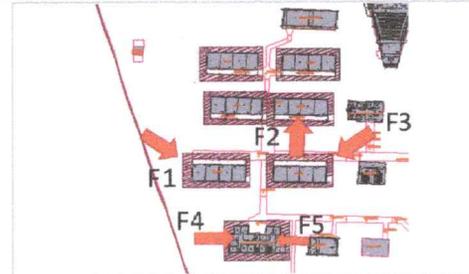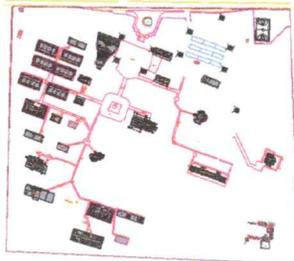


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

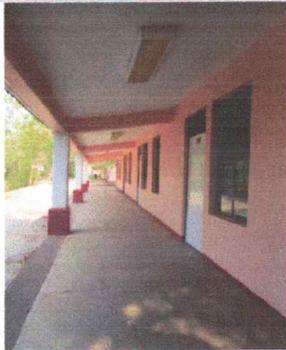


F1:

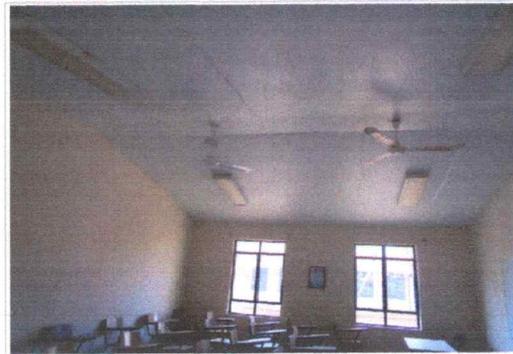

F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

No se han realizado trabajos en la obra.

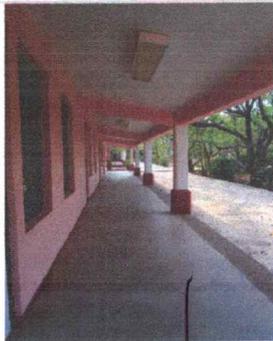

F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortez Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Víctor-Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexe una pestaña, se podrán tomar varias fotografías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, en el mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado
enero-marzo
FECHA DE CORTE 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

0

PRORIDAD **P-4** Nombre de la obra: **Equipamiento con luminarias solares en alumbrado exterior y de luminarias interiores en edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**


CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN

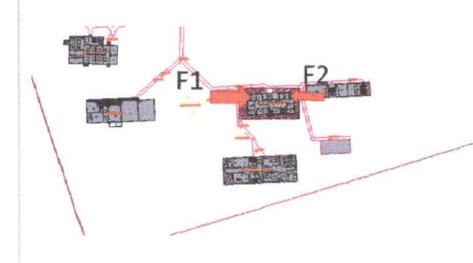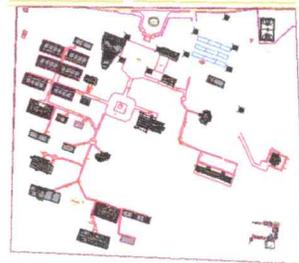


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

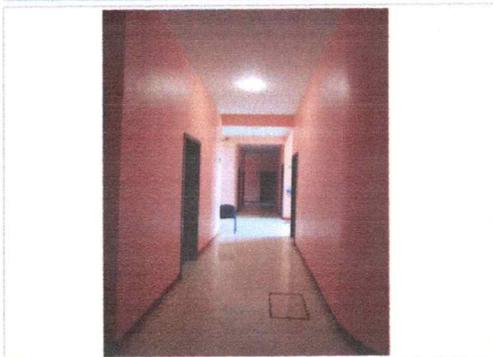

F1:

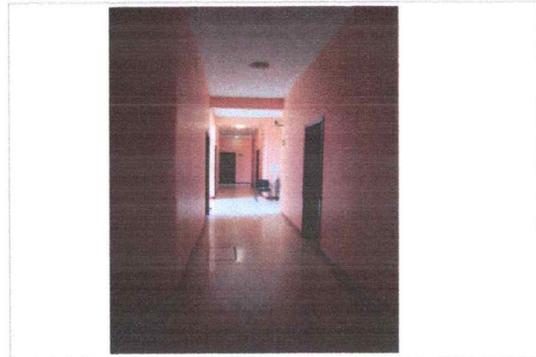

F2:

Comentarios de los trabajos realizados:
No se han realizado trabajos en la obra.



F3:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández
Nombre y firma del Titular de la IES



F4:



F5:

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podran crear tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.
