

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

enero-marzo  
FECHA DE FORTALECIMIENTO

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca

Código Inst: 911\_20MSU021P

Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Cargo: Vice-rector de Administración

Teléfono: 971 72 270 50 Ext. 306

Correo electrónico: vice\_admin@bani.unistmo.edu.mx

RESPONSABLES

Planación

Obra y Mantenimiento

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 971 71 270 50 Ext. 308

Correo electrónico: cocastah@bani.unistmo.edu.mx, deycast@bani.unistmo.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Presupuesto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Caso)	Cuenta con Actas				
		Obra de construcción	Equipamiento	Mantenimiento	Proyectos institucionales				Especializado	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con lista de costo?	¿Quién y cuándo inauguró?	Acta de inauguración del espacio	Acta de Recepción del espacio	Acta de Aceptación
P-1	Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	X				\$ 8,821,341.85	\$ 8,821,341.85	\$ -	Aulas	9	449.02	Aplazado en mano, suministro y aplicación de pintura blanca en mano, suministro y colocación de Aseo acondicionado, suministro y colocación de muebles sanitarios		100.00	20/07/20	22/02/21	La obra se adjudicó mediante el contrato de obra pública número: OPIXTIEOIN1-2020 de fecha 17 de julio de 2020. Se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMOMCO-04/2020, por \$1'308,861.12. <a href="http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/licit31.html">http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/licit31.html</a>	Si	No	No	No	No	\$8,821,341.85
P-2	Demolición y construcción del almacén de la Universidad del Istmo Campus Itepec.	X				\$ 3,868,581.08	\$ 3,868,581.08	\$ -	Almacén	1	112.00	Aplazado en mano, suministro y aplicación de pintura blanca en mano, suministro y colocación de Aseo acondicionado, suministro y colocación de muebles sanitarios		100.00	03/10/20	10/02/21	La obra se adjudicó mediante el contrato de obra pública número: OPIXTIEOIN2-2020 de fecha 21 de julio de 2020. Se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMOMCO-06/2020, por \$662,876.72. <a href="http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/licit35.html">http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/licit35.html</a>	Si	No	No	No	No	\$3,868,581.08
P-3	Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Itepec.		X			\$ -	\$ -	\$ -		0	0.00			0.00	01/07/20	28/09/20	La Dirección de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación Pública autorizó el traspaso de este recurso a la P-4 mediante la referenda DF-1044-20 del Oficio Número 6110200-2020 por lo que esta prioridad quedó cancelada.	No Obra Cancelada	No	No	No	No	No
P-4	Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Itepec.	X				\$ 1,852,559.08	\$ 1,852,559.08	\$ -	Planta Baja	1	58.71	Suministro y aplicación de pintura blanca en mano, aplazado en mano, suministro y colocación de concreto en banquetas, suministro y relleno de material de banco		100.00	18/11/20	15/02/21	La obra se adjudicó mediante el contrato de obra pública No. OPIXTIEOIN4-2020, de fecha 17 de noviembre del 2020. Se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMOMCO-08/2020, por \$87,484.79. <a href="http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/licit37.html">http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/licit37.html</a>	Si	No	No	No	No	\$1,852,559.08
						\$14,342,481.79	\$14,342,481.79	\$0.00	TOTAL	14	768.01												

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexionar tantas fotos como sea necesario.  
2 En esta sección se resalta de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos dd, mm y aa.

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad del Istmo.**  
Entidad Federativa: **Oaxaca.**  
Clave Inst: 911 20MSU021P

RESPONSABLES

Nombre: **L. C. E. Eugenio Cortés Hernández**  
Cargo: **Vice-rector de Administración**  
Teléfono: **971 72 2 70 50 Ext. \*298**  
Correo electrónico: **vice\_admin@uani.unistmo.edu.mx**

Nombre: **Ing. Víctor Hugo Castellanos García**  
Cargo: **Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento**  
Teléfono: **971 71 2 70 50 Ext. \*309**  
Correo electrónico: **cocavh@uani.unistmo.edu.mx; deptosupotras@uani.unistmo.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Reservante	Avance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Cuenta con Actas				
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacios/equipos	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Término	¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Forma de revisión (Acta de revisión)	Acta de aprobación de Entrega de Obra
GLOBAL DEL PROYECTO																						
P-5	Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.	x			\$ 1,962,910.00	\$ 1,962,910.00		Cubs. Profs. 1 346.81 IECA 1 346.81 Biblioteca 1 600.00 Cafetería 1 183.98 Pórtico 1 200.00 Depto. Profs. 1 509.96 Autoacceso 1 264.63 Lab. Electrónica 1 132.31 Auditorio 1 602.43 <b>TOTAL \$ 3,186.83</b>	Revelación de losas en edificios, colocación de bases para tramos, colocación de impermeabilizante prefabricado		100.00	13/07/20	30/10/20	La obra se adjudicó mediante contrato de obra pública número <b>OPRITIOIN2-2020</b> de fecha <b>10 de julio de 2020</b> . Se realizó el convenio Ampliatorio al Monto de Ejecución Número <b>UNISTMO-MC-022020</b> de fecha <b>10 de octubre del 2020</b> <a href="http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic32.htm">http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic32.htm</a>	SI	No		SI	SI	\$1,962,910.00		
P-6	Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	x			\$ 788,866.77	\$ 788,866.77		Cafetería 1 259.61 Vicerrectoría Académica 1 294.04 Lab. Ing. Química 1 354.08 Cubs. Profs. 1 78.84 Auditorio 1 96.00 Sanitarios Generales 1 126.28 <b>TOTAL \$ 1,208.86</b>	Revelación de losas en edificios, colocación de bases para tramos, colocación de impermeabilizante prefabricado		100.00	13/07/20	30/09/20	La obra se adjudicó mediante contrato de obra pública número <b>OPTEHIOINI-2020</b> de fecha <b>10 de julio de 2020</b> . Se realizó el convenio Ampliatorio al Monto de Ejecución Número <b>UNISTMO-MC-01102020</b> de fecha <b>20 de agosto del 2020</b> , <a href="http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic33.htm">http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic33.htm</a>	SI	No		SI	SI	\$788,866.77		
P-7	Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.	x			\$ 1,519,787.44	\$ 1,519,787.44		Excavación para Línea de Cable Inversor 1 45.05 Excavación para Línea de Cable Climas 1 36.00 Luminarias 5 Pza Climas 8 Pza <b>TOTAL 15 81.06</b>	Suministro e instalación de inversor, libranza para conexión de circuitos, conexión de circuitos en media tensión, suministro de termómetro de 4 canales, suministro y colocación de aire acondicionado en aulas		100.00	25/11/20	25/01/21	Se adjudicó a la empresa <b>CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES TRAFASCA S.A. DE C.V.</b> el contrato No. <b>OPTEHIOIN2-2020</b> con un monto de <b>\$1,388,034.13</b> , a la cual se le autorizó la terminación anticipada del contrato mencionado, ejecutándose un monto del contrato de <b>\$419,410.24</b> en un periodo del <b>03 de agosto del 2020</b> al <b>10 de octubre del 2020</b> . Posteriormente a la Terminación Anticipada se adjudicó la obra a <b>Rodolfo Caro López</b> mediante el Contrato de Obra Pública No. <b>OPTEHIOAD-01-2020</b> , de fecha <b>24 de noviembre del 2020</b> . Se realizó el Convenio Ampliatorio al Monto de Ejecución Número <b>UNISTMO-MC-0302020</b> de fecha <b>20 de noviembre del 2020</b> <a href="http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic34.htm">http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic34.htm</a>	SI	No		No	No	\$1,100,377.20		
P-8	Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x			\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		Red Sanitaria 1 270.00 <b>TOTAL 1 270.00</b>			100.00	03/08/20	30/11/20	La obra se adjudicó mediante el contrato de obra pública número <b>OPTEHIOINI-2020</b> de fecha <b>31 de julio de 2020</b> . Se realizó el convenio Ampliatorio al Monto de Ejecución Número <b>UNISTMO-MC-0302020</b> de fecha <b>20 de noviembre del 2020</b> <a href="http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic34.htm">http://www.unistmo.edu.mx/lotasioneslic34.htm</a>	SI	No		SI	SI	\$600,000.00		
					\$4,761,564.21	\$4,761,564.21	\$0.00															

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexas tantas más como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2020

3380

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100

PROYECTO P-1


Nombre de la obra:

Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CRUQUIS DE LOCALIZACIÓN



EDIFICIO DE 9 AULAS



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n. Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Aplacado en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, suministro y colocación de Aires acondicionados, suministro y colocación de muebles sanitarios.

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100

Proceso: P-1 Nombre de la obra: **Construcción de un edificio de nueve aulas con sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Aplanado en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, suministro y colocación de Aires acondicionados, suministro y colocación de muebles sanitarios.



F3:



F4:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia



Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.



Porcentaje de avance  
**100**

PROCESOS P-2 Nombre de la obra **Demolición y construcción del almacén de la Universidad del Istmo Campus Itepec.**

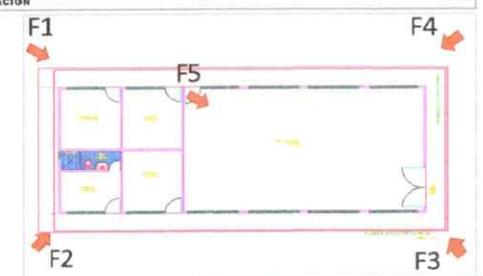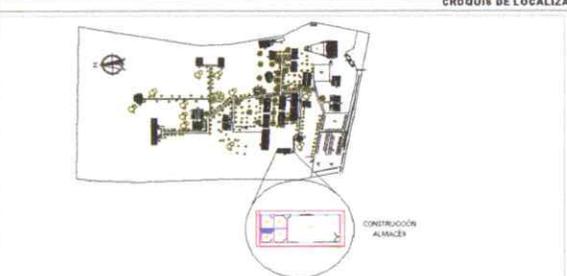

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec Chihuitan,  
 Ciudad Itepec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS



Comentarios de los trabajos realizados:

Aplanado en muros, suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, suministro y colocación de Aires acondicionados, suministro y colocación de muebles sanitarios.

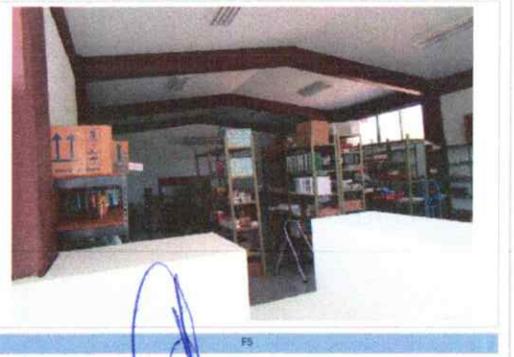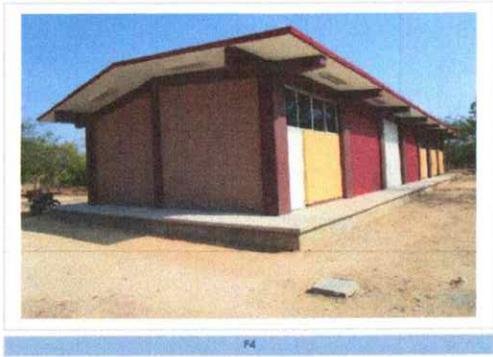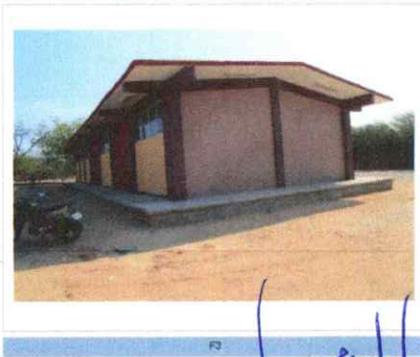

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández  
 Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Gasalanda García  
 Nombre y firma del Titular de Obras / Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance


0

PROYECTO P-3 Nombre de la obra: **Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

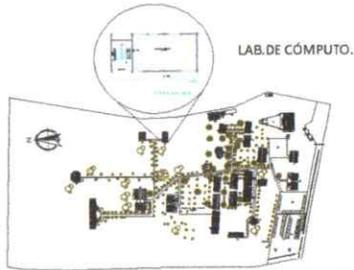

LAB. DE CÓMPUTO.

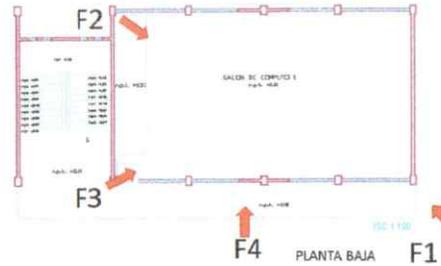


PLANTA BAJA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec  
Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS

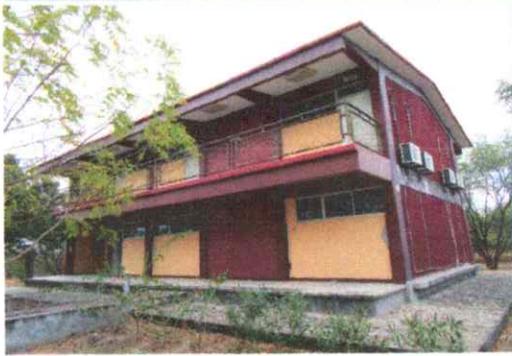

F1:



F2:



F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

Prioridad Cancelada.

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

P-3 Nombre de la obra:

**Reparación del Laboratorio de Cómputo en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

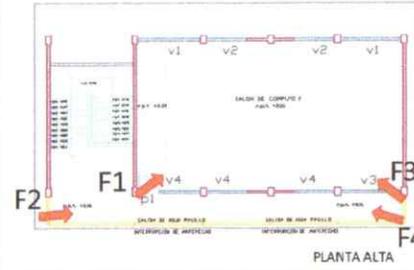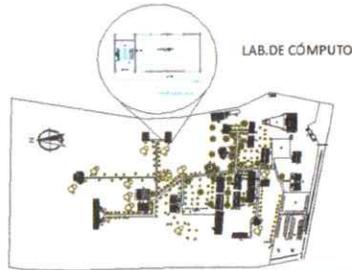

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec  
Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110



Porcentaje de avance

0

FOTOS



P1:



P2:



P3:



P4:

Comentarios de los trabajos realizados:

Prioridad Cancelada.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERTSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

100

P-4 Nombre de la obra: **Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

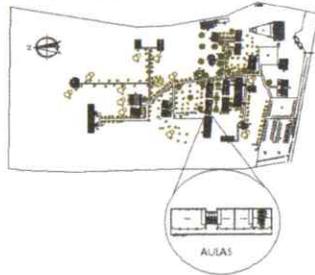


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec  
Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1

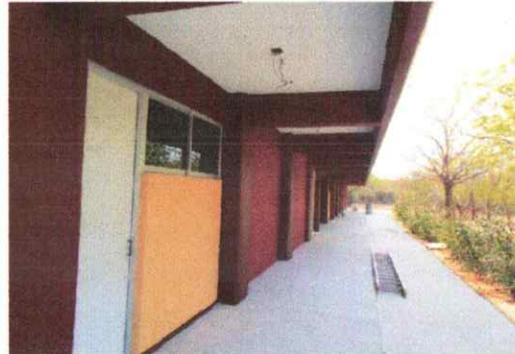

F2

Comentarios de los trabajos realizados:


Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, aplastados en muros, firme de concreto en banquetas, suministro y relleno de material de banco.



F3



F4

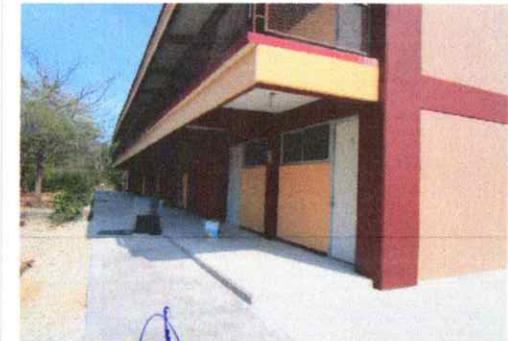

F5

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31-03-2021

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance

100


PROYECTO

P-4


Nombre de la obra:

Reparación del edificio de siete aulas y tres anexos en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

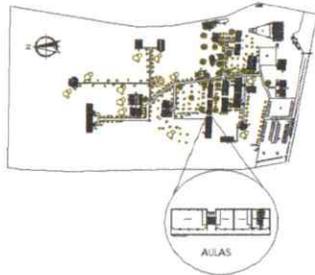

AULAS



F2 PLANTA ALTA

F3

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec Chihuitan, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1



F2



F3

Comentarios de los trabajos realizados:

Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, aplastados en muros, firme de concreto en banquetas, suministro y refino de material de banco.

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**enero-marzo**

FECHA DE EDITE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

**100**

Proyecto: P-5

Nombre de la obra: **Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec Chihuitan, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110


FOTOS




F1:



F2:

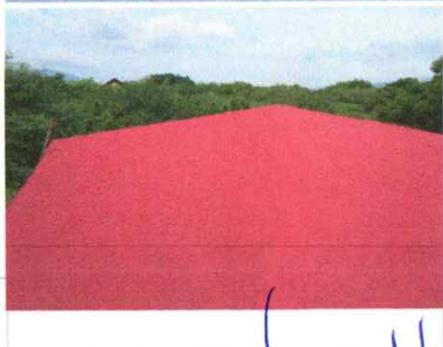

F3:

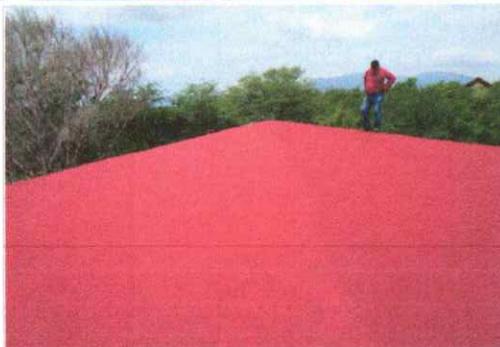

F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F5:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100

PROYECTO P-5 Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasos de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Itepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

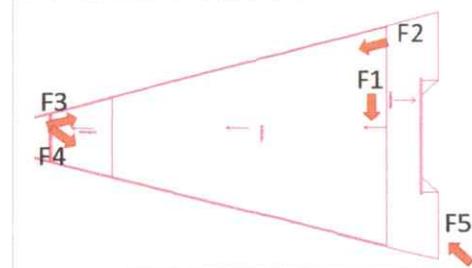

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec Chihuitan.  
Ciudad Itepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS




F1:



F2:



F3:

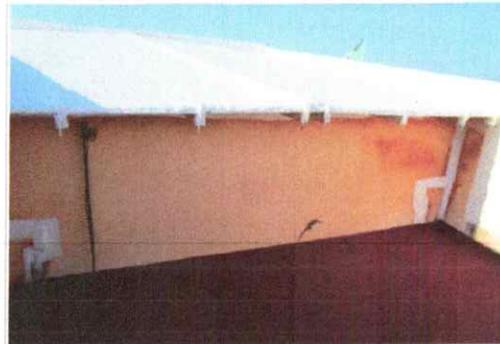

F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO




Proyecto: **P-5** Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

Porcentaje de avance

**100**

BIBLIOTECA

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n. Carretera Ixtotec Chihuitan.  
Ciudad Ixtotec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F3



F4

L. C. E. Eugenio Corral Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**enero-marzo**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance


**100**

PROYECTO: P-5 Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




CAFETERÍA

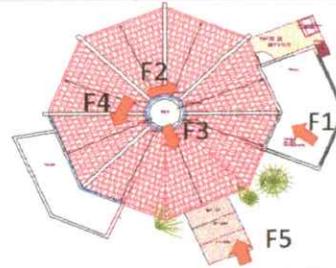


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtotec Chihuitan, Ciudad Ixtotec, Oaxaca, CP. 70110


FOTOS

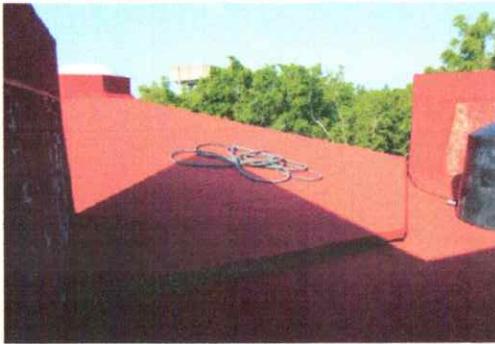

F1:

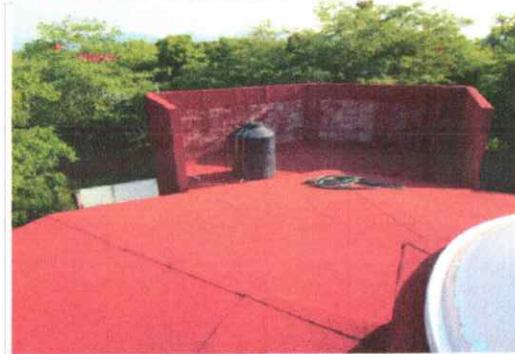

F2:

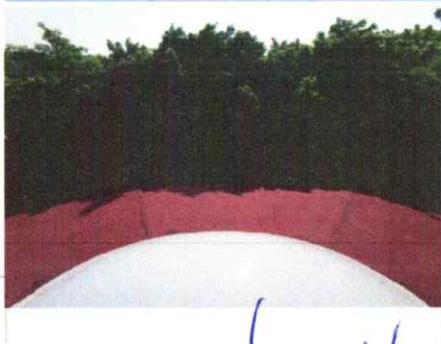

F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F5:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

PROGRAMA P-5 Nombre de la obra: **Rehabilitación e Impermeabilización de lasos de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Istepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Istepec Chihuitan, Ciudad Istepec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Vidor Hugo Castellanos Garcís

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfica de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2014

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance


**100**

**P-5** Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Itepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CUBICULO DE PROFESORES



UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec Chihuitan,  
Ciudad Itepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra terminada



F3



F4



F5

*[Signature]*  
L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

*[Signature]*  
Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario.  
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
TEMA DE OBTI: 31/05/2021

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance


100

PROYECTO: P-5 Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



INSTITUTO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS (IECA)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n. Carretera Ixtpec Chihuitan.  
Ciudad Ixtpec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS




F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.

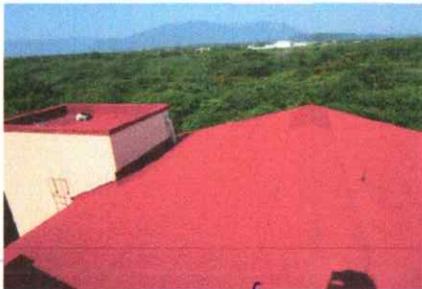

F3



F4



L. C. E. Eusebio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Casillas García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FICHA DE CORTE: 31-032421

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

PROYECTO: P-5 Nombre de la obra: **Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

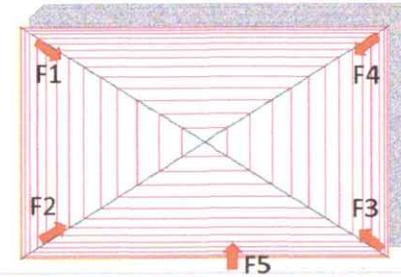

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec Chihuitan,  
Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.

L. C. B. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100

PROYECTO:

P-6

Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



LABORATORIO DE INGENIERÍA QUÍMICA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F3:



F4:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance


100

Proyecto P-6


Nombre de la obra

Rehabilitación e impermeabilización de lasas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

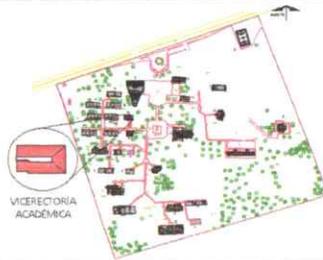

VICERECTORIA ACADÉMICA



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




VICE-RECTORIA ACADÉMICA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

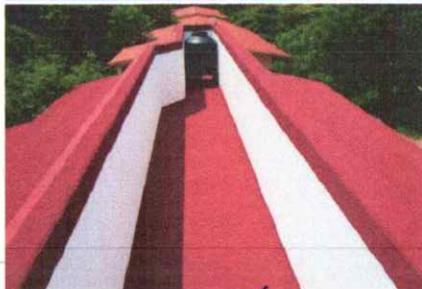

F2



F3

L. C. E. Eugenio Cortez Herrero

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

100

PROYECTO P-6


Nombre de la obra

Rehabilitación e impermeabilización de las losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CAFETERIA

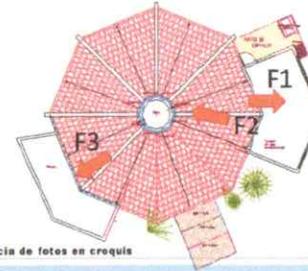


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

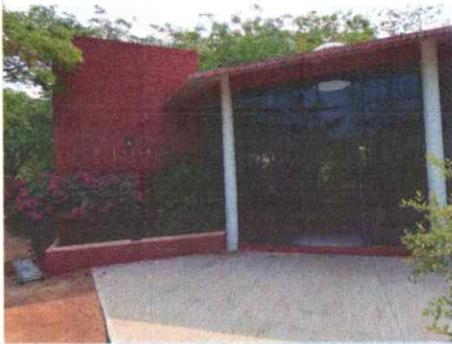

CAFETERIA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada



F2



F3

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2014

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance


100

P-6 Nombre de la obra: **Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CUBICULO DE PROFES



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



CUBICULO DE PROFESORES



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F2



F3



F4

L. C. E. Esmerino Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma de Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance:



100

PRECIOSIDAD P-6

Nombre de la obra:

Rehabilitación e impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

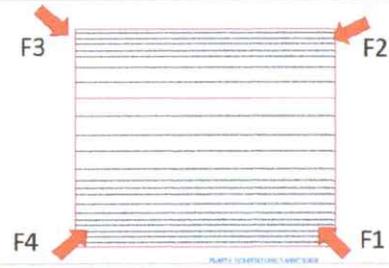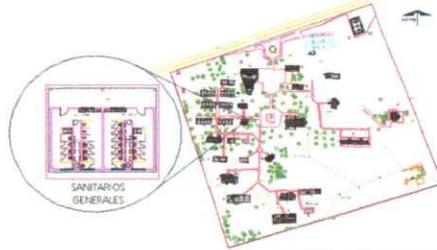

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70780, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



SANITARIOS GENERALES



F1

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada



F2



F3

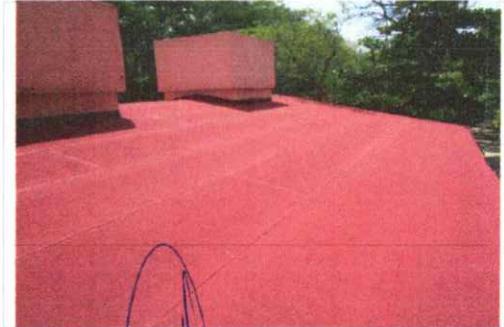

F4

L. C. E. Eusebio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para lo antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance


100

PROYECTO: P-6 Nombre de la obra: Rehabilitación e Impermeabilización de losas de los edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CRÓQUIS DE LOCALIZACIÓN



AUDITORIO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



AUDITORIO



F1



F2



F3

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

100

PROYECTO P-7 Nombre de la obra:

Ampliación del sistema fotovoltaico para el suministro e instalación de climas para las aulas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

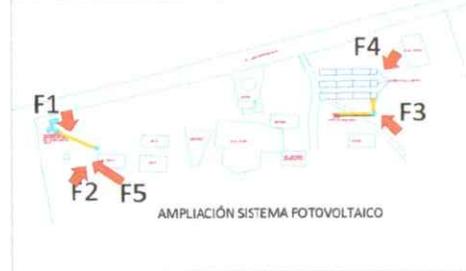

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Suministro e instalación de inversor, libranza para conexión de circuitos, conexión de circuitos en media tensión, suministro de termómetro de 4 canales, suministro y colocación de aire acondicionado en aulas.



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Vidor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**enero-marzo**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

**100**

PROYECTO: P-8 Nombre de la obra: **Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

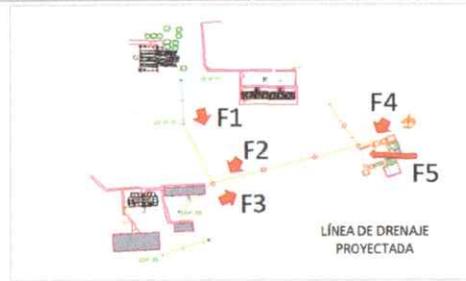

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3:

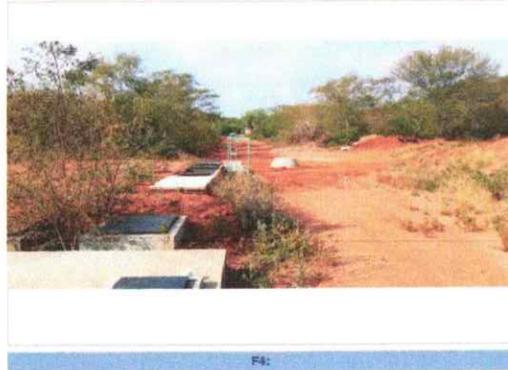

F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortéz Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obra y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2020

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

PRECEDENCIA: P-8 Nombre de la obra: **Mantenimiento del edificio de sanitarios y los sanitarios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

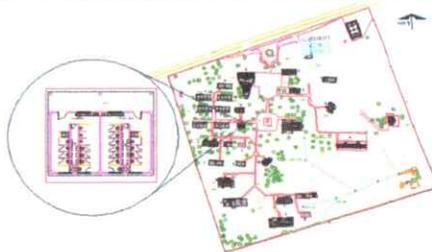

SANITARIOS GENERALES

F1

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
