

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst 911 20MSJ0021P

Nombre: M.A. Oscar Carlos Olivares  
Cargo: Vice-rector de Administración  
Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. 306  
Correo electrónico: vic\_achar@uam.unistmo.edu.mx

RESPONSABLES

Obra y Mantenimiento  
Nombre: Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia.  
Cargo: Jefe de departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.  
Teléfono: 971 71 2 70 50 Ext. 306  
Correo electrónico: cocasam@uam.unistmo.edu.mx, eproyosubos@uam.unistmo.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Número	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios, Risks, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que solicitan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Es ejecutable de acuerdo al "Cobranza"?	Cuenta con Actas				
		Obra de infraestructura	Equipamiento	Proyecto sustentable				Espacio/Agrupos	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con actas de obra?	¿Cuenta con actas de entrega?	¿Remanente por incluir?	¿Se ha iniciado el proceso de liquidación?	¿Se ha iniciado el proceso de pago?
1	Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x			\$ 3,195,876.22	\$ 3,195,876.22	\$	3	1	193.00		Trabajos de pintura	97.0	11/09/19	15/04/21	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	Si	No	No	No	No	\$0.00
2	Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x			\$ 3,050,200.00	\$ 3,050,200.00	\$	12	1	427.87			100.0	21/09/19	31/03/20	Obra Terminada.	Si	No	Si	Si	\$3,050,200.00	
3	Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán	x			\$ 1,338,078.85	\$ 1,338,078.85	\$	44	1	0.00			100.0	25/10/19	31/03/20	Obra Terminada.	Si	No	Si	Si	\$1,338,078.85	
5	Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x			\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$	16	1	185.98		Trabajos de pintura	98.0	23/08/19	15/04/21	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	Si	No	No	No	\$0.00	
					\$8,283,953.87	\$8,283,953.87	\$0.00															

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019

ANC



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**abril-junio**  
RESOLUCIÓN DE CORTE: 50/06/2019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo.  
Entidad federativa: Oaxaca.  
Clave Inst: 911 20MSU0021P

RESPONSABLES

Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández  
Cargo: vice-rector de Administración  
Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. 1206  
Correo electrónico: vice\_admin@gob.unistmo.edu.mx

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García  
Cargo: Jefe de departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.  
Teléfono: 971 72 2 70 50 Ext. 1209  
Correo electrónico: vcastell@unistmo.edu.mx, deptoepobras@admunistmo.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Número	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejecutado	Reversamiento	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>			Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿El presupuesto de inversión cubre?	Cuenta con Actas				
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Accesorios y mobiliario	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/espacios	cantidad				metros cuadrados	Inicio			Termino	¿Se ha reportado?	¿Se ha reportado?	¿Se ha reportado?	¿Se ha reportado?
7	Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.			x		\$ 6,800,000.00	\$ 6,800,000.00				8			100.0	03/10/19	31/03/20	Los trabajos se encuentran concluidos	Si	No		Si	Si	\$6,800,000.00
									<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>												
8	Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.			x		\$ 230,250.00	\$ 230,250.00				1	1182.00		100.0	05/09/19	31/01/20	Los trabajos se encuentran concluidos	Si	No		Si	Si	\$230,250.00
									<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1182.00</b>												
10	Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Itepec.			x		\$ 828,229.20	\$ 828,229.20				22	0.00		100.0	12/11/19	15/01/20	Los equipos se encuentran instalados y funcionando correctamente.	Si	No		Si	Si	\$828,229.20
									<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>												
						<b>\$7,78,478.20</b>	<b>\$7,78,478.20</b>	<b>\$0.00</b>															

N.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

<sup>1</sup> Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar fotos como sea necesario.  
<sup>2</sup> En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
<sup>3</sup> Es importante que las fechas de inicio y termino estén actualizadas. Todas en los dígitos de: mm y aa.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

**97**

PRORIDAD **1**

Nombre de la obra: **Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

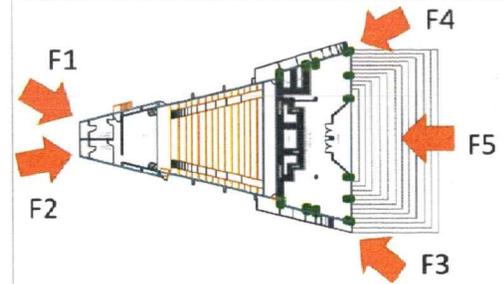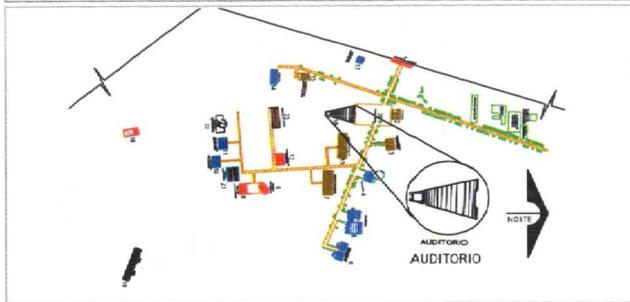

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transísmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1.



F2.

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes por realizar.



F3.



F4.



F5.

Nombre y firma del titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE OBRAS: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance


100

PRIMARIA

2


Nombre de la obra: **Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

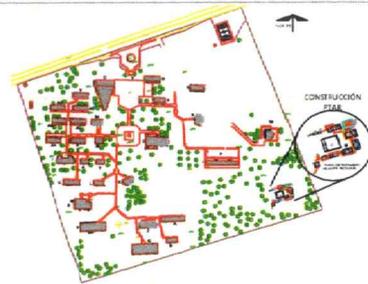

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO


Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

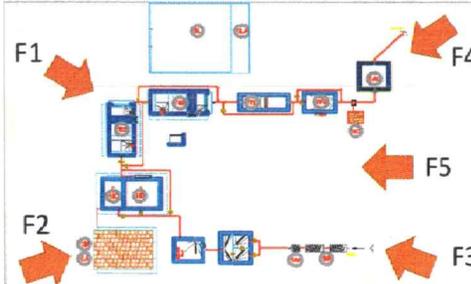

FOTOS




F1

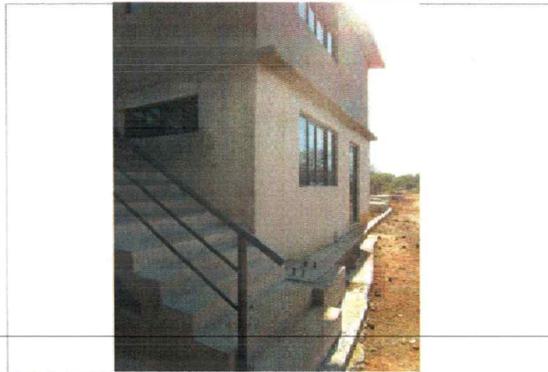

F2


Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra terminada.

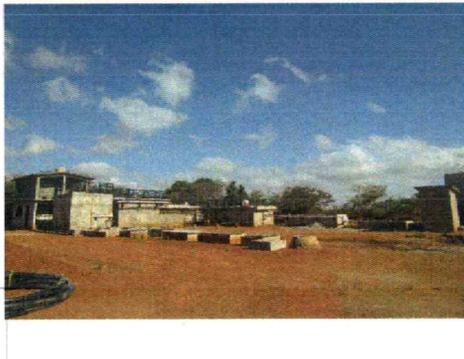

F3



F4

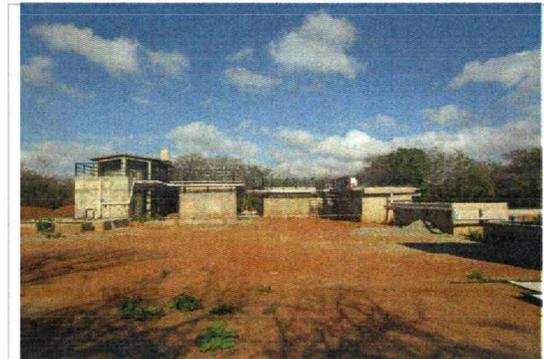

F5

M.A. Osorio Pineda  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reparte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AVG

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


100

PRIOIDAD

3

Nombre de la obra: **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

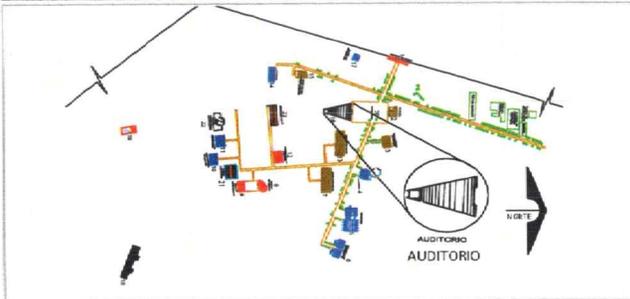


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica  
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de  
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS

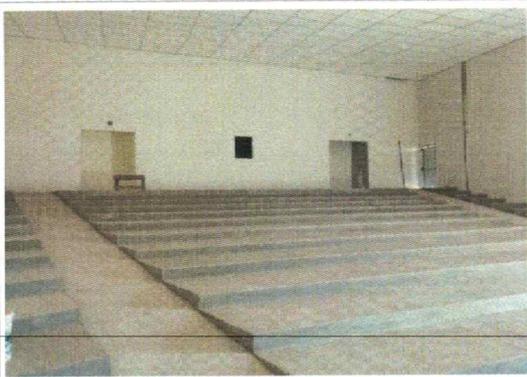


F1:

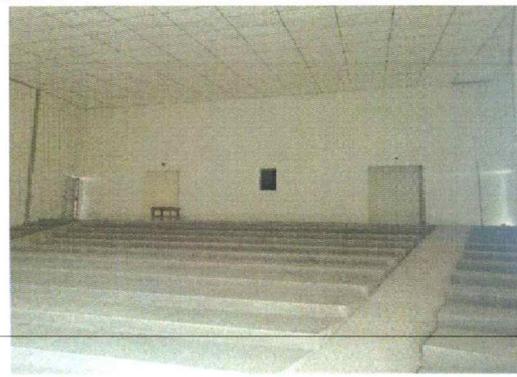

F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

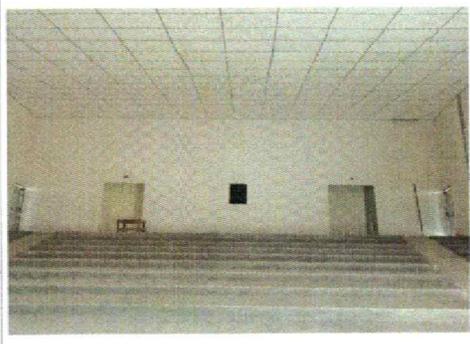

F3:



F4:

M.A. César Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**abril-junio**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

**100**

PRIMORDIAL **3** Nombre de la obra **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

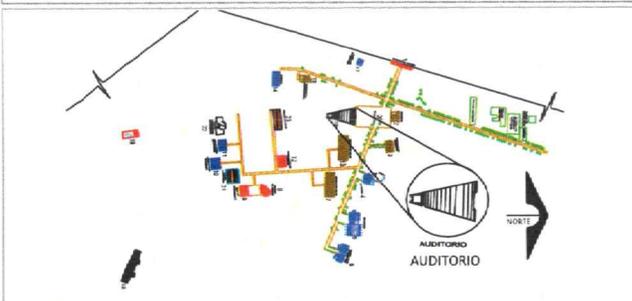

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS

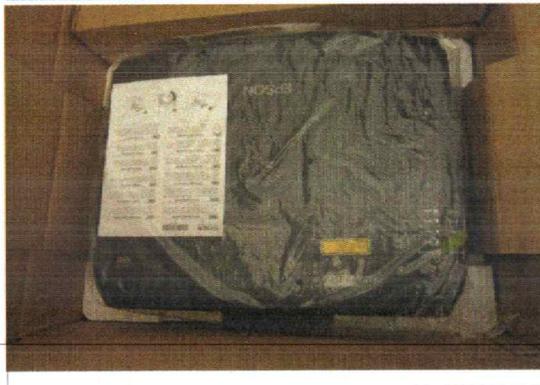

F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F3:



F4:



F5:

M.A. Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100


PRICIDAD

3

Nombre de la obra:

**Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

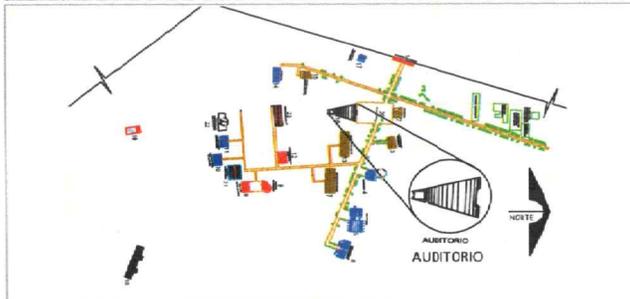

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica  
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de  
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada



F3:



F4:

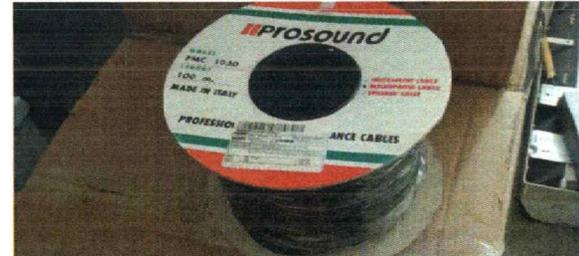

F5:

M.A. Oscar Torres Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

AVO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado

**abril-junio**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**100**


PRIMORDIA

**3**

Nombre de la obra:

**Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

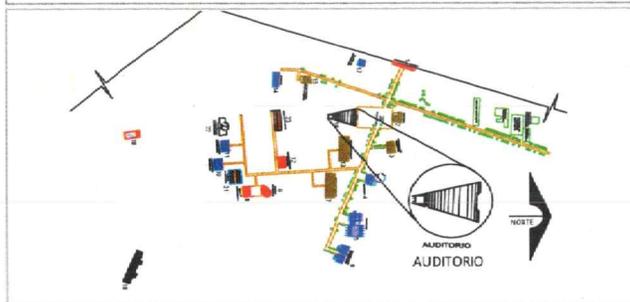

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica  
Juchitán-La ventosa - Km. 14. Heroica Ciudad de  
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca C. P. 70102

FOTOS



F1




F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra temirada



F3



F4



F5

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaja, se podrán copiar tantas pestajas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes:reporte: **abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

**98**

PROYECTO **5**

Nombre de la obra **Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

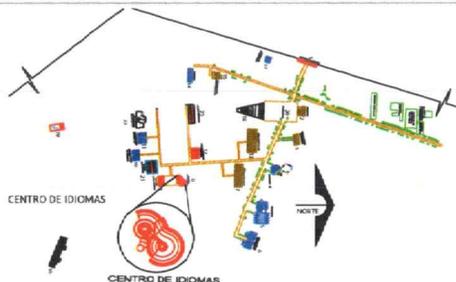


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transísmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C.P. 70102


FOTOS

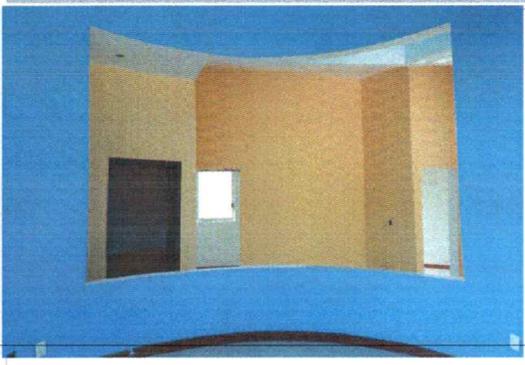

F1



F2

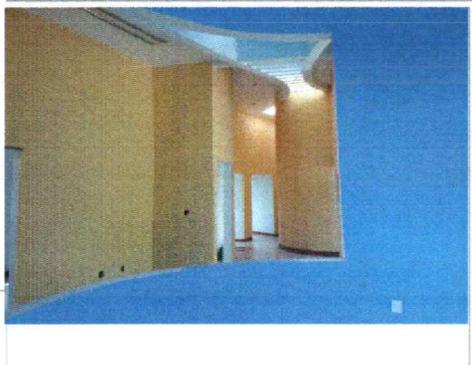

F3

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes por realizar:

M.A. Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

abril-junio

FECHA DE CREACIÓN: 31/08/2011

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance


98

PROYECTO

5

Nombre de la obra: **Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

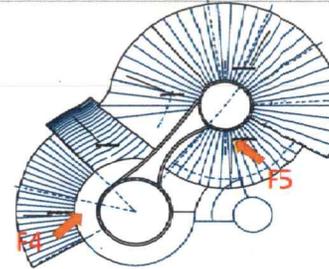


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS

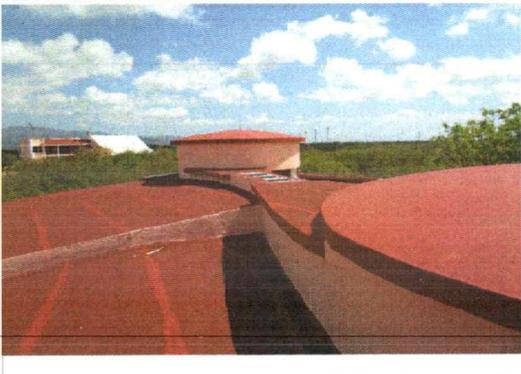

F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos pendientes por realizar:

M. A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.


2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE 15/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance


**100**

PRIMORDIA 7


Nombre de la obra

**Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

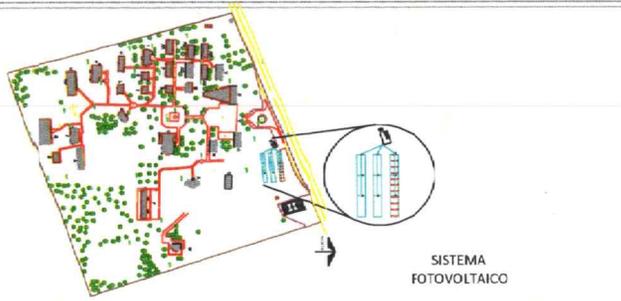

SISTEMA FOTOVOLTAICO

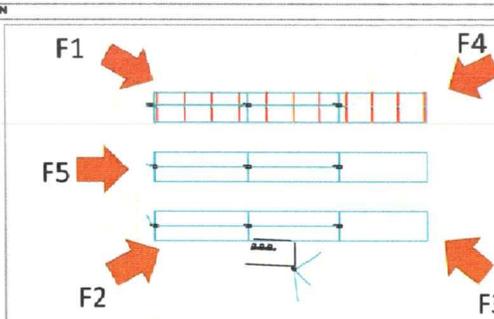


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:

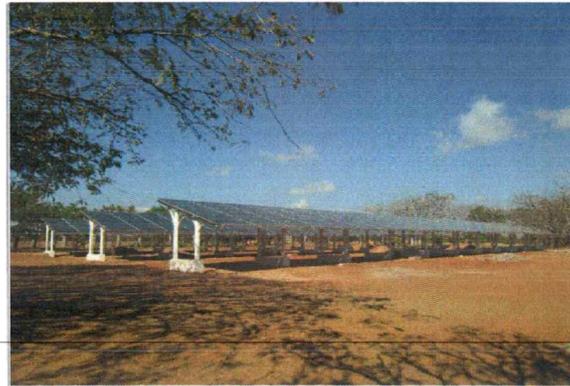

F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada



F3:



F4:

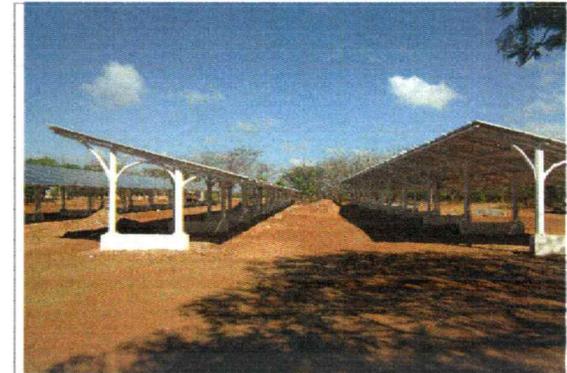

F5:

M.A. Oscar Corón Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance


**100**

PROYECTO

10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

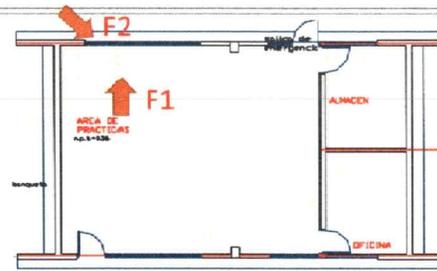


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax.  
México C.P. 70110.

FOTOS



LABORATORIO DE ELECTRÓNICA

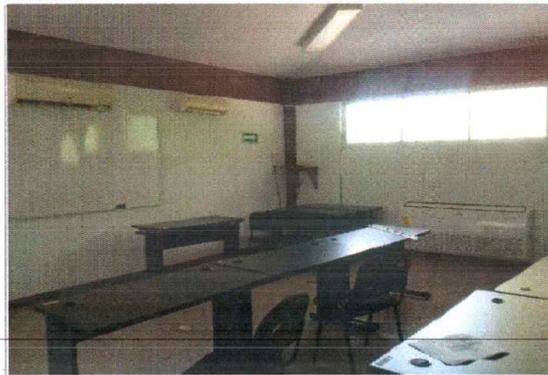

F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Corateminada.



F2

M. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

100


PROYECTO 10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




VICER-ECTORÍA DE ADMON.

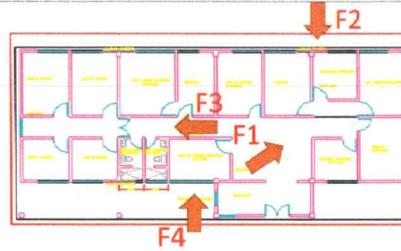

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

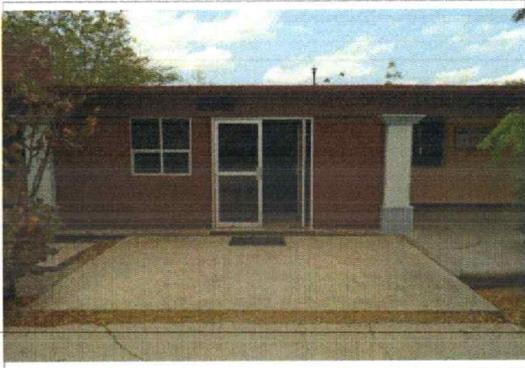


VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada.

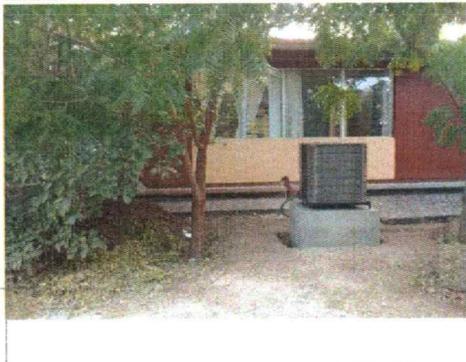

F2



F3



F4

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance



**100**

PROYECTO

**10**

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

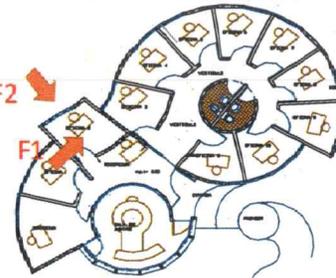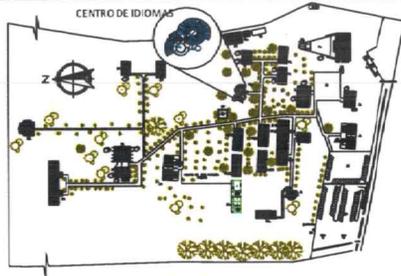

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

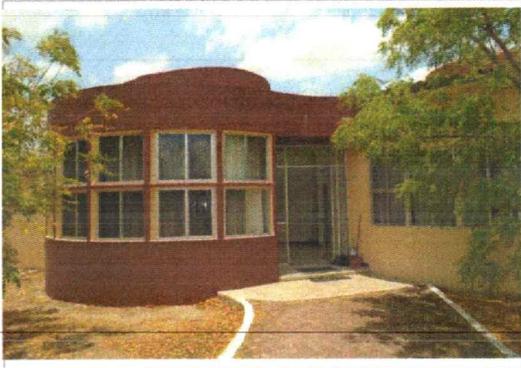


CENTRO DE IDIOMAS



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

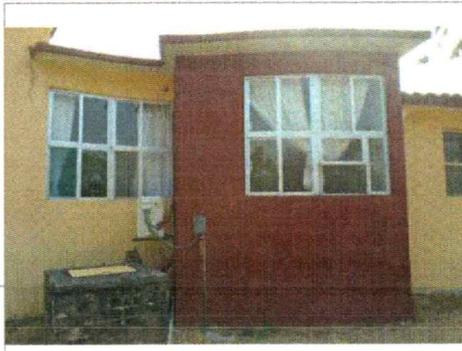

F2

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance

100

PRORIDAD

10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CUBÍCULO DE PRORS I



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CUBÍCULO DE PRORS I



F1: SALA DE JUNTAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/05/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

100


PRIMORDIAS 10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

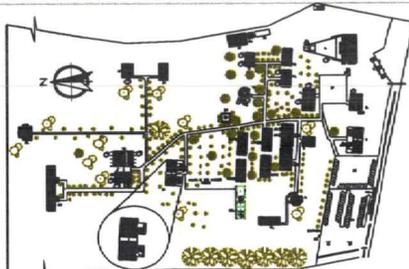

CUBÍCULO DE PROFES II



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec. Oax.  
México C.P. 70110.

FOTOS



CUBÍCULO DE PROFES II



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada



F2

M.A. Oscar Cedás Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance

100

PROYECTO

10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



DEPARTAMENTO DE RED


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitán-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.



Referencia de fotos en croquis

FOTOS

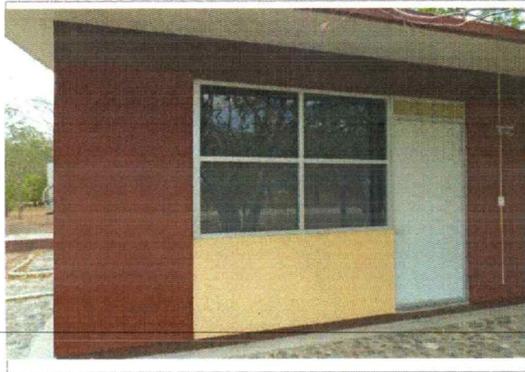


EDIFICIO DE RECTORIA



PL. DEPARTAMENTO DE RED

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas.

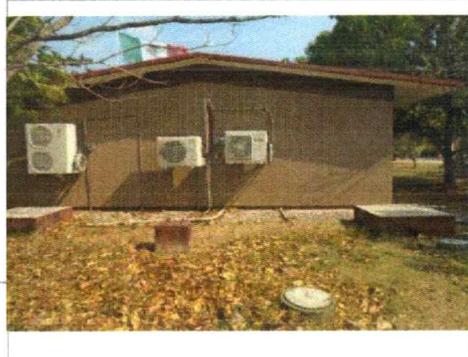

F2

M.A. Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportada  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**100**

PRIORIDAD

10


Nombre de la obra

**Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




AULAS DE DOS NIVELES

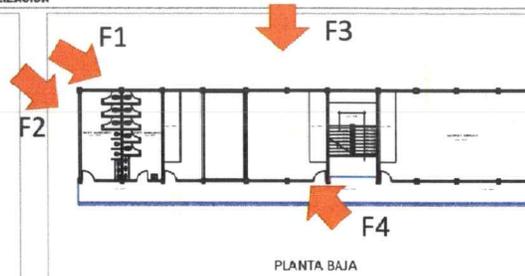


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

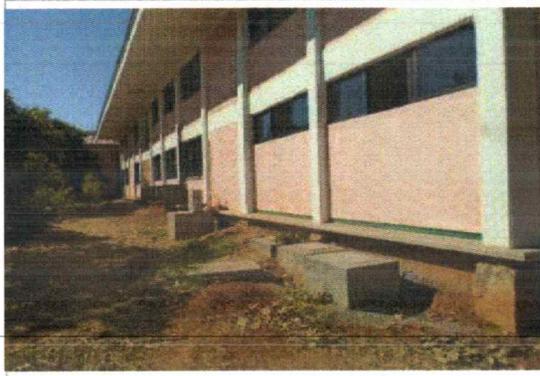


F1:

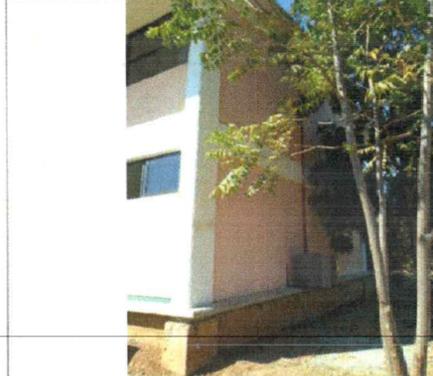

F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

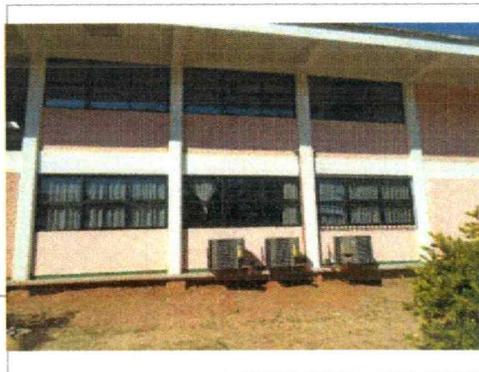

F3:



F4: AULA 26

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
PESQUERA DE CORTE "5658203"

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**100**

PRIORIDAD

**10**


Nombre de la obra

**Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




AULAS DE DOS NIVELES

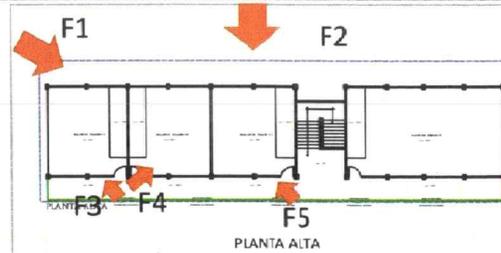

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS

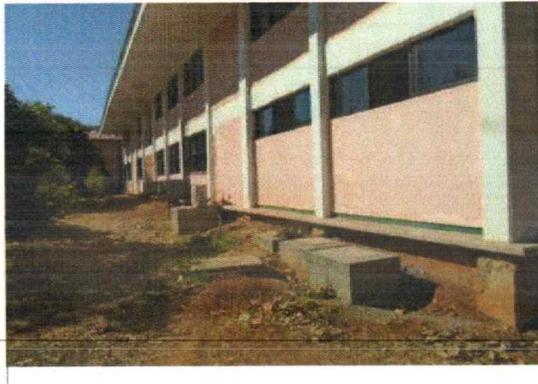

F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada.



F3: AULA 27

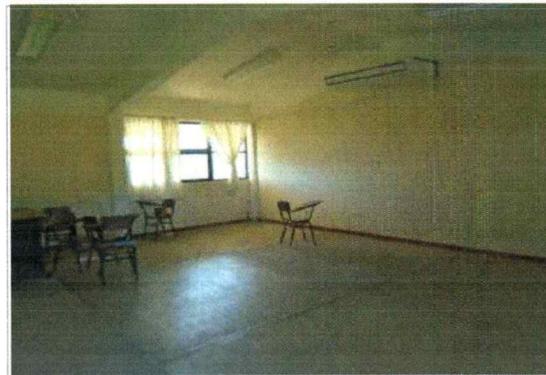

F4: AULA 28

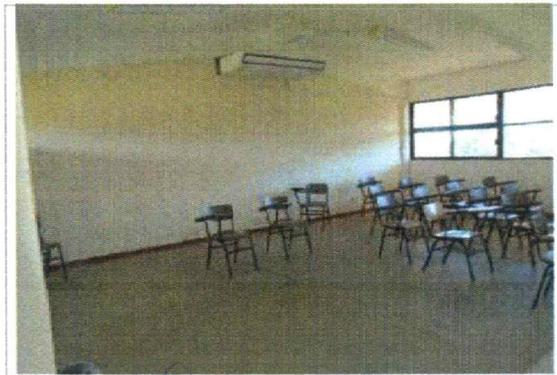

F5: AULA 29

M.A. Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

100

RHORIZAD

10


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



BIBLIOTECA

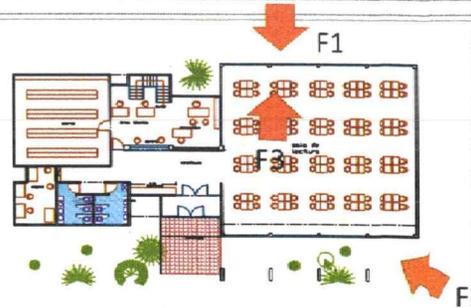

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n. Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3:



F4:



F5:

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ig. Víctor-Igdo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe report\* fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**abril-junio**  
PESTAÑA DE CORTE: 30/96/2007

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance

100


PRORIDAD

10

Nombre de la obra

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

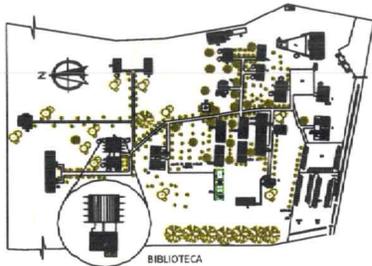

BIBLIOTECA



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS




BIBLIOTECA



F1: ACERVO PLANTA BAJA

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada

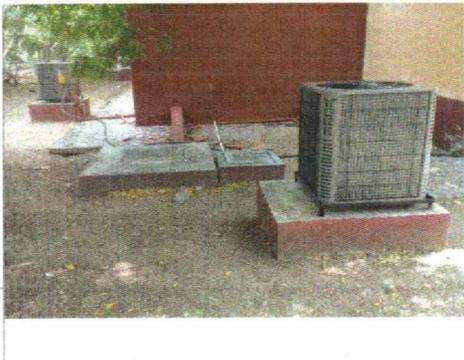

F2



F3: SALA DE LECTURA PLANTA BAJA



F4

M.A. Decay Cortés Olivares

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance


100

PROYECTO

10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

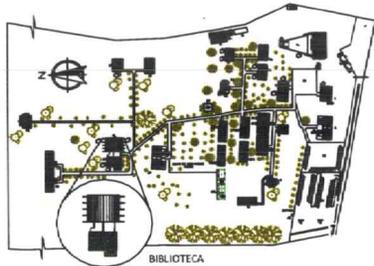

BIBLIOTECA




Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

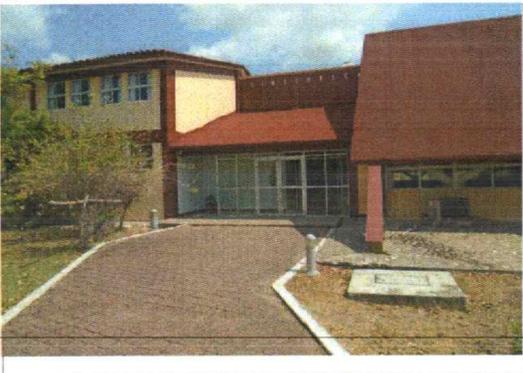


BIBLIOTECA

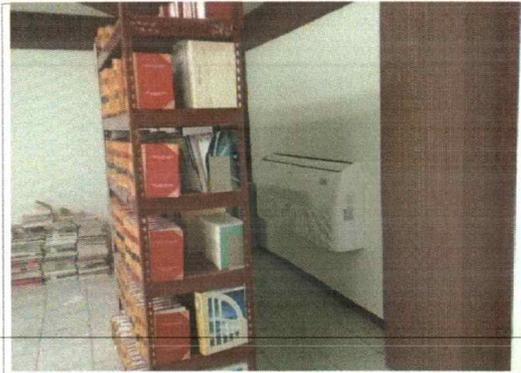

F1: ACERVO PLANTA ALTA

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada

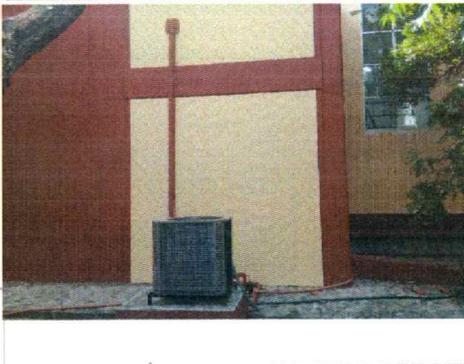

F2



M.A. César Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2011

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

100

PROYECTO 10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

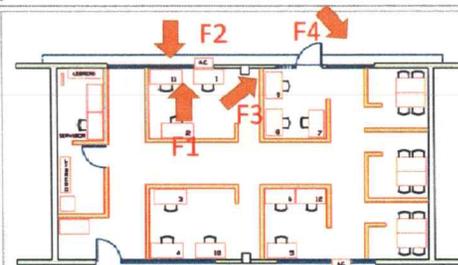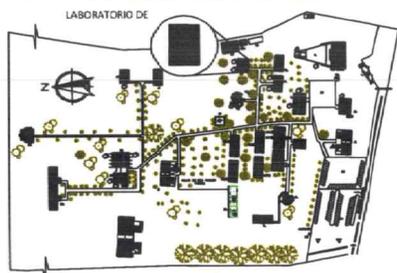

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitán-Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



LABORATORIO DE AUTOACCESO



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas



F2



F3



F4

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Jefe de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO





Porcentaje de avance

100

PROYECTO 10

Nombre de la obra **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

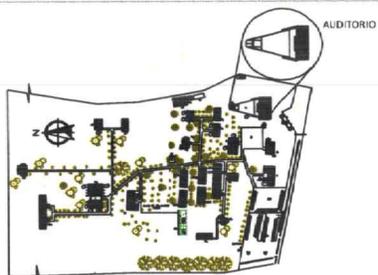


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitán-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

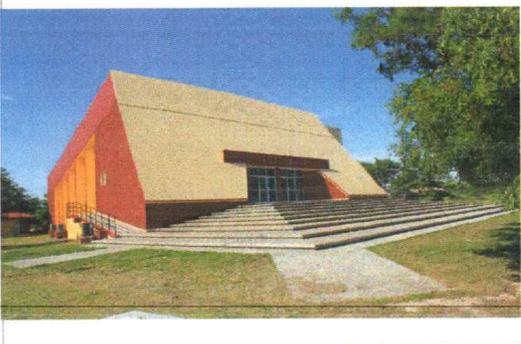


AUDITORIO



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada.

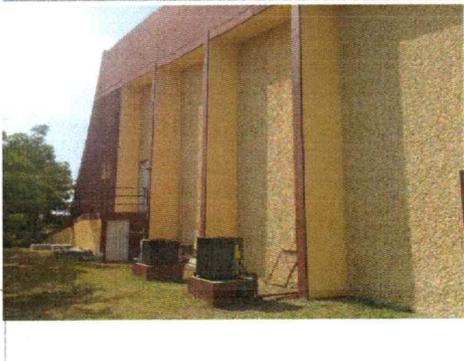

F2



F3



F4

M.A. Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

abril-junio

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO



Porcentaje de avance

100

PROYECTO

10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



RECTORÍA

F2

F1




Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitán-Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec, Oax., México C.P. 70110.


FOTOS

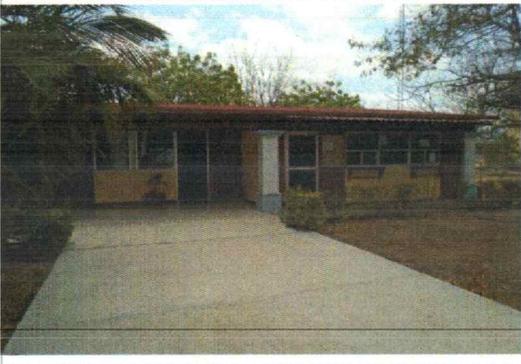

EDIFICIO DE RECTORÍA



F1: SALA DE JUNTAS

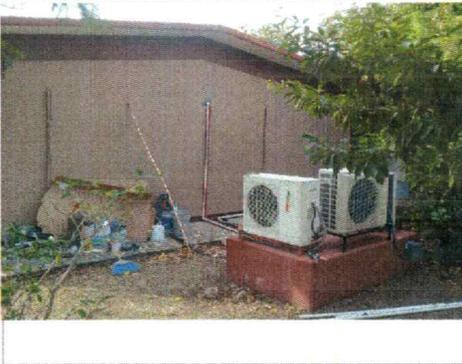

F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada

M.A. Oscar Corrales Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

**abril-junio**

FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRAFICO

PRORIDAD

10


Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**



Porcentaje de avance

**100**


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

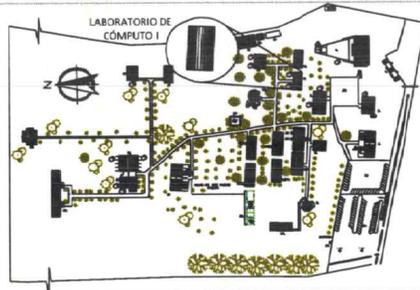

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

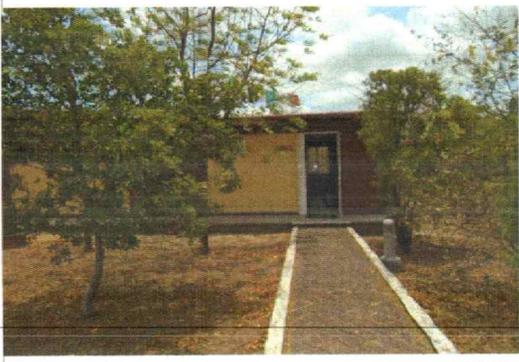


SALA DE COMPUTO I



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada.

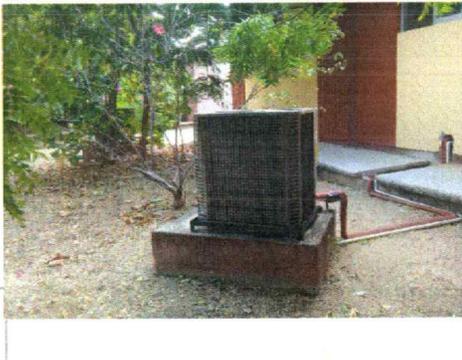

F2



F3



F4

M.A. Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y alineaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**abril-junio**  
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

**100**

PRIORIDAD **9**

Nombre de la obra: **Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

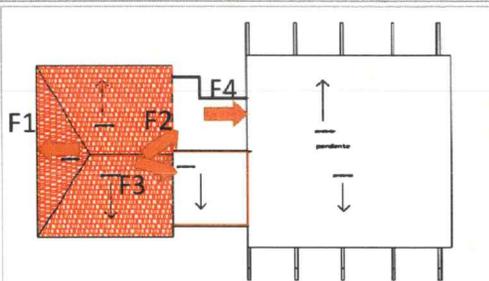


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




BIBLIOTECA

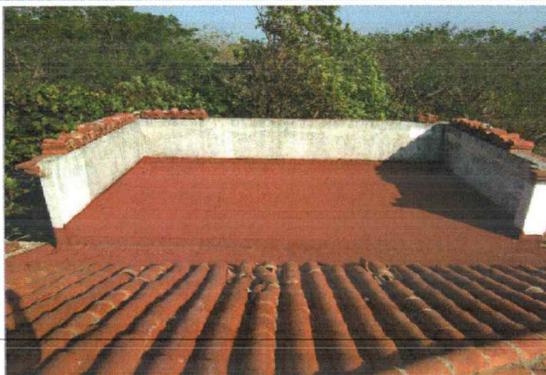

F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminadas

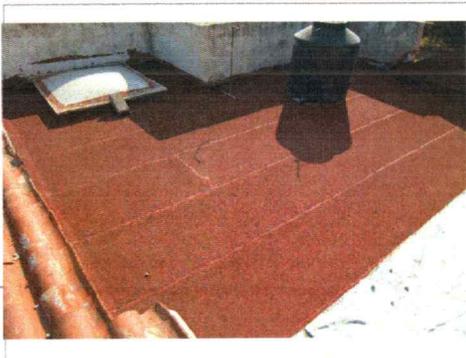

F2



F3



F4

~~M.A. Oscar Cisneros Olivares~~

Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y ejecuciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
