



OFICIO No. 228/VRA/UNISTMO/2023

Asunto: El que se indica.

Santo Domingo Tehuantepec, Oax.; a 08 de marzo de 2024

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

Estimado Director:

En atención a su oficio de número 511/2023-1009-3, con asunto: informe de avance FAM 2023, donde como primer punto se expone el Informe realizado por esta institución correspondiente al cuarto trimestre (octubre-diciembre) del año 2023 de las obras apoyadas con recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples ejercicio fiscal 2023 y que le fueron remitidas con el oficio No.28/VRA/UNISTMO/2024, al respecto hago de su conocimiento que al 31 de marzo de 2024 las obras autorizadas a esta institución presentan un avance físico y financiero del 100%, como se refleja en el primer reporte correspondiente al primer trimestre del año 2024 para el ejercicio del FAM 2023 referente a los meses de enero – marzo del año 2024 que se envía y sustentado por la documentación comprobatoria que se anexa al presente.

A continuación, se describen las obras que fueron asignadas a esta Institución Educativa, señalando la fecha real de conclusión de cada una de ellas.

PRIORIDAD.	OBRA FAM 2023/CONTRATOS	MONTO EJERCIDO	FECHA DE CONCLUSIÓN	OBSERVACIONES
P-1	Terminación de un edificio para posgrado en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec. EO-920051985-N1-2023 UNISTMO/MOD/N1-01/2023 UNISTMO/MOD/N1-02/2023	\$12,000,000.00	25/03/2024	Con fecha 15 de septiembre de 2023, se firma el contrato de Obra Pública No. EO-920051985-N1-2023. Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el convenio No. UNISTMO/MOD/N1-01/2023, con un monto ampliatorio de \$2,792,691.20 IVA incluido y un periodo de ejecución del 16 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024. Con fecha 12 de febrero de 2024 se firma el convenio No. UNISTMO/MOD/N1-02/2023, con un periodo de ampliación del 15 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024. La obra presenta un avance del 100% con fecha 25 de marzo de 2024. Con fecha 27 de marzo de 2024 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos; la obra se encuentra en proceso de finiquito.



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

www.unistmo.edu.mx

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

P-2	<p>Construcción de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec (primera etapa).</p> <p>EO-920051985-N2-2023</p> <p>UNISTMO/MOD/N2-01/2023</p> <p>UNISTMO/MOD/N2 02/2023</p>	\$8,815,260.00	29/03/2024	<p>Con fecha 02 de octubre de 2023, se firma el contrato de Obra Pública No. EO-920051985-N2-2023.</p> <p>Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el convenio No. UNISTMO/MOD/N2-01/2023, con un monto ampliatorio de \$1,015,682.47 IVA incluido y un periodo de ejecución del 10 de febrero de 2024 al 12 de marzo de 2024.</p> <p>Con fecha 11 de marzo de 2024 se firma el convenio No. UNISTMO/MOD/N2-02/2023, con un periodo de ampliación del 13 de marzo de 2024 al 25 de marzo de 2024.</p> <p>La obra presenta un avance del 100% con fecha 29 de marzo de 2024.</p> <p>Con fecha 31 de marzo de 2024 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos; la obra se encuentra en proceso de finiquito.</p>
P-3	<p>Equipamiento con luminarias solares en alumbrado exterior y de luminarias interiores de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.</p> <p>19/ADM+/UNISTMO/2023</p>	\$2,000,000.00	11/01/2024	<p>PARTIDA 1:</p> <p>Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el contrato 19/ADM+/UNISTMO/2023, por un monto de \$1,623,135.54 incluyendo el I.V.A. Los trabajos de suministro e instalación de luminarias fueron ejecutados al 100%, se cuenta con acta de finiquito de fecha 11 de enero de 2024.</p>
	<p>15/ADM+/UNISTMO/2023</p>		08/12/2023	<p>PARTIDA 2:</p> <p>Con Fecha 21 de noviembre de 2023 se emite el fallo a favor de la persona moral SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE C.V., por un monto total de \$345,838.97 (Trescientos cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y ocho pesos 97/100 M.N.) incluyendo el I.V.A. Los trabajos de suministro e instalación de luminarias fueron ejecutados al 100%, se cuenta con acta de finiquito de fecha 08 de diciembre de 2023.</p>
	<p>22/ADM+/UNISTMO/2023</p>		26/12/2023	<p>El recurso pendiente por comprometer por \$31,025.49 IVA incluido, fue adjudicado directamente a la persona moral SOTERMIK EFICIENCIA ENERGÉTICA, S.A. DE C.V., para el suministro e instalación de 28 pz de luminaria LED 2x16 watts.</p> <p>Los trabajos de suministro e instalación de luminarias fueron ejecutados al 100%, con fecha 26 de diciembre de 2023 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos.</p>

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050



Se anexa documentación comprobatoria, correspondiente a los contrato y convenios faltantes de remitir y las actas de entrega-recepción física de los trabajos, correspondientes a las obras del ejercicio FAM 2023.

En relación al recurso FAM del ejercicio 2024, asignados a esta dependencia con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, y oficio de validación académica de la solicitud de rectificación de los proyectos FAM 2024 de fecha 12 de marzo, le hago llegar el primer reporte correspondiente al primer trimestre del año 2024 para el ejercicio del FAM 2024 referente a los meses de enero – marzo del año 2024.

Se informa además que la documentación original se enviará a través de correo postal, impreso y en medios magnéticos; independientemente los documentos en formato Excel y PDF firmados, se envían por medio de correo electrónico. Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E.
voluntas totum potest
guiráa zanda ne guendaracala'dxi

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. – Rectora de la Universidad del Istmo. - Para su conocimiento.
Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano. - Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Manto. Mismo fin.
Cfp.- Archivo.
*OCO/mgo


Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)

	Nombre: Universidad del Istmo Entidad federativa: 20 Oaxaca Código de identificación:	
	Ubicación:	Código de Matricula:
Nombre: UAQ Código de identificación: Ubicación:		

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nº	Proyecto	Objetivo	Tipo de Proyecto	Monto Aprobado (\$)	CONTRATO Y CALIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto Aprobado (\$)	Nº de Proyecto	Ejecución de la Obra (porcentaje de avance)			Monto Aprobado (\$)	Nº de Proyecto	Ejecución de la Obra (porcentaje de avance)			Monto Aprobado (\$)	Nº de Proyecto	Ejecución de la Obra (porcentaje de avance)				
					No. 1 de Contrato (L)	Fecha Programada		Monto Aprobado (\$)			Cualificación	Monto Aprobado (\$)	Nº de Proyecto			Monto Aprobado (\$)	Nº de Proyecto	Monto Aprobado (\$)			Nº de Proyecto	Monto Aprobado (\$)	Nº de Proyecto		
						INICIO	TERMINO																		
1	Terminación de un edificio para vivienda en el Campus Toluca.	X	1	12,000,000.00	01/01/2021	30/06/2021	12,000,000.00	1	12,000,000.00	1	100%	100%	250,000.00	1	12,000,000.00	1	100%	100%	250,000.00	1	12,000,000.00	1	100%	100%	250,000.00
2	Construcción de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Valle.	X	1	8,150,000.00	01/01/2021	30/06/2021	8,150,000.00	1	8,150,000.00	1	100%	100%	250,000.00	1	8,150,000.00	1	100%	100%	250,000.00	1	8,150,000.00	1	100%	100%	250,000.00
3	Equipamiento con luminarias solares en el área exterior y de las instalaciones de la Universidad del Valle.	X	1	2,000,000.00	01/01/2021	30/06/2021	2,000,000.00	1	2,000,000.00	1	100%	100%	250,000.00	1	2,000,000.00	1	100%	100%	250,000.00	1	2,000,000.00	1	100%	100%	250,000.00

1 Se separaron los espacios que caracterizan a la letra y pinta de. Se podrá anexar tanto las como las negativas.
2 En una ocasión se redactó de forma errónea y correcta se hicieron a ambas, mismos que se vanar, reflejados en el ejemplar impreso.
3 Se mandaron hacer los modelos de la letra, dejando el color negro, y se vanar, reflejados en el ejemplar impreso.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 08/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance:

100.00%

PROGRESO

1


Nombre de la obra:

Terminación de un edificio para posgrado en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760

FOTOS

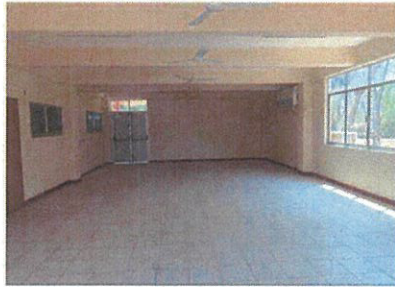

F1



F2



F3



F4

Observaciones

(11)

Con fecha 15 de septiembre de 2023, se firma el contrato de Obra Pública No. EO-920051965-N1-2023. Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el convenio No. UNISTMOMODN1-01/2023, con un monto ampliatorio de \$2,702,691.20 IVA incluido y un periodo de ejecución del 16 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024.

Con fecha 12 de febrero de 2024 se firma el convenio No. UNISTMOMODN1-02/2023, con un periodo de ampliación del 15 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024.

La obra presenta un avance del 100 % con fecha 25 de marzo de 2024.

Con fecha 27 de marzo de 2024 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos, la obra se encuentra en proceso de finiquito.

(12)

Anq. Sergio Aguilar Pineda Solano
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

(13)

M.A. Edgar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

(14)

Mra. María de los Angeles Penabazas
Rectora de la Universidad

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre - 2024


Fecha de elaboración: 08/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 100.00%	PRECEDENTE 1 Nombre de la obra: Terminación de un edificio para posgrado en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	




F1:

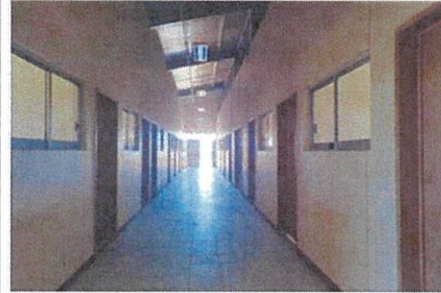

F2:



F3:

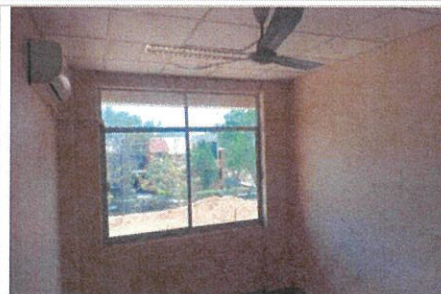

F4:

Observaciones:

Con fecha 15 de septiembre de 2023, se firmó el contrato de Obra Pública No. EO-820051965-N1-2023.
Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el convenio No. UNISTMOMODN1-01/2023, con un monto amparatorio de \$2,782,691.20 IVA incluido y un periodo de ejecución del 16 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024.
Con fecha 12 de febrero de 2024 se firma el convenio No. UNISTMOMODN1-02/2023 con un periodo de ampliación del 15 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024.
Se presenta un avance del 100 % con fecha 25 de marzo de 2024.
Con fecha 27 de marzo de 2024 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos, la obra se encuentra en proceso de finiquito.


 A.D. Santos
 Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento


 M.A. Cesar
 Vice-Rector de Administración de la UNISTMO


 M.A. de los Angeles
 Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, se podrán copiar tantas pegatinas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta


1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/04/2024


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 100.00%	PRIORIDAD: 1 Nombre de la obra: Terminación de un edificio para posgrado en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (01) 		CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (02) 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) 
	DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO PLAN "A" BAJA Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, Cp. 70760				

FOTOS

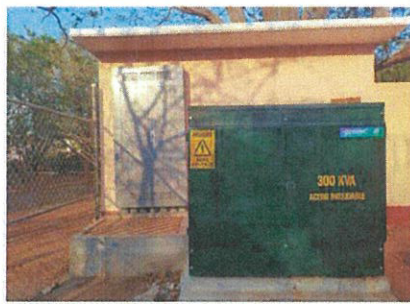

F1:

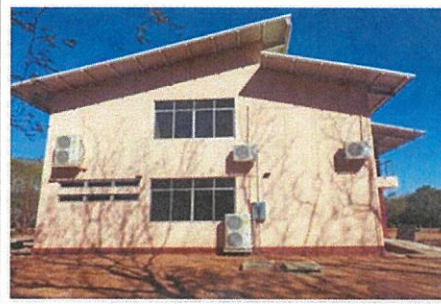

F2:



F3:



F4:

Observaciones:

(11)
 Con fecha 15 de septiembre de 2023, se firma el contrato de Obra Pública No. EO/3020051965-N1-2023.
 Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el convenio No. UNISTMO/COO/11-0102023 con un monto amparatorio de \$2,792,691.20 IVA incluido y un periodo de ejecución del 16 de enero de 2024 al 14 de febrero de 2024.
 Con fecha 12 de febrero de 2024 se firma el convenio No. UNISTMO/COO/11-02/2023 con un periodo de amparación del 15 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024.
 La obra presenta un avance del 100 % con fecha 25 de marzo de 2024.
 Con fecha 27 de marzo de 2024 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos, la obra se encuentra en proceso de finiquito.

 Arq. Sergio Llanos Domínguez
 Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

 M. Oscar Cortés Olivares
 Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

 Ing. María de los Angeles Penabazábal
 Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, se podrán copiar tantas pegatinas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma fotografía, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/04/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


PRECEDENCIA: 2

Nombre de la obra: Construcción de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec (primera etapa).


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (10)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (10)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760

Porcentaje de avance

100.00%


FOTOS



F1



F2

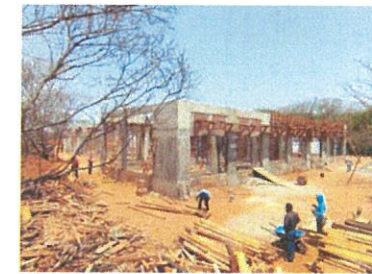

F3



F4

Observaciones:

Con fecha 02 de octubre de 2023, se firma el contrato de Obra Pública No. EO-920051985-N2-2023.
Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el convenio No. UNISTMO/CDN2-9102023, con un monto ampliatorio de \$13,155,682.47 IVA incluido y un periodo de ejecución del 10 de febrero de 2024 al 12 de marzo de 2024.
Con fecha 12 de febrero de 2024 se firma el convenio No. UNISTMO/CDN2-02/2023, con un periodo de ampliación del 13 de marzo de 2024 al 25 de marzo de 2024.
La obra presenta un avance del 100 % con fecha: 09 de marzo de 2024.
Con fecha 31 de marzo de 2024 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos, la obra se encuentra en proceso de finiquito.

Arq. Jorge Luis Soriano
Jefe del Departamento de Construcción y MantenimientoM.A. Oscar Carlos Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMOMtra. María de los Angeles Peraza
Rectora de la UNISTMO

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
ASIGNÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 04/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100.00%

PROYECTO

2


Nombre de la obra:

Construcción de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec (primera etapa).


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (10)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (10)




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, Cp. 70760

FOTOS

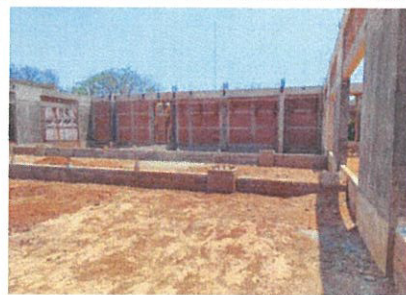

F1



F2



F3



F4

Observaciones:

Con fecha 02 de octubre de 2023, se firma el contrato de Obra Pública No. EO-920051985-A2-2023. Con fecha 14 de diciembre de 2023 se firma el convenio No. UNISTMOMODN2-01/2023, con un monto asignatorio de \$ 015,662.47 IVA incluido y un periodo de ejecución del 16 de febrero de 2024 al 12 de marzo de 2024.

Con fecha 12 de febrero de 2024 se firma el convenio No. UNISTMOMODN2-02/2023, con un periodo de ejecución del 12 de marzo de 2024 al 25 de marzo de 2024.

Actualmente presentan avances del 100 % con fecha 26 de marzo de 2024.

Con fecha 31 de marzo de 2024 se firma el acta de entrega-recepción física de los trabajos, la obra se encuentra en proceso de finiquito.

Arq. Sergio Rodríguez Hernández
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y MantenimientoM.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMOMtra. María de los Angeles Peña Ruiz
Rectora de la Unistmo

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE ORDENÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUT JRAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año de entrega de reporte

1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración del reporte

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 100.00%	PRIORIDAD 3 Nombre de la obra: Equipamiento con luminarias solares en el alameda exterior y de luminarias interiores de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO			

Dirección Postal: Ciudad Universitaria SIN, Carretera Transmision Juchitán - La Ventosa Km. 4, La Ventosa, Oax., México C.P. 70102

FOTOS



Observaciones :

PARTIDA 1
Cuentro Número 19ADW-KUNISTMO/2023 de fecha 14 de diciembre de 2023.
Suministro e instalación de 33 pz luminarias solar con tecnología LED con poste metálico de 9 m.
Con fecha 11 de enero de 2024 se firma el acta de entrega recepción física de los trabajos.




 Sr. Sergio Luis Peraza Olvera
 Jefe del Departamento de Planeación, Construcción y Mantenimiento


 M.A. Lucía Cortés Olivares
 Vice Rector de Administración de la UNISTMO


 Mtra. María de los Angeles Peraza Anís
 Rectora de la Unistmo

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM





FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año de la obra
1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance: 100.00%	Nombre de la obra: Equipamiento con luminarias exteriores en el alameda exterior y de luminarias interiores de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.		
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (8)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
			 Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Carretera Transísmica Juchitán - La Ventosa Km. 14, La Ventosa, Oax., México C.P. 70102

FOTOS

 F1	 F2	Observaciones : (11) PARTIDA 2 Contrato número 15ADM-UNISTMO/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023 Suministro e instalación de 311 pz luminaria con tecnología LED de sobrepoder de 2x16watts Con fecha 08 de diciembre de 2023 se firma el acta de entrega recepción física de los trabajos RECURSO REMANENTE Contrato número 22ADM-UNISTMO/2023 de fecha 28 de noviembre de 2023 Suministro e instalación de 28 pz luminaria con tecnología LED de sobrepoder de 2x16watts Con fecha 26 de diciembre de 2023 se firma el acta de entrega recepción física de los trabajos
 F3	 F4	
 F5	 F6	 F7
Aro Sergio... Jefe del Departamento de Proyecto, Construcción y Mantenimiento		Mtra. Oscar Cortés Olivares Vice Rector de Administración de la UNISTMO
Mtra. María de los Angeles Peraza Arias Rectora de la UNISTMO		

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

Nombre	Universidad del Istmo
--------	-----------------------

Entidad federativa: 20 Oaxaca

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 101–108

Keywords: MA; Causal Control; Learning

Teletex: 87+71 270 90 Ext. 100

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Parasitoid

Neubauer, Amy; Lengua, Leonard; Farrell, Gerard

Teléfono: 871 711 70 50 Ext 209

Como electrónico: deplongstre@adm.unidm.edu

Otroz y Mysterium:

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

[illegible][illegible]

MA: 01904-0000
U.S. POSTAGE & PAYMENTS AUTHORIZED


 Mtro. Marco del Rosario Cordero Acosta
 Director de la Escuela

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OBTUVO EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/04/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance:</p> <p>0.00%</p>	<p>PRECEDIO 1</p> <p>Nombre de la obra: Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>  <p>LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760</p>
	<p>FOTOS</p> <div>  <p>F1:</p> </div> <div>  <p>F2:</p> </div> <div>  <p>F3:</p> </div> <div>  <p>F4:</p> </div>			

Observaciones

(11) Recurso FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/024-0023-36 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Certificado de validación académica de reedificación en los proyectos FAM 2024, con número 511/024-1009-35 de fecha 12 de marzo de 2024. Es integración de la información en el portal del Sistema de Inversión (SI) del ejercicio 2024.

Arc. Sergio Jarama Rodríguez
Jefe del Departamento de Fomento Institucional y Mantenimiento

M. A. Cortés Olivares
Vice-Rectora de Investigación de la UNISTMO

Mra. María de los Ángeles Flores Arias
Directora de Planeación

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma zona, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta


1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance:</p> <p>0.00%</p>	<p>Nombre de la obra: Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (10)</p> 		<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (10)</p>  <p>LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</p>  <p>Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760</p>

FOTOS

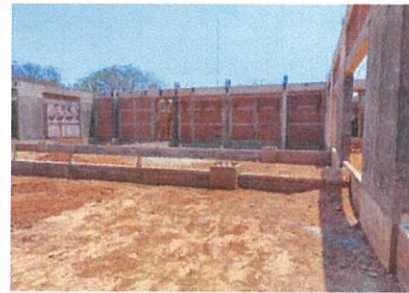

Observaciones:

(11)

Proyecto FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0022-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Con inicio de validación académica de rectificación de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1069-35 de fecha 2 de marzo de 2024. En integración de la información en el portal del Sistema de Inversión (SI) del ejercicio 2024.



(12)

Ana García Hernández Peralta Soriano
Jefe del Departamento de Infraestructura, Edificación y Mantenimiento

(13)

Walter Ocasio Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

(14)

Maria de los Angeles Peraza Rojas
Directora de la Unidad

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adopciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OCURRIÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICATrimestre a que se reporta
1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 05/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO: 2

Nombre de la obra: **Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Itepec (Primera etapa).**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (4)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (4)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON
FOTOS REFERENCIADAS (40)Dirección Postal: Ciudad Universitaria sin Carretera
Itepec Chihuitan, Ciudad Itepec, Oaxaca, CP.
70110

Porcentaje de avance:

0.00%

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Observaciones (11)

Pecunia FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Con oficio de validación académica de rectificación de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1069-35 de fecha 12 de marzo de 2024.

En migración de la información en el portal del Sistema de Inversión (SI) del ejercicio 2024.

Arq. Sergio Leonardo...
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

A.A. Josa Cortes Ojeda
Vice-Rectora de Administración de la UNISTMO

Mrs. María de los Angeles Perdomo
Directora de la Unidad

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OCURRE EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año del informe









1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 05/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>0.00%</p>	<p>PROYECTO 3 Nombre de la obra: Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.</p>	<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE C-4 JUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</p> <p>Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, carretera transistmica Juchitán-la ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000</p>
---	--	---	---	---

FOTOS

<p>F1</p>  	<p>F2</p>  	<p>Observaciones: (11)</p> <p>Presupuesto FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.</p> <p>Con ciclo de validación académica de rectificación de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1069-35 de fecha 12 de marzo de 2024.</p> <p>En integración de la información en el portal del Sistema de Inversión (SI) del ejercicio 2024.</p>
<p>F3</p>  	<p>F4</p>  	<p>(12)</p>
<p>(13)</p> <p>Arq. Sergio L. Hernández Jefe del Departamento de Planeación y Mantenimiento</p>	<p>(13)</p> <p>M.A. Oscar Cárdenas Olivares Vice-Rector de Administración de la UNISTMO</p>	<p>(13)</p> <p>Mtra. María de los Angeles Peraza Rectora de la UNISTMO</p>

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGARÁ RECURSOS**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (1)

1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 06/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>0.00%</p>	<p>PRIORIDAD 4</p> <p>Nombre de la obra: Adquisición de equipo técnico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y comunicación en la universidad del Istmo, específicamente para los po de</p>	<p>Georeferencia o croquis de localización de la obra o proyecto (8)</p> <div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;">  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTÉPEC</p> </div> <div style="flex: 1;">  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN</p> </div> </div>		<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)</p>  <p>UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</p> <p>Dirección Postal:</p> <p>Campus Ixtépec, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtépec Chihuitán Ciudad Ixtépec, Oaxaca. CP. 7C110</p> <p>Campus Juchitán, Ciudad Universitaria S/n, carretera transistmica Juchitán-la ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000.</p> <p>Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760</p>
---	--	---	--	--	---

FOTOS

<p>AULAS, campus Ixtépec Estado actual (11)</p>  <p>Mini Split 24,000 BTUs 220V 2 Ton</p> <p>Proyector</p>	<p>LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán (12)</p> <p>Análizador de fibra cruda</p>  <p>Espectrofotómetro Uv-Visible</p> 	<p>Observaciones: (13)</p> <p>Reservio: FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.</p> <p>Con oficio de validación académica de redificación-re los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-069-35 de fecha 12 de marzo de 2024.</p> <p>Enseñanza de la información en el portal del Sistema de Inversión (SI) del ejercicio 2024.</p>
<p>LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán (14)</p>  <p>Congelador horizontal Modelo 25-1000</p> <p>Deshidratador Alimentos 18 Bandejas Comercial Acero Inox</p>	<p>LABORATORIO: Laboratorios de Energía Eólica, campus Tehuantepec (15)</p>  <p>Estación meteorológica: a) Sensor de temperatura, b) Sensor de Presión, c) Data Logger Campbell CR1000</p> <p>Estación meteorológica d) Vela, e) Panel solar, f) Anemómetro, g) Batería y controlador, h) Gabinete</p>	
<p>F3:</p>  <p>Arq. Sergio Acosta Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento</p>	<p>F4:</p>  <p>V.A. Oscar Cortés Olvera Vice-Rector de Administración de la UNISTMO</p>	<p>F5:</p>  <p>Mtra. María de los Angeles Peraza Rectora de la UNISTMO</p>

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL REPORTE**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 30/04/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

8

Nombre de la obra:

Adquisición de equipo láser y especialización para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los PE de
Secretaría de los campos Istapa y Juquila, así como, los PE de posgrado del campus Tehuantepec.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

(8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

(8)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

(10)

Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio
Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec,
Oaxaca, México. Cp. 70760

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

Taller Aula de Dibujo



RESTRADOR PROFESIONAL

para arquitectura, dibujo técnico o dibujo artístico.
Mesa de vidrio templado y estructura de acero.
Incluye bandejas. Contiene dos cajones en la parte
inferior de la mesa del restrador para colocar objetos.
INCLUYE: - Mesa de trabajo de cristal - Estructura de
acero - 4 charolas de plástico - 4 ruedas - 4
estabilizadores - 2 cajoneras - 1 llave allen de 4mm - 1
llave española de 10 y 12 mm - Tornillería para su
armado.
MEDIDAS DEL PRODUCTO Largo: 104 cm Ancho: 63
cm Alto: 124 cm

Taller de Metales

GENERADOR DE NITRÓGENO
Pureza de nitrógeno de 99.9 %,
alimentación de 220V,
capacidad de 300 ml/min.

Observaciones:

(11)

Resumen: FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de
Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.
Convenio de validación académica de redificación de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1369-35 de
fecha 12 de marzo de 2024.
En integración de la información en el portal del Sistema de Inversión (SI) del ejercicio 2024.

Laboratorio de Oceanografía

REFRIGERADOR COMERCIAL
Capacidad de 547 L, con
iluminación LED, puerta de
vidrio.

Taller de Maderas



Torno para madera de 40"



Lijadora de banda



e) Lijadora de Banda

Arq. Sergio López García
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y MantenimientoM. A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Recto de Administración de la UNISTMOMtra. María de los Angeles Peraza
Directora de la Unidad

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestafa, se podrán copiar tantas pestafas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
