

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

 Mes reportado
septiembre
 FECHA DE CORTE: 30/09/2018


Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad Federativa: Oaxaca

Clave INAFI: 20XBU021P

Nombre: L. A. Cesar Fortunato Castillo Cruz.

Cargo: Vice-rector de Administración.

Teléfono: 911 723 70 50 Ext. 208

Correo electrónico: c_cesar@unismo.edu.mx

 Responsables:
 Obras y Mantenimiento

Nombre: Arq. Claudia Ruiz López.

Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento.

Teléfono: 911 712 70 50 Ext. 208

Correo electrónico: claudia@unismo.edu.mx

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto			Monto autorizado	Monto ejercido	Retenimiento	Avance del proyecto en cantidad a efectos de control y tipo de proyecto				Acciones que sustentan el avance	Acumulado por avance	% de avance	Fecha		Observaciones	¿Se han iniciado las actividades de construcción?	¿Ya fue inaugurado?			Cuenta con Actas	
		Obra de continuidad	Equipamiento	Adquisición y mantenimiento				Proyecto sustentable	Especificaciones	cantidad	metros cuadrados				Tipo de proyecto	Inicio			Terminó	¿Cuenta con un evento?	¿Quién lo inauguró?	Actas de Inauguración	Actas de Inauguración
1	Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a Etapa.	x			\$ 4,300,000.00	\$ -	\$ 4,300,000.00							0	20/09/18	18/12/18	Durante este mes, la obra se encontraba en proceso de Licitación.	No ha sido concluida.	No	---	No	No	No
2	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x			\$ 3,775,816.02	\$ -	\$ 3,775,816.02							0	20/09/18	18/12/18	Durante este mes, la obra se encontraba en proceso de Licitación.	No ha sido concluida.	No	---	No	No	No
3	Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x			\$ 1,550,000.00	\$ -	\$ 1,550,000.00							0	04/10/18	17/12/18	Durante este mes, la obra se encontraba en proceso de Licitación.	No ha sido concluida.	No	---	No	No	No
4	Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x			\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00							0	16/10/18	14/11/18	Durante este mes, la obra se encontraba en proceso de Licitación.	No ha sido concluida.	No	---	No	No	No
					\$10,325,816.02	\$0.00	\$10,325,816.02																

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1. Se copiarán los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anotar tanto fotos como sea necesario.
 2. En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3. Es importante que las fechas de inicio y término estén escritas en todas en dos dígitos del mes y año.




Porcentaje de avance

0

Nombre de la obra:

Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

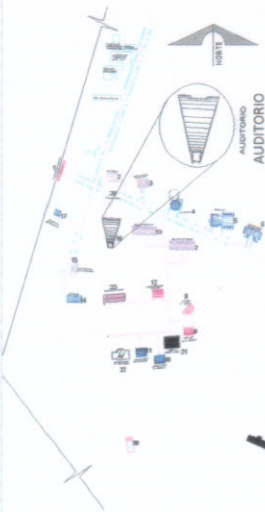

Referencia de fotos en croquis




Comentarios de los trabajos realizados:


Se encuentran en proceso de acarreo de materiales y herramientas.



1

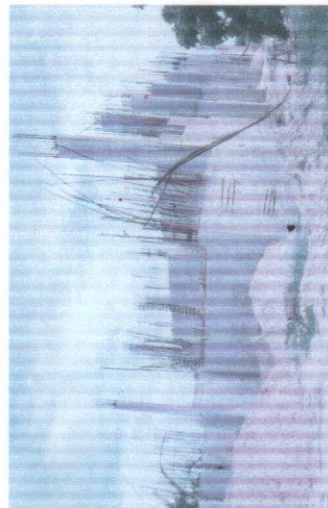

11

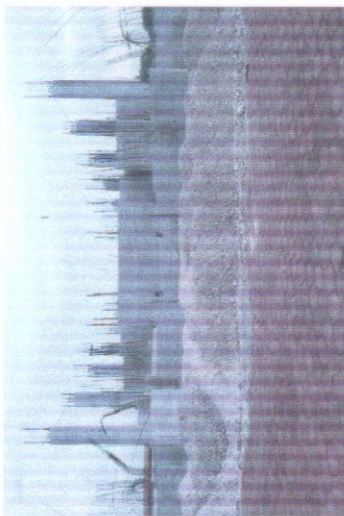

10

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz L6pez

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, [se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

REPORTES FOTOGRAFICO

2 Nombre de la obra:

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria sin, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Porcentaje de avance

0

FOTOS

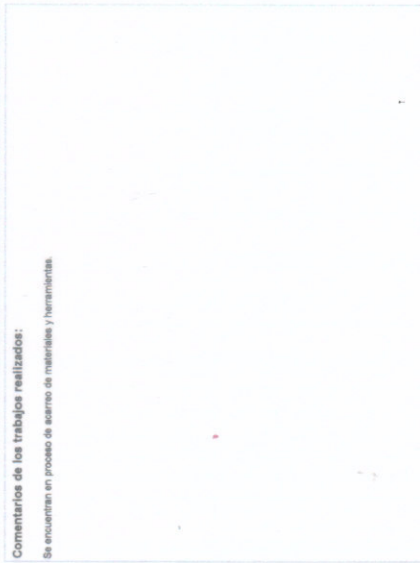

Comentarios de los trabajos realizados:

Se encuentran en proceso de saqueo de materiales y herramientas.



L. A. Cesa Fortuna Castillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Ap. Claudia Ruiz López

Nombre y firma de Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2018

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/2018



Porcentaje de avance


0

3

Nombre de la obra

Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

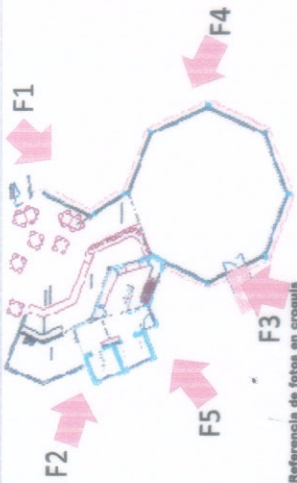

Referencia de fotos en croquis

UNIFICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
 Juchitán-La Ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
 Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS


 Comentarios de los trabajos realizados:
 Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.


L. A. E. Cesar Fortuna Castillo Cruz



Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Gladys Ruz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastilla, se podrán copiar tantas pastillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTES FOTOGRAFICO

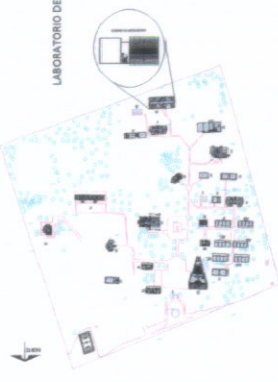 Porcentaje de avance: 0	4 Nombre de la obra: Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN  LABORATORIO DE	 Referencia de fotos en croquis	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.
 LABORATORIO DE ENERGIA	 LABORATORIO DE OCEANICA	Comentarios de los trabajos realizados: Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.	
 LABORATORIO DE ENERGIA	 LABORATORIO DE OCEANICA		
L.A. E. Cesar Fortinato-Castillo Cruz Nombre y firma del Titular de la IES		Alo Claudio Ruiz López Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES	


* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO


4 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

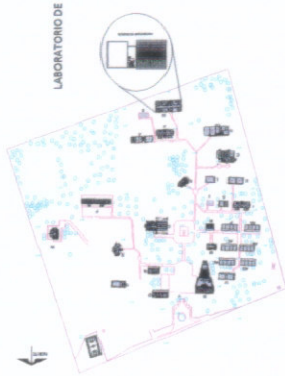

LABORATORIO DE



LABORATORIO DE

Porcentaje de avance

0

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



LABORATORIO DE ENERGÍA



LABORATORIO DE HIDRÁULICA

Comentarios de los trabajos realizados:

Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.

L. A. E. Cesar Fortuño Carrillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López


Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRÁFICO

4 Nombre de la obra

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

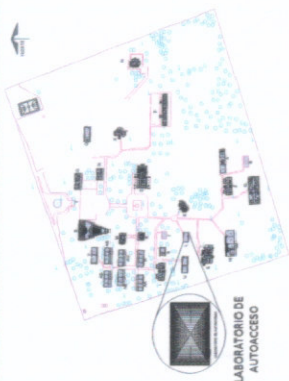

Porcentaje de avance

0

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



LABORATORIO DE AUTOACCESO



INTERIOR DE LABORATORIO DE AUTOACCESO

Comentarios de los trabajos realizados:

Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.


L. A. E. Cesar Fortunato Gallardo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Ad. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO

 UNISTMO UNIVERSIDAD DEL ISTMO	4 Nombre de la obra: Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN  LABORATORIO DE QUÍMICA	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.
Porcentaje de avance: 0	Referencia de fotos en croquis  LABORATORIO DE QUÍMICA	Comentarios de los trabajos realizados: Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.	FOTOS  LABORATORIO DE QUÍMICA  CUARTO DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE QUÍMICA
Nombre y firma del titular de la IES L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz		Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES Arq. Claudia Ruiz López	

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AUG

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre

FECHA DE ENTREGA




Porcentaje de avance

0

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.
CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN
LABORATORIO DE
CÓMPUTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
 Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
 Oaxaca, México.
LABORATORIO DE
CÓMPUTO ILABORATORIO DE
CÓMPUTO II

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



LABORATORIO DE CÓMPUTO



LABORATORIO DE CÓMPUTO I

Comentarios de los trabajos realizados:

Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.

LABORATORIO DE CÓMPUTO II



L. A. E. Cesar Fortuna Castillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Abg. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO


4 Nombre de la obra:

Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



SALAS DE DISEÑO



SALA DE CÓMPUTO DE DISEÑO

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



FOTO 1

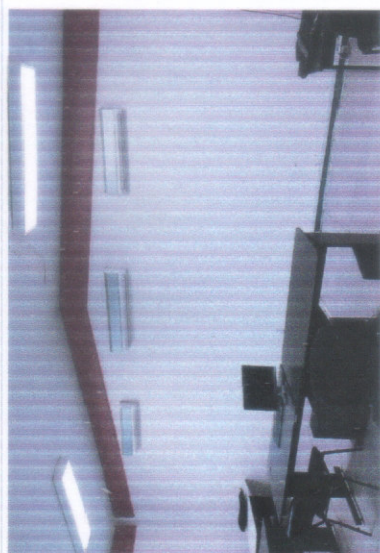


FOTO 2

Comentarios de los trabajos realizados:
Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

L. A. E. Cesar Fontana Castillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López


Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

REPORTE FOTOGRAFICO

4 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Porcentaje de avance

0


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70780, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



EDIFICIO AUDIOVISUAL



SALA AUDIOVISUAL

Comentarios de los trabajos realizados:

Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.

L. A. E. Cesar Fortinso-Castillo Cruz

Nombre y firma del titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

2018

AUG

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre

FECHA DE CORTE: 09/09/2018

REPORTE FOTOGRAFICO

4 Nombre de la obra

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AUDITORIO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Porcentaje de avance


0

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



AUDITORIO



SALA DE ESPECTADORES

Comentarios de los trabajos realizados:

Al momento no se han realizado los trabajos correspondientes a la obra.

L. A. E. Cesar Fournito, Aguilero Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES
