

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad del Istmo.

Entidad federativa: Oaxaca.

Clave Inst 011: 20MSU0021P

Nombre: L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz.

Cargo: Vicerrector de Administración.

Teléfono: 071 72 2 70 80 Ext. *008

Correo electrónico: c_castillo@unismo.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Claudia Ruiz López.

Cargo: Jefe del Departamento de Proyecto, Construcción y Mantenimiento.

Teléfono: 071 72 2 70 80 Ext. *008

Correo electrónico: claudia.ruiz@gmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO
OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejecutado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que concuerden al avance ²	Acciones por realizar ³	% de avance	Fechas ⁴		Observaciones	¿Se inauguró o se inaugurará? (Calcular)	¿Se inauguró?		Cuenta con Actas							
		Obras de construcción	Equipamiento	Reparación y mantenimiento	Proyecto sustentado				Especificaciones	Cantidad	Metros cuadrados				Inicio	Termino			¿Cuenta con Actas de obra?	¿Quién y cuándo inauguró?	Actas de Obra Inicial	Actas de Obra Final	Actas de Obra Intermedias	Actas de Obra de Cierre				
1	Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a. Etapa.	X				\$ 4,300,000.00	\$ -	\$ 4,300,000.00	S. Espectadores	1	193.00																	
									Ferr	1	44.00																	
									Sanitarias	4	26.00																	
									Vestibulo	1	162.00																	
									Vestidores	2	24.00																	
									TOTAL	8	448.00																	
2	Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	X				\$ 3,775,819.02	\$ -	\$ 3,775,819.02	Mezclador 1 y 2	2	26.52																	
									Cuanto de Análisis y Cuanto de máquinas	1	49.73																	
									Biorreactor 1 y 2	2	104.34																	
									Sedimentador 1	1	35.52																	
									Sedimentador 2	1	35.52																	
									Filtro 1	1	14.48																	
									Filtro 2	1	14.48																	
									Generación de Osmosis	1	3.57																	
									Tanque de Almacenamiento	1	15.21																	
									Tanque de lodos	1	128.48																	
									TOTAL	12	427.87																	
3	Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	X				\$ 1,580,000.00	\$ -	\$ 1,580,000.00	Cocina	1	48.00																	
									Comedor	1	139.00																	
									Vestibulo	1	18.00																	
									TOTAL	3	205.00																	
4	Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	X				\$ 700,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	Lab. Autocorros	1																		
									Lab. Computo Ing. En diseño	1																		
									Lab. de Oceanografía	1																		
									Auditorio	1																		
									Sala Audiovisual	1																		
									Lab. Hidráulica	1																		
									Lab. Computo 1	2																		
									Lab. Computo 2	2																		
									Reactivos Lab. Ing. Química	1																		
									Vice-rectoría Admón.	1																		
									Sala de video multimedios	1																		
									Sala de dibujo de Diseño	1																		
									TOTAL	14	6.00																	
						\$10,325,819.02	\$0.00	\$10,325,819.02																				

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

² En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2018

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre

FECHA DE CORTE 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

25


PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Construcción del Auditorio Campus Juchitán 2a. Etapa.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

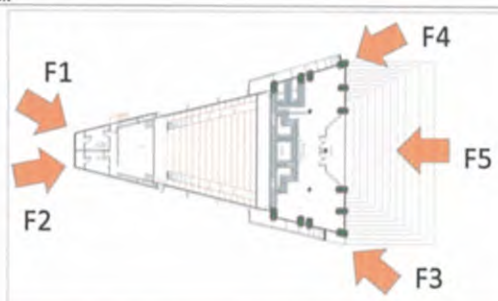

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Relleno y compactación de material inerte, elaboración muros de tabicón, elaboración de
losa de concreto armado, habilitado de muro de concreto en fachada lateral derecha.

F3



F4



F5

L. A. E. Cesar Fortuño Castro Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre

FECHA DE CORTE: 30/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

31.7


PRICIDAD

2

Nombre de la obra:

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

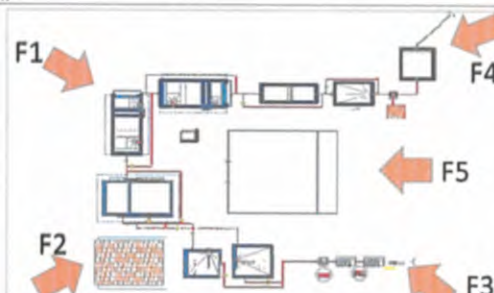

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Elaboración de muros de concreto armado para los registros primarios, el mezclador uno y el mezclador dos, muros de tabicón tipo pesado, así como columnas de concreto armado, cadenas de desplantas, muros de enrase, zapatas corridas y aisladas en cuarto de máquinas.



F3



F4



F5

L. A. E. Cesar Fortalato-Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arc. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre

FECHA DE CORTE: 31/10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance:



15

PRIORIDAD

3

Nombre de la obra: Ampliación de la Cafetería en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

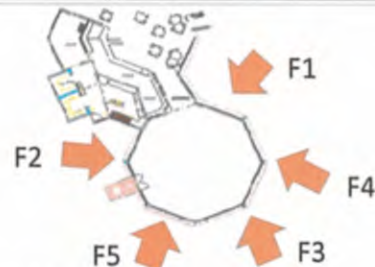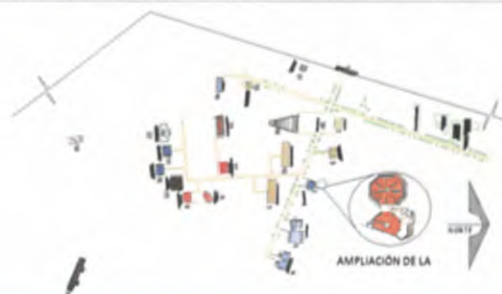

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Excavación y mejoramiento de terreno, elaboración de plantilla de concreto, elaboración de zapatas aisladas
armado de acero en columnas, armado de acero en trabe de liga.

F3



F4



F5

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes de entrega:

octubre

Mesa de trabajo: FOMENTO

REPORTE FOTOGRAFICO

4 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



LABORATORIO DE ENERGÍA



LABORATORIO DE OCEANOGRAFÍA

Comentarios de los trabajos realizados:

AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO TRABAJO EN ESTA ÁREA, SE COLOCARÁ UN CLIMA DE CINCO TONELADAS



ÁREA PARA UNIDAD CONDENSADORA

L. A. E. Cesar Fortuño Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Graciela Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

octubre

Período de reporte: 15 días

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de ejecución:

0

4

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



LABORATORIO DE



LABORATORIO DE

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



LABORATORIO DE ENERGÍA



LABORATORIO DE HIDRÁULICA

Comentarios de los trabajos realizados:

AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO TRABAJO EN ESTA ÁREA. SE COLOCARÁ UN CLIMA DE CINCO TONELADAS



ÁREA PARA UNIDAD CONDENSADORA

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

octubre

FOTOGRAFÍA DE LA OBRA

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance:

6

4


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



LABORATORIO DE AUTOACCESO



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



LABORATORIO DE AUTOACCESO



INTERIOR DE LABORATORIO DE AUTOACCESO

Comentarios de los trabajos realizados:

SE COLOCÓ LA UNIDAD CONDENSADORA Y EL EVAPORADOR DE UN CLIMA DE CINCO TONELADAS EN EL LABORATORIO DE AUTOACCESO. FALTA REALIZAR PRUEBAS Y RESANE DE ORIFICIOS DE DUCTERÍAS.



COLOCACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA



EVAPORADOR INSTALADO DE LABORATORIO DE AUTOACCESO

L. A. E. Cesar Fortunado Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes siguiente:

octubre

INDICADOR DE AVANCE

REPORTE FOTOGRÁFICO




Puntaje máximo:

0

4

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
 Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
 Oaxaca, México.

FOTOS




AUDITORIO



EVAPORADOR EN SALA DE ESPECTADORES

Comentarios de los trabajos realizados:

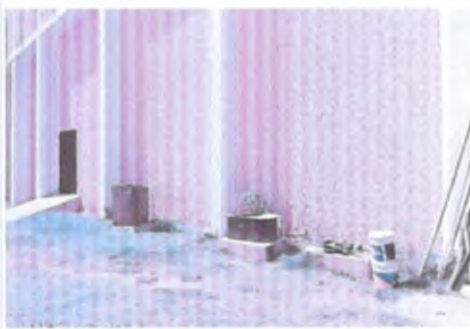 AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO TRABAJO EN ESTA ÁREA, SE COLOCARÁ UN CLIMA DE
 CINCO TONELADAS


UNIDAD CONDENSADORA

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

octubre

Reporte fotográfico

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance:

0

4

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



EDIFICIO AUDIOVISUAL



PLANTA ALTA

SALA AUDIOVISUAL

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



EDIFICIO DE SALA AUDIOVISUAL



INTERIOR DE LA SALA AUDIOVISUAL

Comentarios de los trabajos realizados:

SE RETIRÓ LA UNIDAD CONDENSADORA Y EL EVAPORADOR DE LA SALA AUDIOVISUAL.

ÁREA LISTA PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS



RETRÓ DE UNIDAD CONDENSADORA



RETRÓ DE EVAPORADOR

L. A. E. Cesar Fortes Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ana Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

octubre

FOLIO DE CORTE: 07/10/2017

REPORTE FOTOGRÁFICO



Procedimiento de creación

2

4

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



SALAS DE DISEÑO



SALA DE CÓMPUTO DE DISEÑO

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



UBICACIÓN DE SALA DE CÓMPUTO DE DISEÑO



INTERIOR DE LA SALA DE CÓMPUTO DE DISEÑO

Comentarios de los trabajos realizados:

SE REALIZÓ EL RETIRO DE LA UNIDAD CONDENSADORA Y EL EVAPORADOR, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DEL NUEVO EVAPORADOR. SE COLOCARÁ UN CLIMA DE CINCO TONELADAS



RETIRO DE LA UNIDAD CONDENSADORA EN SALA DE DISEÑO



COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA EVAPORADOR SALA DE CÓMPUTO DE DISEÑO

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

octubre

PROYECTO FONTE 41 000014

REPORTE FOTOGRÁFICO



Presupuesto Bruto/obra

5.5

4 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

LABORATORIO DE
CÓMPUTOLABORATORIO DE
CÓMPUTO I

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
 Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
 Oaxaca, México.

FOTOS



UBICACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA



UBICACIÓN DE EVAPORADORES

Comentarios de los trabajos realizados:

 SE COLOCÓ LA UNIDAD CONDENSADORA Y EL EVAPORADOR DE DOS CLIMAS DE TRES
 TONELADAS EN EL LABORATORIO DE CÓMPUTO I. FALTA REALIZAR PRUEBAS Y RESANE DE
 ORIFICIOS DE DUCTERÍAS.


SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EVAPORADORES



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDENSADORES

L. A. E. Cesar Fortuño Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:

octubre

Periodo de validez: 30 días

REPORTE FOTOGRÁFICO


PROYECTO

4

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

LABORATORIO DE
CÓMPUTOLABORATORIO DE
CÓMPUTO II

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
 Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
 Oaxaca, México.


Porcentaje de avance:

6

FOTOS



LABORATORIO DE CÓMPUTO II



INTERIOR DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO II

Comentarios de los trabajos realizados:

 SE COLOCÓ LA UNIDAD CONDENSADORA Y EL EVAPORADOR DE DOS CLIMAS DE TRES
 TONELADAS EN EL LABORATORIO DE CÓMPUTO II. FALTA REALIZAR PRUEBAS Y RESANE DE
 ORIFICIOS DE DUCTERÍAS.


COLOCACIÓN DE EVAPORADORES



UBICACIÓN DE UNIDADES CONDENSADORAS

L. A. E. Cesar Portuondo Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arg. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes de trabajo

octubre

Procedimiento 01/0001

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

0

 4 Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



LABORATORIO DE QUÍMICA



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



LABORATORIO DE QUÍMICA



CUARTO DE REACTIVOS DEL LABORATORIO DE QUÍMICA

Comentarios de los trabajos realizados:

AL MOMENTO SOLO SE HA COLOCADO LA BASE PARA LA UNIDAD CONDENSADORA.

SE COLOCARÁ UN CLIMA DE UNA TONELADA



UNIDAD CONDENSADORA ACTUAL

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes operativo

octubre

Ficha de registro de obra

REPORTE FOTOGRAFICO



Presenta su trabajo

0

Prioridad

4


Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



SALAS DE DISEÑO

SALA DE DIBUJO DE
DISEÑO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta
 Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec,
 Oaxaca, México.

FOTOS



UBICACIÓN DE CIUDAD CONDENSADORA



INTERIOR DE LA SALA DE DIBUJO DE DISEÑO

Comentarios de los trabajos realizados:

 AL MOMENTO NO SE HA REALIZADO TRABAJO EN ESTA ÁREA. SE COLOCARÁ UN CLIMA DE
 CINCO TONELADAS

L. A. E. Cesar Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes asignado:

octubre

Mes asignado: 10/2018

REPORTE FOTOGRÁFICO

 4 Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



SALA USOS MÚLTIPLES

PLANTA SALA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



EDIFICIO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES



INTERIOR DE LA SALA USOS MÚLTIPLES

Comentarios de los trabajos realizados:

SOLO SE HA REALIZADO LA PERFORACIÓN PARA DUCTERÍAS.

ÁREA LISTA PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE CINCO TONELADAS

L. A. E. César Fortunato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Ana Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes de reporte:

octubre

Proyecto: 01190001

REPORTES FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance:

0

Número de obra:

4

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



OFICINA VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



MURO PARA COLGAR LA UNIDAD CONDENSADORA



INTERIOR DE LA VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

Comentarios de los trabajos realizados:

SOLO SE HA COLOCADO LA BASE PARA LA UNIDAD CONDENSADORA. SE INSTALARÁ UN CLIMA DE UNA TONELADA

L. A. E. Cesar Fortinato Castillo Cruz

Nombre y firma del Titular de la IES

Arq. Claudia Ruiz López

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
