

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FOLIO DE CORREL: 10032019

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad del Istmo.**

Entidad federativa: Oaxaca

Clave Inst B11: 20MSU021P

RESPONSABLES

Nombre: L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Cargo: Vicerrector de Administración

Teléfono: 971 722 70 60 Ext. 200

Correo electrónico: vca\_admin@unim.unim.mx

Nombre: Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Cargo: Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 971 712 70 50 Ext. 1009

Correo electrónico: vcastell@unim.unim.mx, dcastellanos@unim.unim.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Reservado	Avance del proyecto en cuanto a impactos físicos, obras concluidas y tipo de proyecto <sup>1</sup>		Acciones que sustentan el avance <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Ya fue inaugurada?						
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Aparatos electrónicos	Muebles y mobiliario				Otros proyectos	Español/inglés				cantidad	metros cuadrados			Inicio	Término	¿Cuánta con citas del evento?	¿Qué y cuándo inauguró?	Cuenta con el acta (Acta firmada)	Acta Administrativa de Entrega (Acta)	Monto de Acta Administrativa
1	Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x				\$ 3,195,875.22	\$ 3,195,875.22	\$ -	5 Espectadores	1	193.00		97.0	11/09/19	15/04/21	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	Si	No	No	No	No	\$0.00		
									Foro	1	44.00													
									Sanitarios	4	26.00													
									Vestibulo	1	162.00													
									Vestidores	2	24.00													
									<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>449.00</b>													
2	Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	x				\$ 3,050,200.00	\$ 3,050,200.00	\$ -	Mezclador 1 y 2	2	28.52		100.00	21/09/19	31/03/20	Obra Terminada.	Si	No	Si	Si	\$2,960,200.00			
									Cuarto de Análisis y Cuarto de máquinas	1	49.73													
									Biom reactor 1 y 2	2	104.34													
									Sedimentador 1	1	36.52													
									Sedimentador 2	1	36.52													
									Filtro 1	1	14.49													
									Filtro 2	1	14.49													
									Operación de Cloruro	1	3.57													
									Tanque de Amalgamamiento	1	15.21													
									Tanque de lotos	1	126.48													
									<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>427.87</b>													
3	Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x				\$ 1,338,076.65	\$ 1,338,076.65	\$ -	Consola de control	1			160.0	25/10/19	31/03/20	Obra Terminada.	Si	No	Si	Si	\$1,338,076.65			
									Luminaria con 6 lentes	12														
									Microfonovocal Interactiva	13														
									Tecnologías de Aprendizaje	1														
									Luminaria fresca de led	2														
									Extensión para señal FM	1														
									Altavoz de 1000 W	4														
									Subwoofer	2														
									Altavoz 12"	2														
									Procesador de audio	1														
									Mezcladora de 24 canales	1														
									Telón de boca	1														
									Instalación de butacas	1														
									Proyector BenQ Pantalla retroactiva	1														
									<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>0.00</b>													
6	Rehabilitación del Centro de idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	x				\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	Oficinas	12	114.62		98.0	23/08/19	15/04/21	Se están corrigiendo trabajos extraordinarios.	Si	No	No	No	\$0.00			
									Pasillo y Vestibulo	1	26.88													
									Sala de Juntas	1	17.95													
									Sanitarios	2	8.42													
									<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>166.85</b>													
						\$9,292,853.97	\$9,292,853.97	\$0.00																

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Jefe del Departamento de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturan los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.  
2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa el trabajo a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.  
3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2019



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE 31/03/2019

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad del Istmo.**

Entidad federativa: **Oaxaca**

Clave Inst 911: 20MSU002 IP

Planiación: Nombre: **L. C. E. Eugenio Cortés Hernández**

Cargo: **Vice-rector de Administración**

Teléfono: **971 71 2 70 50 Ext. 1208**

Correo electrónico: **vice\_admin@uami.unistmo.edu.mx**

RESPONSABLES

Cobras y Mantenimiento: Nombre: **Ing. Victor Hugo Castellanos García**

Cargo: **Jefe del departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento**

Teléfono: **971 71 2 70 50 Ext. 1208**

Correo electrónico: **coca.vh@uami.unistmo.edu.mx, deptosupobras@uami.unistmo.edu.mx**

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto		Monto autorizado	Monto agerado	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto <sup>1</sup>		Acciones que sustentan el evento <sup>2</sup>	Acciones por realizar	% de avance	Fechas <sup>3</sup>		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurado? (Cualquier)	Ya fue inaugurada?					
		Obra de infraestructura	Equipamiento				Administrativos y servicios	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/equipo			cantidad	metros cuadrados	Inicio	Termino	¿Cuentas con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?
7	Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.		X	\$ 6,800,000.00	\$ 6,800,000.00	\$ -	Sistema solar interconectado de 58.08 kWp	8				GLOBAL DEL PROYECTO	03/10/19	31/03/20	Los trabajos se encuentran concluidos	Si	No		SI	SI	\$6,800,000.00
							<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>0.00</b>												
9	Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.		X	\$ 230,250.00	\$ 230,250.00	\$ -	Biblioteca	1	1182.00			100.0	05/09/19	31/01/20	Los trabajos se encuentran concluidos	Si	No		SI	SI	\$230,250.00
							<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1182.00</b>												
10	Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.	X		\$ 929,229.20	\$ 929,229.20	\$ -	Sala de Cómputo 1	2				100.0	12/11/19	15/01/20	Los equipos se encuentran instalados y funcionando correctamente	Si	No		SI	SI	\$929,229.20
							Lab. Electrónica	1													
							Autosaccos	2													
							Rectoría	1													
							Biblioteca	3													
							Auditorio	2													
							Vicerrectoría de Admón	2													
							Módulo de Aulas Tehuantepec	4													
							Biblioteca Tehuantepec	1													
							Cub. De Profs 1	1													
							Cub. De Profs 2	1													
							Centro de Idiomas	1													
							Departamento de Rvrt	1													
							<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>0.00</b>												
				<b>\$7,769,479.20</b>	<b>\$7,769,479.20</b>	<b>\$0.00</b>															

  
L. C. E. Eugenio Cortés Hernández  
Nombre y firma del Titular de la IES

  
Ing. Victor Hugo Castellanos García  
Nombre y firma del Titular de Cobras y Mantenimiento de la IES

1 Se capturará los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas fotos como sea necesario.

2 En esta sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm, yy.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo.**  
FECHA DEL CURTE: 31/03/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

**97**

PREVIDENCIA 1

Nombre de la obra: **Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

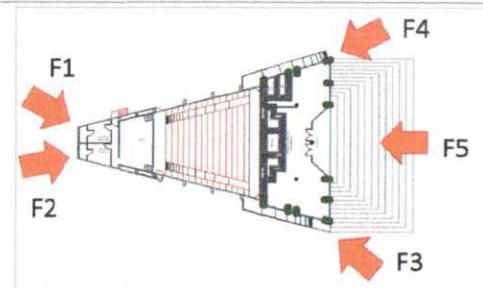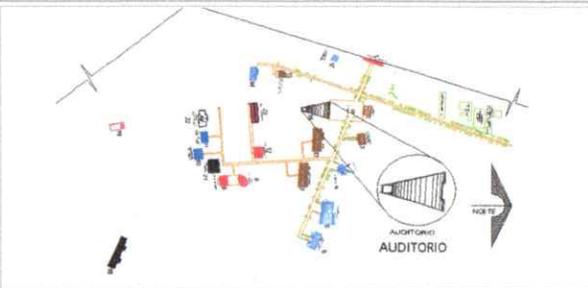

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca C. P. 70102

FOTOS




F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Trabajos de cancelería.



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández  
Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNIVERSITARIA)  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo.**  
FECHA DE CORTE: 31.03.2019

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

**100**

Nombre de la obra: **Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

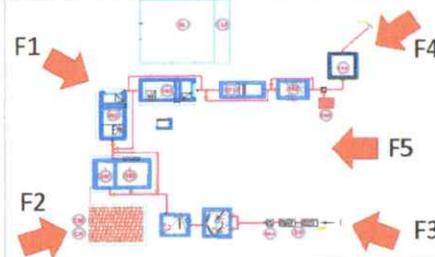

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS




F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3



F4



F5

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo.**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

PROYECTO 3 Nombre de la obra: **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

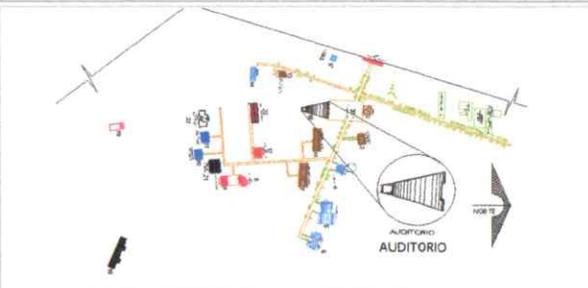

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra terminada



F3:



F4:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo.**  
FECHA DE CONTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

**100**

PROYECTO: 3

Nombre de la obra: **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

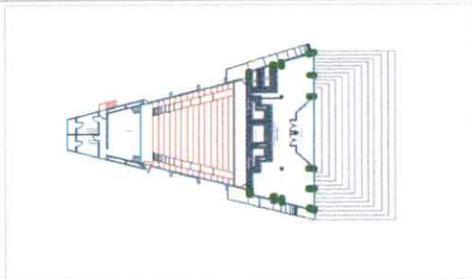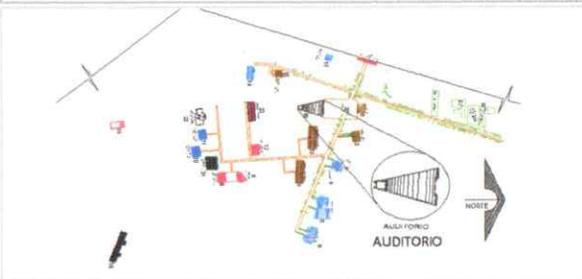

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Ederio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo.**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

Proyecto: 3

Nombre de la obra: Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

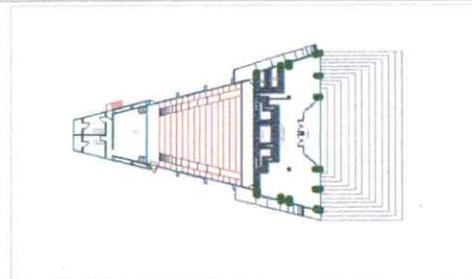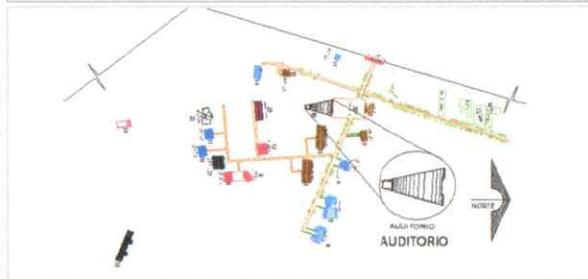

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obras terminada



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.

2019

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo.**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL





Porcentaje de avance

100

PROYECTO: 3

Nombre de la obra: **Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

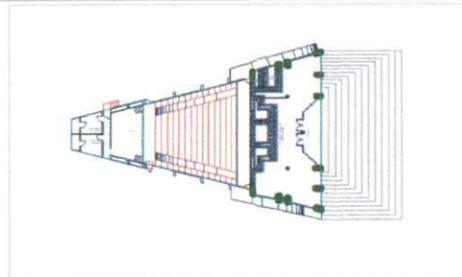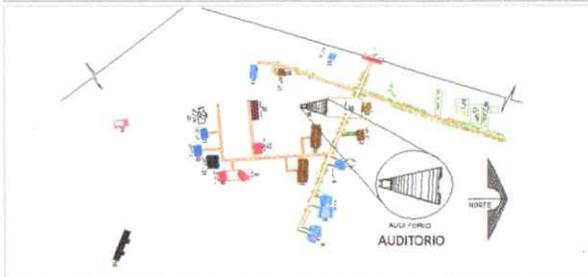

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:


Obra terminada



F3:



F4:



F5:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

**98**

Identificación: **5** Nombre de la obra: **Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

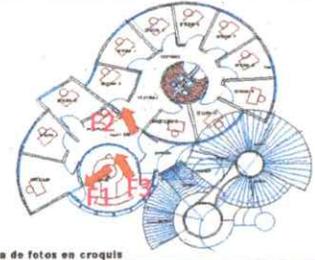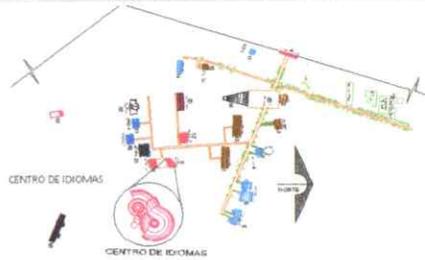


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS

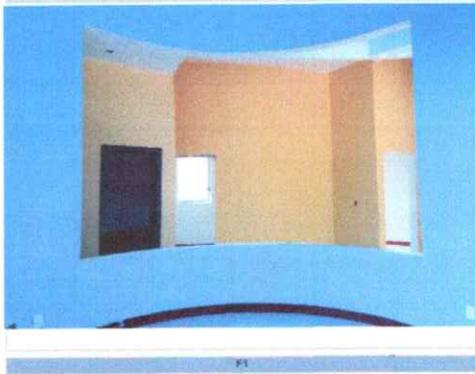

F1



F2


Comentarios de los trabajos realizados:

Trabajos de cancelería







F3

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández  
Nombre y firma del Titular de la IES



Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra
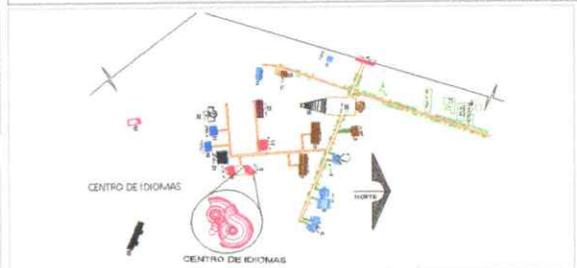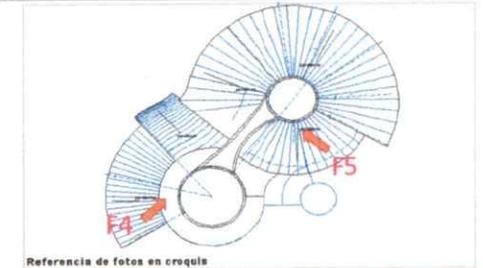
<p><b>2019</b></p> <p>ABRIL</p>	<p><b>FAM</b></p> <p>FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES</p>	<p>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA          DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL          SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	<p>Mes reportado:  <b>enero-marzo</b></p> <p>FORMA DE CUOTE: 31 93 2011</p>
<p>REPORTE FOTOGRAFICO</p>			
	<p>Identificación: <b>5</b> Nombre de la obra: <b>Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.</b></p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>	
<p>Porcentaje de avance</p> <p><b>98</b></p>	<p>CROQUIS DE LOCALIZACIÓN</p> 	 <p>Referencia de fotos en croquis</p>	<p>Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102</p>
<p>FOTOS</p>			
 <p>F4</p>	 <p>F5</p>	<p>Comentarios de los trabajos realizados:</p> <p>Trabajos de cancelaría</p>	
<p>L. C. E. Eugenio Cortes Hernández</p> <p>Nombre y firma del Titular de la IES</p>	<p>Ing. Víctor Hugo Castellanos García</p> <p>Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES</p>		
<p>* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adscuciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra.</p>			

2019

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

**100**


PROYECTO 7

Nombre de la obra: **Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



SISTEMA FOTOVOLTAICO

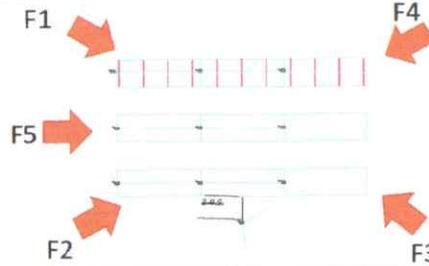

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:




F2:



F3:



F4:



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma tema, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31-03-2019

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

**100**



FOTOS




BIBLIOTECA



F1



F2

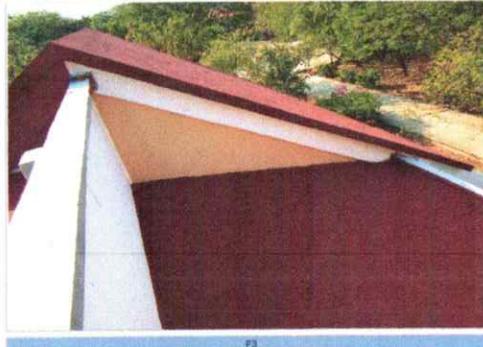

F3



F4

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña; se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance


**100**

Edificación **10**

Nombre de la obra

**Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitán-Istepec S/N, Ciudad Istepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



LABORATORIO DE ELECTRÓNICA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F2

L. C. E. Esperio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

**100**


Presupuesto: **10**

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec SAN, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

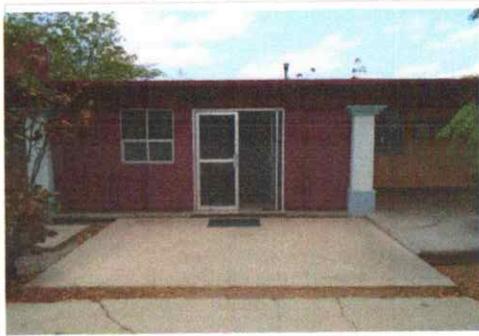

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2

L. C. E. Esperanza Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



F3



F4

ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la Obra / Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CUATE: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

**100**

Equipo: **10** Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

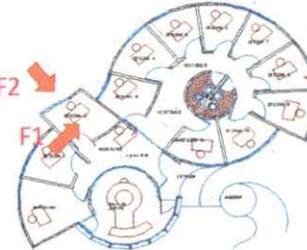

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CENTRO DE IDIOMAS



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obratérminada



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de la Obra y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportada:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2017

REPORTE FOTOGRAFICO




Porcentaje de avance

**100**

PROCESO: 10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec SAJ, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



CUBICULO DE PROPS I



F1: SALA DE JUNTAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García


Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO

MODALIDAD: **10** Nombre de la obra: **Suministro e instalación de cimas en la Universidad del Istmo Campus Istepec.**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO  
 Carr. Chihuitan-Istepec S/N, Ciudad Istepec, Oax., México C.P. 70110.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN  



UNISTMO  
 UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
 OAXACA  
 Porcentaje de avance: **100**  
 CUERPO DE PROFES II

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:  
 Obra terminada




CUERPO DE PROFES II  
 F1



F2

L. C. E. Eugenio Cobos Hernández  
 Nombre y firma del titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García  
 Nombre y firma del titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance


**100**

Presupuesto: **10**

Nombre de la obra:

**Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

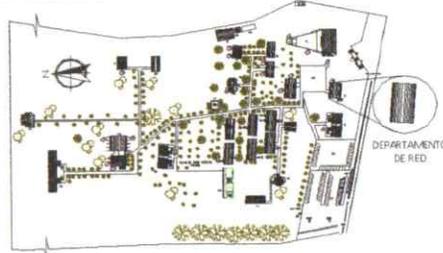

Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



EDIFICIO DE RECTORÍA



F1. DEPARTAMENTO DE RED

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**enero-marzo**

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO 10 Nombre de la obra

**Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**



Porcentaje de avance

**100**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



AULAS DE DOS NIVELES



PLANTA BAJA

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3:



F4: AULA 26

L. C. E. Eusebio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Vicio Hugo Castellanos Garcia

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

enero-marzo

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PROYECTO

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN




Porcentaje de avance

100



AULAS DE DOS NIVELES



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

FOTOS



F1:



F2:

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F3: AULA 21



F4: AULA 28



F5: AULA 29

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Victor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

280

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

**enero-marzo**

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

**REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**




Porcentaje de avance


**100**

Proyecto: **10** Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

**CROQUIS DE LOCALIZACIÓN**

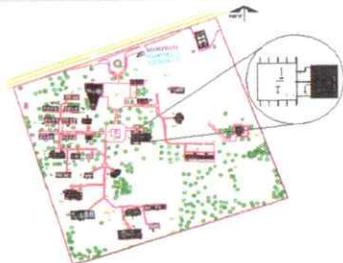

BIBLIOTECA

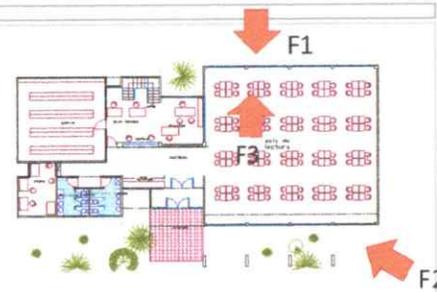

**UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO**

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

**FOTOS**



F1:



F2:

**Comentarios de los trabajos realizados:**

Obra terminada.




F3:

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES



F4:



F5:

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE EMISIÓN: 31.03.2021

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

100



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Istepec S/N, Ciudad Istepec, Oax., México C.P. 70110.



*[Signature]*  
L. C. E. Eugenio Cortés Hernández  
Nombre y Firma del Titular de la IES

*[Signature]*  
Ing. Victor Hugo Castellanos Garcia  
Nombre y Firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se podrán copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SCA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE CORTE: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance


**100**

Identificación: **10**

Nombre de la obra:

**Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



BIBLIOTECA



Referencia de fotos en croquis


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



BIBLIOTECA

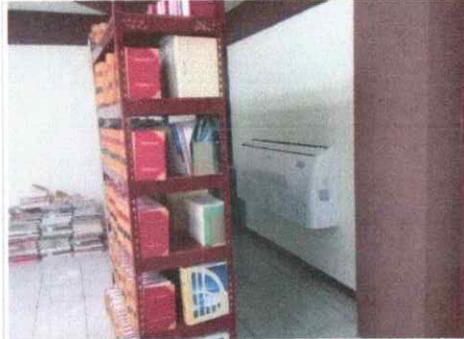

F1: ACERVO PLANTA ALTA

Comentarios de los trabajos realizados:

Otra terminada



F2

L. C. E. Elgerio Cortés Hernández

Nombre y firma del titular de la IES



Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y asociaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FOLIO DE CORTE: 31812801

REPORTE FOTOGRÁFICO



Porcentaje de avance

100


PROYECTO

10

Nombre de la obra:

**Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Itepec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Itepec S/N, Ciudad Itepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



LABORATORIO DE AUTOCCESO



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2



F3



F4

L. C. E. Ezequiel Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Responsable de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
**enero-marzo**  
FECHA DE CNITE: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO





Porcentaje de avance

100

10 Nombre de la obra

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

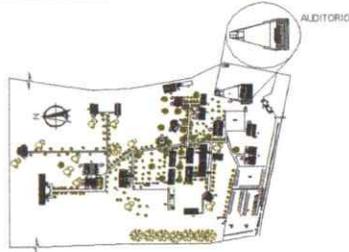

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtepec S/N, Ciudad Ixtepec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



ALDITORIO



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestañita, se podrán copiar tantas pestañitas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

**100**

PROYECTO **10**

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepéc.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

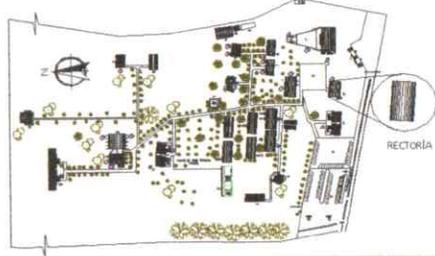

RECTORÍA

F2

F1

Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtepéc SN, Ciudad Ixtepéc, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



EDIFICIO DE RECTORÍA



F1: SALA DE JUNTAS

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada



F2

L. C. E. Eugenio Cortés Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado:  
**enero-marzo**  
Fecha de corte: 31/03/2019

REPORTE FOTOGRÁFICO




Porcentaje de avance

**100**

Proyecto: **10**

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS



SALA DE COMPUTO I



F1

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.



F2



F3



F4

L. C. E. Eugenio Cortes Hernández

Nombre y firma del Titular de la IES

Ing. Víctor Hugo Castellanos García

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
