

2019



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO  
 SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Mes reportado  
**julio-septiembre**  
 REPORTE DE AVANCE MENSUAL



Nombre: Universidad del Istmo.  
 Ciudad federativa: Oaxaca.  
 Cédula IMU 311 326520219

Responsables:  
 Director: M.A. Oscar Carlos Ovaras  
 Coordinador: M.A. Oscar Carlos Ovaras  
 Teléfono: 971 212 70 50 Ext. 208  
 Correo electrónico: oca\_jovana@unimex.com

Datos del Proyecto:  
 Proyecto sustentable  
 Tipo de proyecto: Equipamiento, Mantenimiento  
 Nombre del proyecto: Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

Datos del Avance del Proyecto:  
 Al cierre del periodo en curso se ejecutó el 97.0% del presupuesto asignado.  
 Y tipo de proyecto: 1

Orbita Concluida:  
 Ya las actividades: Si/No  
 Cuarta con Acab: Si/No

Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado	Monto gastado	Remanente	Acciones que se han ejecutado		Acciones que se han programado	Acciones por realizar	% de avance	Fecha		Observaciones	¿El presupuesto se ha agotado?	Ya las actividades		Cuarta con Acab		Monto a pagar
						Explicación	cantidad				cantidad	cantidad			Inicio	Termino	Si	Si	
1	Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	X	\$ 3,165,678.22	\$ 3,165,678.22	\$ -	5. Equipaciones	1	160.00		97.0	11/09/19	15/11/21	Se están comprando trabajos de carpinteros	Si	No	No	No	No	\$0.00
2	Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	X	\$ 3,660,200.00	\$ 3,660,200.00	\$ -	Foro	1	44.00		100.00	21/09/19	31/03/20	Obras terminada	Si	No	No	Si	Si	\$3,000,200.00
3	Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán	X	\$ 1,338,078.85	\$ 1,338,078.85	\$ -	Macetones	1	2	35.52										\$1,338,078.85
5	Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	X	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	Chapas de peltex y aluminio	1	48.75											\$0.00
						TOTAL	9	440.00											\$0.00

M.A. Oscar Carlos Ovaras  
 Nombre y firma del titular de la IES

M.A. Oscar Carlos Ovaras  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1 Se declara los estados que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar hasta tres fotos y sus descripciones.  
 2 En esta sección se reducen de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se ven reflejados en el report fotográfico.  
 3 El reportaje que las fotos de inicio y término están actualizadas. Todas en dos ejemplares del mes y año.

2019



FONDO DE APORTACIONES MULTILATERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
 DIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL  
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN FÍSICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo  
 Entidad federativa: Oaxaca  
 Cédula del IES: 2065000219

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Cargo: Titular de Administración  
 Teléfono: 912 79 29 26, 428  
 Correo electrónico: oca\_olm@unimio.edu.mx

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Cargo: Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
 Teléfono: 912 79 29 26, 428  
 Correo electrónico: oca\_olm@unimio.edu.mx

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Cargo: Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
 Teléfono: 912 79 29 26, 428  
 Correo electrónico: oca\_olm@unimio.edu.mx

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Cargo: Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
 Teléfono: 912 79 29 26, 428  
 Correo electrónico: oca\_olm@unimio.edu.mx

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Cargo: Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
 Teléfono: 912 79 29 26, 428  
 Correo electrónico: oca\_olm@unimio.edu.mx

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Cargo: Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
 Teléfono: 912 79 29 26, 428  
 Correo electrónico: oca\_olm@unimio.edu.mx

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Cargo: Encargado del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento  
 Teléfono: 912 79 29 26, 428  
 Correo electrónico: oca\_olm@unimio.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Tipo de Proyecto	Monto autorizado	Monto ejecutado	Numeros	Avance del proyecto en euros e equivalentes		Acciones que multipligen el monto	Adiciones por realizar	% de avance	Fecha?	Observaciones	¿Se encuentran los trabajos en ejecución?	Valor invertido?		¿Se encuentran los trabajos en ejecución?	Valor con adeudo			
					En euros	En pesos							Con adeudo	Con adeudo					
7 Sistema fotovoltáico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Tehuantepec.	X	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00		0	0.00			100.0	09/10/19	31/03/20	SI	No	SI	SI	\$6,000,000.00			
9 Impermeabilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.	X	\$ 230,250.00	\$ 230,250.00		0	100.00			100.0	05/09/19	31/01/20	SI	No	SI	SI	\$230,250.00			
10 Simulador e instalación de cines en la Universidad del Istmo Campus Atlix.	X	\$ 929,230.20	\$ 929,230.20		1	100.00			100.0	12/11/19	15/01/20	SI	No	SI	SI	\$929,230.20			
<p>Tabla con los datos de los proyectos en euros e equivalentes</p> <p>En pesos</p> <p>TOTAL 0 0.00</p> <p>En euros 1 100.00</p>													TOTAL		22	100	\$7,159,479.20	\$7,159,479.20	\$0.00

OBRA CONCLUIDA

M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares  
 Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

1. Se capturaron los estados que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden encontrar más datos en el sistema.  
 2. En esta sección se detallan los estados de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismo que se ven reflejados en el reporte fotográfico.  
 3. Es importante que los estados de inicio y término estén actualizados. Todos en los campos del mes y año.

Más reportes  
 Julio-septiembre  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2019

2019

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**julio-septiembre**  
FECHA DE COPY: 30/09/2021

FONDO DE PORTAFOLIOS MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO



1 Nombre de la obra: **Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

97

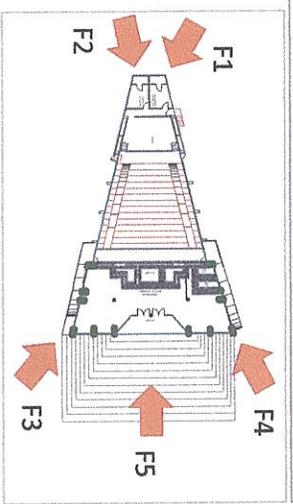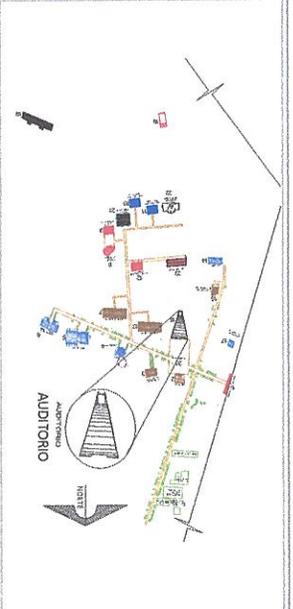

Ciudad Uruapan, Carretera Transmexicana  
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de  
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

FOTOS



F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados.  
Trabajos pendientes por realizar.



F3:

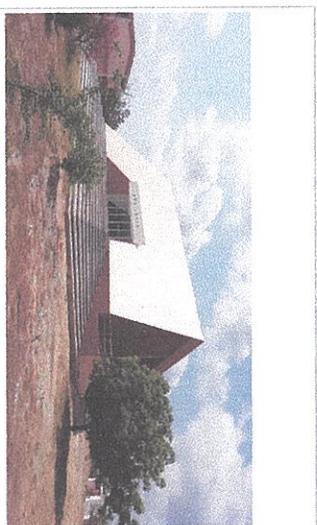

F4:



F5:

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilla, se podrán copiar tantas pestillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO

Mes reportado  
**julio-septiembre**  
FECHA DE CONTEO: 30/09/2021

2 Nombre de la obra:

Terminación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

100

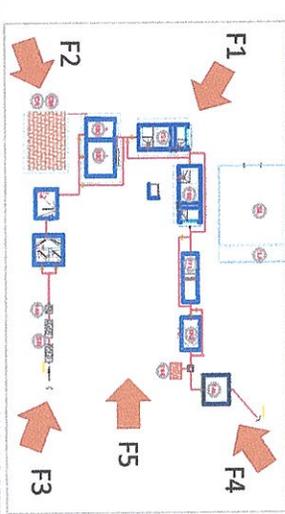

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.




F1




F2


Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.

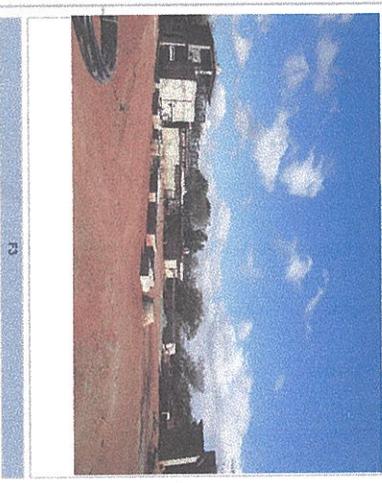

F3

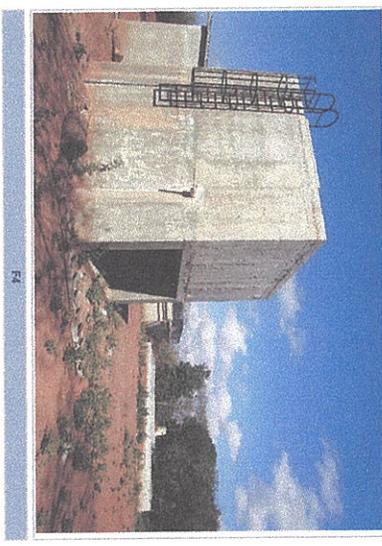

F4

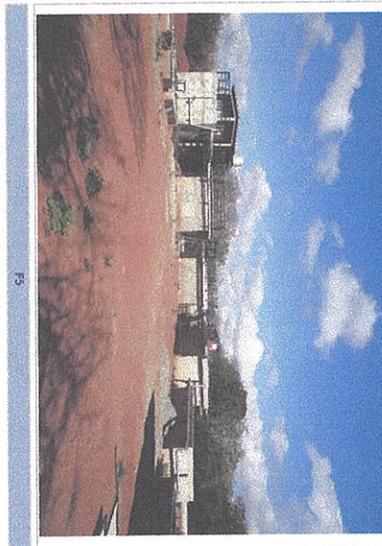

F5

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestalla, se podrán copiar tantas pestallas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y después de la obra

2019

ASU



Porcentaje de avance

100

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO

3 Nombre de la obra:

Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACION

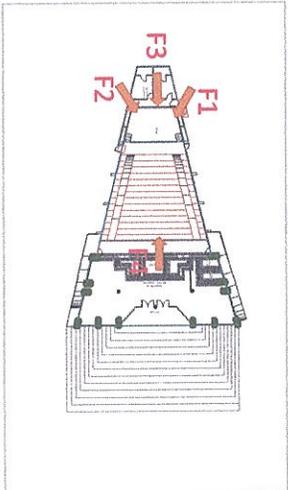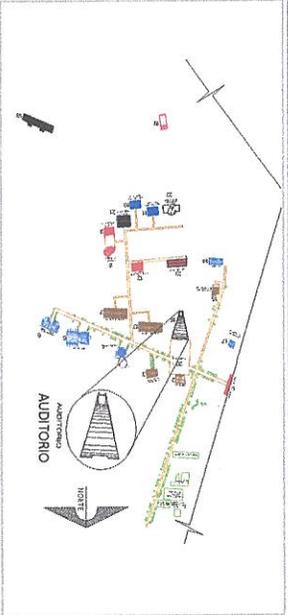

FOTOS



F1:



F2:



F3:



F4:

Comentarios de los trabajos realizados:  
Otra terminada

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad: Universidad, Carretera, Transistmica  
Juchitán-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de  
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

Mes reportado  
julio-septiembre  
FECHA DE CORTE: 2019/07/27

M. A. Oscar Cortés Olivares,  
Nombre y firma del Titular de la IES

M. A. Oscar Cortés Olivares,  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se pueden copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
julio-septiembre  
FECHA DE COMPLETACION: 30/09/2021



Porcentaje de avance



100

3 Nombre de la obra:

Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CIRCUITO DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

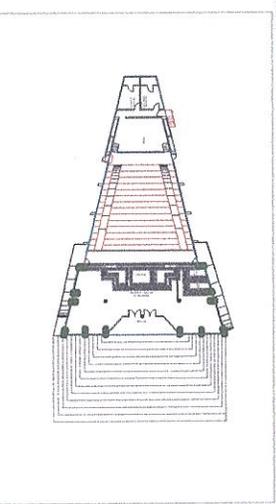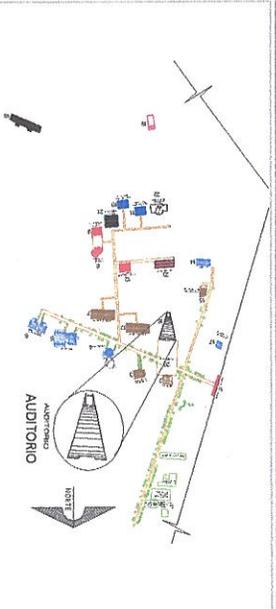

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km. 14, Hencia Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca C. P. 70102

FOTOS




F1:




F2:

Comentarios de los trabajos realizados:  
Otra terminada

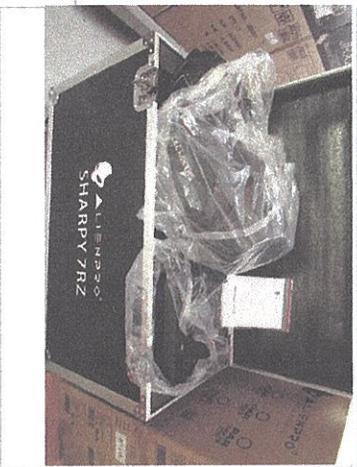

F3:



F4:



F5:

M.A. Osael Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los obreros. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTILES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO

Mes reportado  
julio-septiembre  
FECHA DE CORTE: 30/09/2021




Porcentaje de avance

100


Proyecto: 3 Nombre de la obra:

Equipoamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán

CROQUIS DE LOCALIZACION

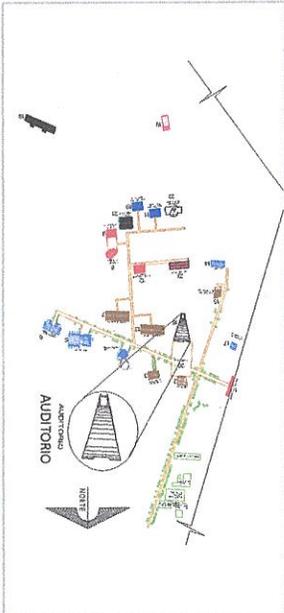

FOTOS

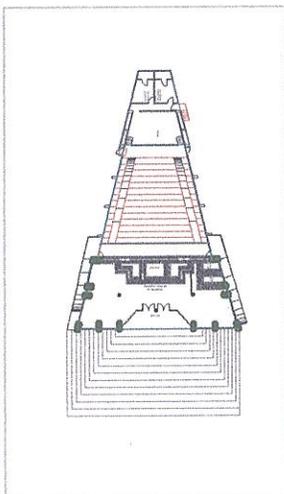

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad: Universidad, Carretera Transistmica Juchitán-La ventosa Km 14, Huelga Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102

Comentarios de los trabajos realizados:  
Otra terminada



F1:



F2:



F3:



F4:



F5:

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa copia fotográfica de todos los datos. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**julio-septiembre**  
FECHA DE COMPILACION: 30/09/2019



Porcentaje de avance



100

3 Nombre de la obra:

**Equipamiento del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juichitan**


CRONOGRAMA DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

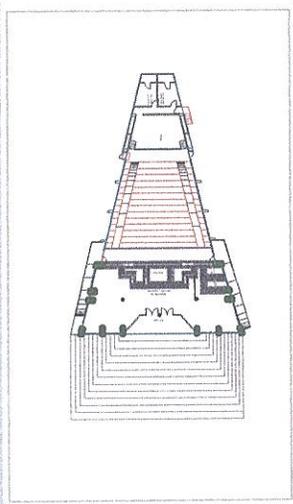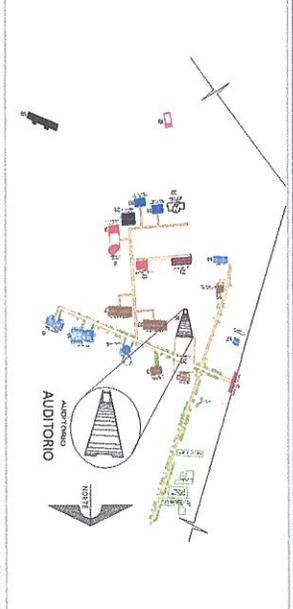

Ciudad: Universitaria, Carretera Transistmica Juichitan-La ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de Juichitan de Zaragoza, Oaxaca. C. P. 70102

FOTOS



F1:




F2:




F3:

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES



F4:

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES



F5:

Comentarios de los trabajos realizados:  
Otra terminada

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**Julio-Septiembre**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

FONOS DE APORTACIONES MULTIMES

REPORTE FOTOGRAFICO

5 Nombre de la obra:


Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

98

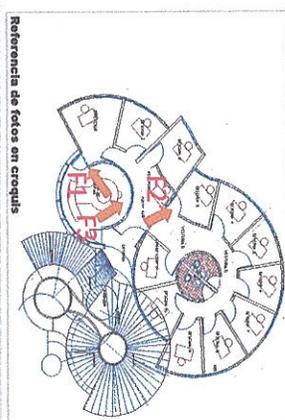

Referencia de fotos en croquis

FOTOS



F1



F2

Comentarios de los trabajos realizados:  
Trabajos pendientes por realizar.



F3

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todos los obras. Para esto se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO

Mez reportado  
julio-septiembre

FECHA DE PORTE: 2020/08/01

5 Nombre de la obra:

Rehabilitación del Centro de Idiomas de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.



CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

98

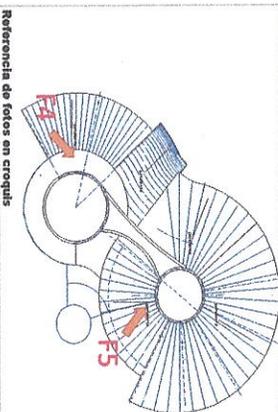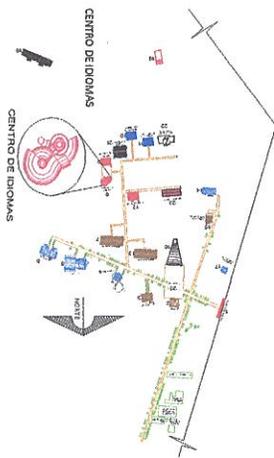

Referencia de fotos en croquis

Ciudad Universitaria, Carretera Transistmica  
Juchitán-La Ventosa Km. 14, Heroica Ciudad de  
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, C. P. 70102



F4



F5

Comentarios de los trabajos realizados:  
Trabajos pendientes por realizar.

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestilina, se pueden copiar tantas pestilinas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Más reportado  
julio-septiembre  
FECHA DE COMPILACION: 20/09/2021

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO

7 Nombre de la obra:

Sistema fotovoltaico para el suministro de energía eléctrica al conjunto de aulas Campus Tehuantepec.

GRUPO DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance


100




SISTEMA FOTOVOLTAICO

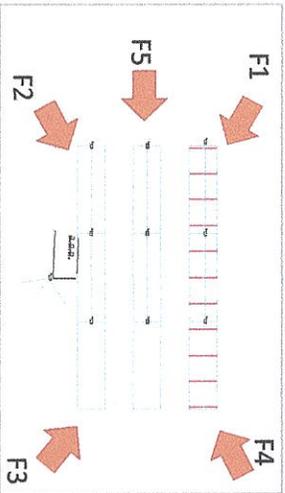

FOTOS

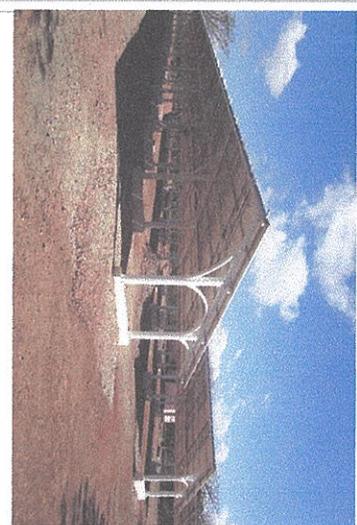


F1:

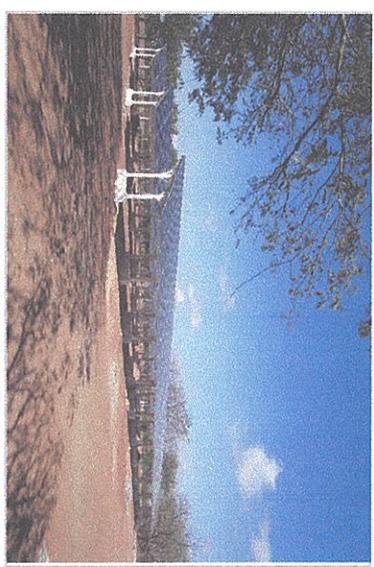


F2:



F3:

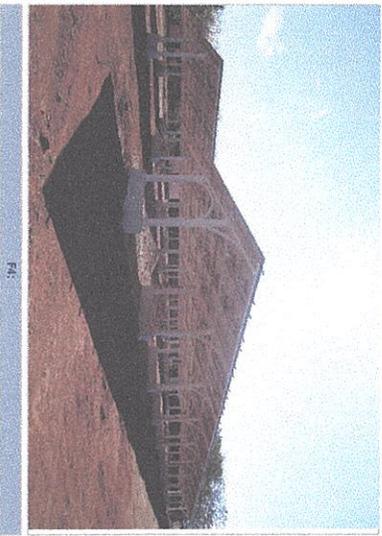

F4:

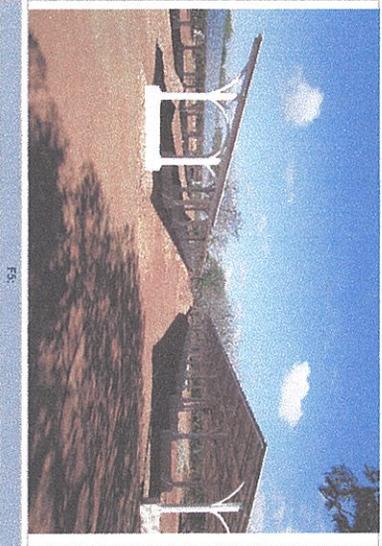

F5:

Comentarios de los trabajos realizados:  
Ora terminada

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

Nombre y firma del Titular de la IES  
*M.A. Oscar Chris Olivares*

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES  
*M.A. Oscar Chris Olivares*

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una postalina, se pueden copiar tantas postalinas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se cubra la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

202

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mapa reportado  
**julio-septiembre**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

UNIVERSIDAD DEL ISTMO  
UNISTIMO  
OAXACA

REPORTE FOTOGRAFICO

10 Nombre de la obra:



Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepesc.

CICROS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO


100

Porcentaje de avance

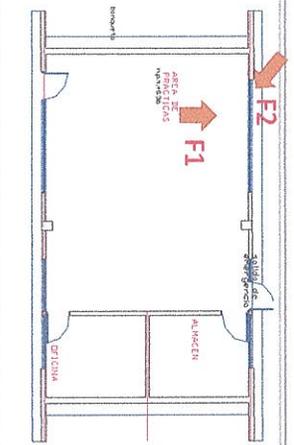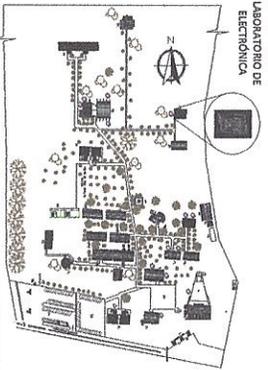

Carr. Chihuitan-Ixtepesc S/N, Ciudad Ixtepesc, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

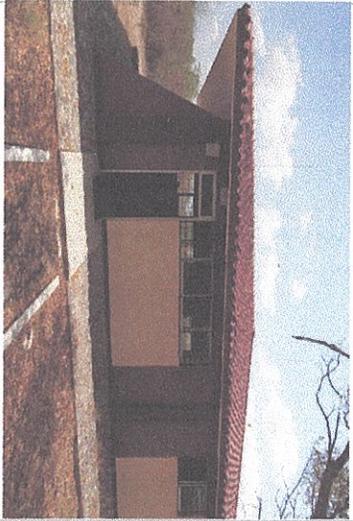

LABORATORIO DE ELECTRONICA



F1

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.



F2

M.A. Oscar Cortés Olivares,  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares,  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, se pueden copiar tantas pegatinas como sea necesario. Para el equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA



REPORTE FOTOGRAFICO

Mes reportado  
**Julio-septiembre**  
FRENTE DE OBRA: 3008/2017



Porcentaje de avance

100

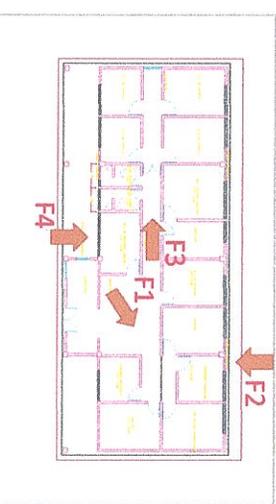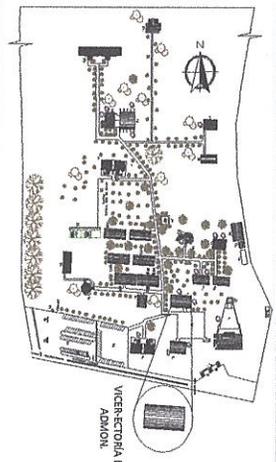


10

Nombre de la obra: **Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtepec.**  
GRUPOS DE LOCALIZACIÓN

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtepec SN, Ciudad Ixtepec, Oax,  
México C.P. 70110.

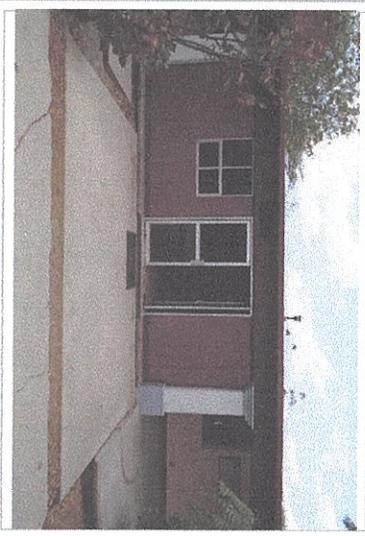


VICERECTORIA DE ADMINISTRACION




F1

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.

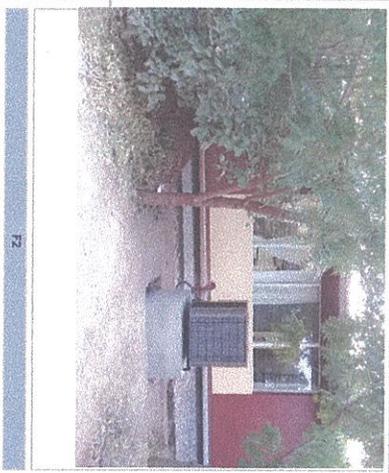

F2

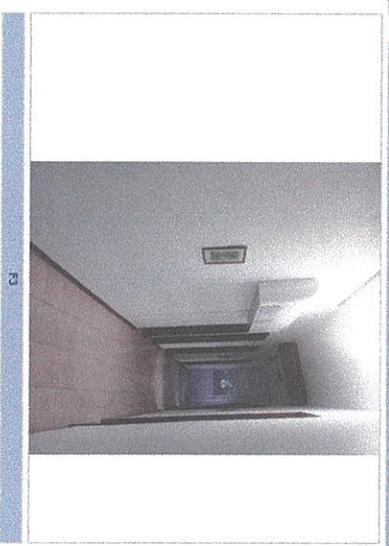

F3



F4

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantos pedales como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO

Mes reportado


**Julio-septiembre**

FECHA DE CREACION: 20/09/2021




Porcentaje de avance

100

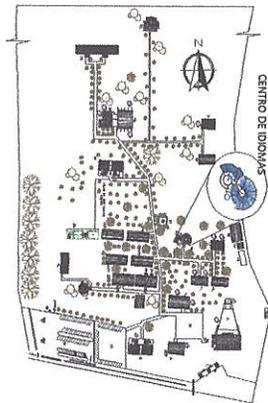

CENTRO DE IDIOMAS

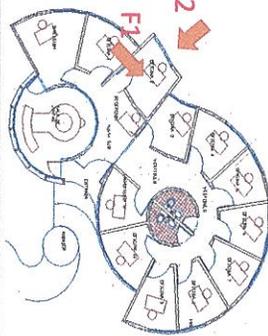


CRONOGRAMA DE LOCALIZACION

10 Nombre de la obra:

Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Itepec.

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Itepec S/N, Ciudad Itepec, Oax.  
México C.P. 70110.

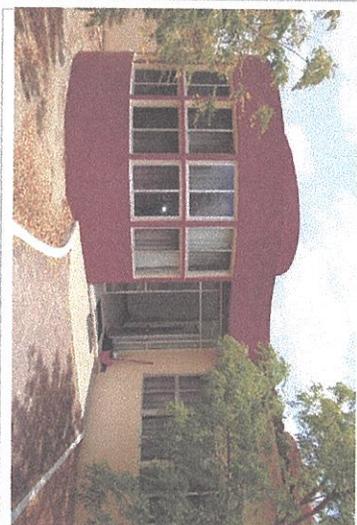

CENTRO DE IDIOMAS



F1

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.



F2

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y haga para el antes, durante y después de la obra.

2019

2019

**FAM**

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE PORTALEJAMENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mapa reportado  
julio-septiembre  
FECHA DE CORTE: 30/09/2021

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO

10 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

100

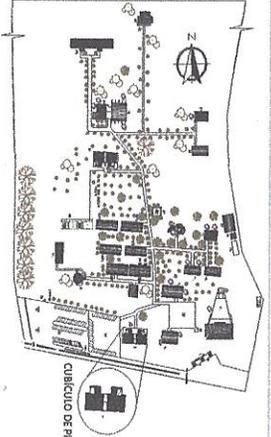


Referencia de fotos en croquis

Carr. Chihuitan-Ixtpec SN, Ciudad Ixtpec, Oax.  
México C.P. 70110.



CUBICULO DE PROFES I

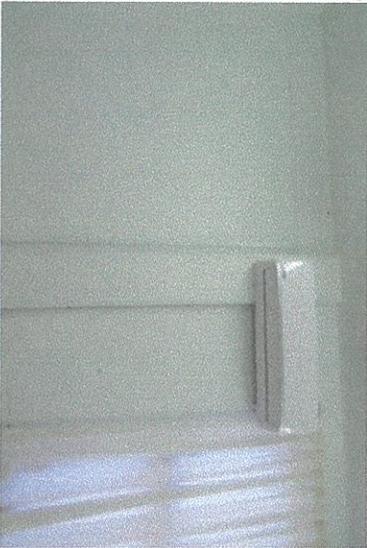

F1: SALA DE JUNTAS



F2

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas copias como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

REPORTE FOTOGRAFICO

Mes reportado


**julio-septiembre**

FECHA DE CREAR: 30/09/2021




Porcentaje de avance

100

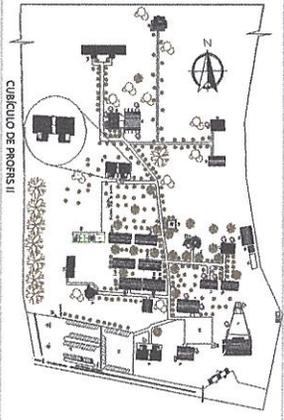

CUBICULO DE PROFES II

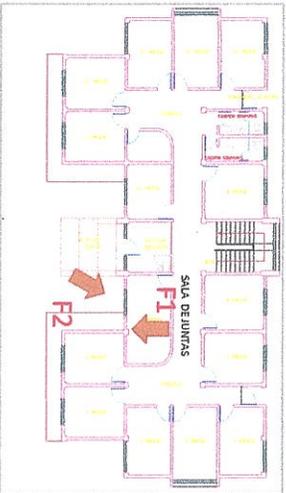

SALA DE JUNTAS

F1

F2

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitlan-Ikapepec SN, Ciudad Ikapepec, Oax,  
México C.P. 70110.

10 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ikapepec.

CATEGORIAS DE LOCALIZACION

FOTOS



CUBICULO DE PROFES I I





F1

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.



F2



M.A. Oscar Cortés Olivares,  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares,  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe modelo fotográfico de toda la obra. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA



REPORTE FOTOGRAFICO

Mes reportado  
**Julio-septiembre**  
Fecha de corte: 30/09/2019



Potencial de avance

100

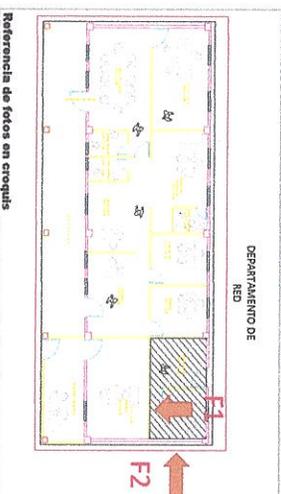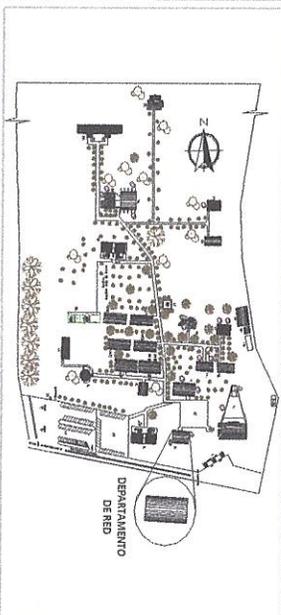

Carr. Chiluitlan-Ikepec SN, Ciudad Ikepec, Oax.,  
México C.P. 70110.

10

Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Iktepec.

CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

FOTOS

Referencia de fotos en croquis



EDIFICIO DE RECTORIA



FI DEPARTAMENTO DE RED

Comentarios de los trabajos realizados:  
Ora terminada.



F2

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se pueden copiar tantas pestainas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO

Mes reportado  
**julio-septiembre**  
FECHA DE EMISION: 03/08/2021




Porcentaje de avance

100




AULAS DE DOS NIVELES

FOTOS

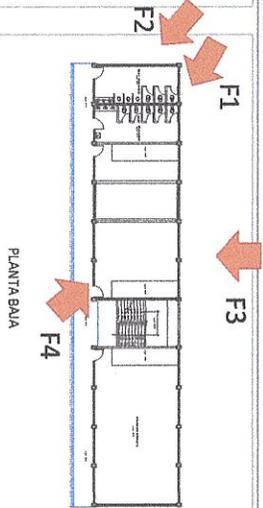

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Cuarta Sección, C.P. 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México.

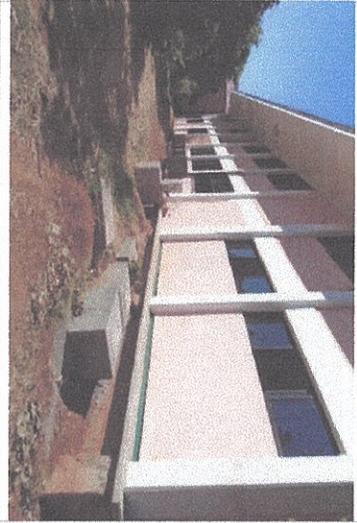

F1:



F2:



F3:



F4: AULA 26

Comentarios de los trabajos realizados:

Obra terminada.

M.A Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

M.A Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

200



Porcentaje de avances

100

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE FOTOGRAFICO

Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtespec.

CARQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO


Mes reportado  
**julio-septiembre**  
FECHA DE CORTE: 30/09/2017

10


Nombre de la obra:



AULAS DE DOS NIVELES



FOTOS

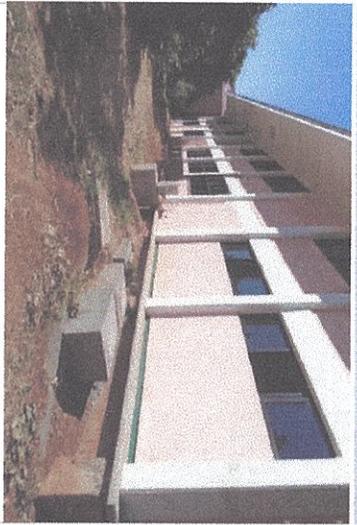

F1:



F2:



F3: AULA 21



F4: AULA 26



F5: AULA 29

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra terminada.

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
julio-septiembre  
FECHA DE COMPILACION: 30/09/2021

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO

10

Nombre de la obra: **Suministro e Instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtspec.**


CRONOGRAMA DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance

100

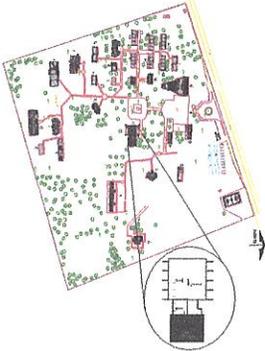

BIBLIOTECA

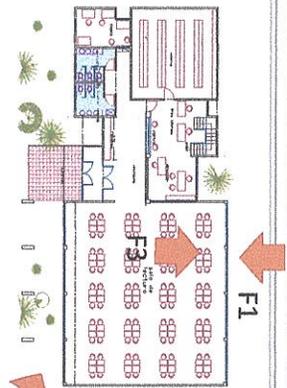

FOTOS



F1:




F2:


Comentarios de los trabajos realizados:  
Obra terminada.



F3:



F4:



F5:

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortes Olivares  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pegatina, se podrán copiar tantas pegatinas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
julio-septiembre





100

Porcentaje de avance

10 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN

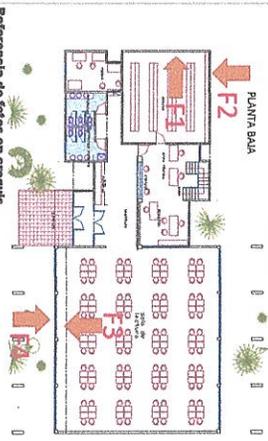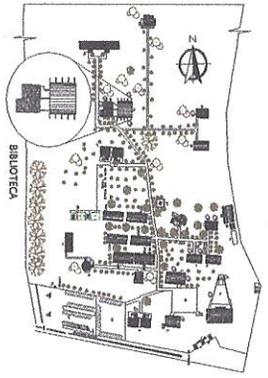

FOTOS

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chihuitan-Ixtotec S/N, Ciudad Ixtotec, Oax., México C.P. 70110.




BIBLIOTECA




F1: ACENSO PLANTA BAJA



F2

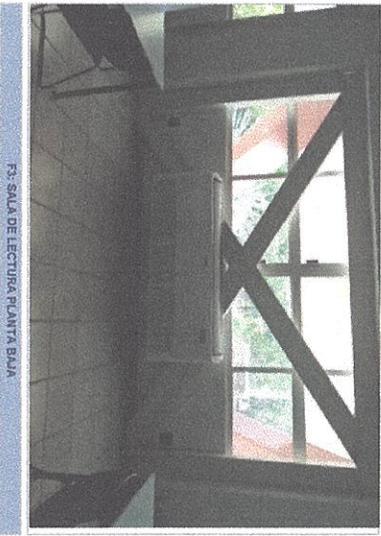

F3: SALA DE LECTURA PLANTA BAJA

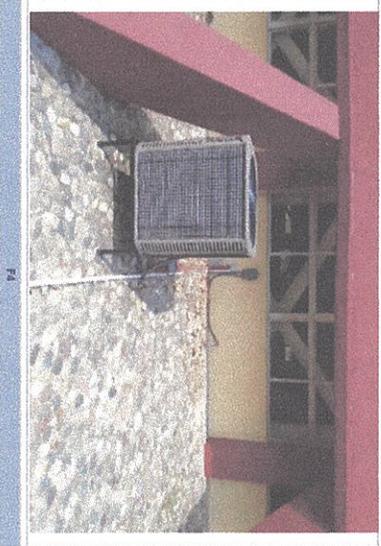

F4

M.A Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

M.A Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.

\* Es muy importante que se anexe informe fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una petatola, se pueden copiar tantas petatolas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

**FAM**

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
**julio-septiembre**  
FECHA DE REGISTRO: 30/09/2021

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO



Reporte No. **10** Nombre de la obra: **Suministro e instalacion de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtapiec.**

GRUPOS DE LOCALIZACION


UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance  
**100**

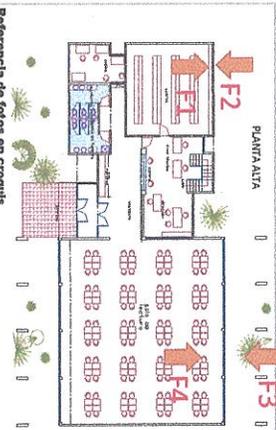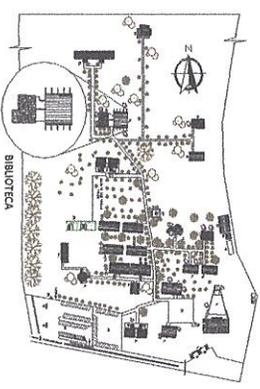

Carr. Chihuitlan-Ixtapiec SN, Ciudad Ixtapiec, Oax., México C.P. 70170.

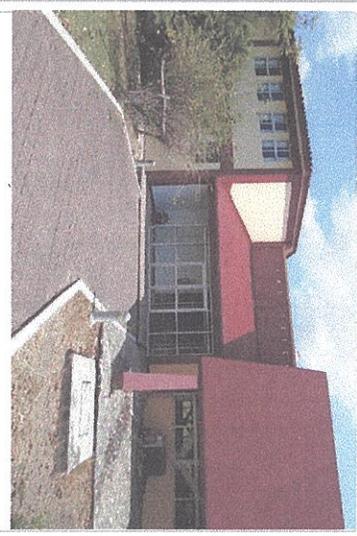

**BIBLIOTECA**



**FILICENO PLANTA ALTA**



**F2**



Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de la IES

\* Es muy importante que se anexen reportes fotográficos de todos los trabajos. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equiparar, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM


DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
julio-septiembre



Porcentaje de avance

100

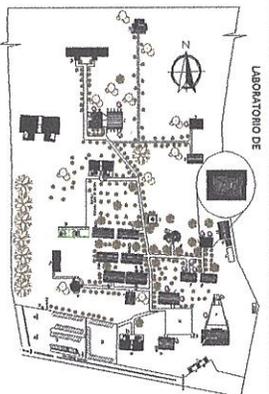


10 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtpec.

CATEGORIA DE LOCALIZACION

REPORTE FOTOGRAFICO

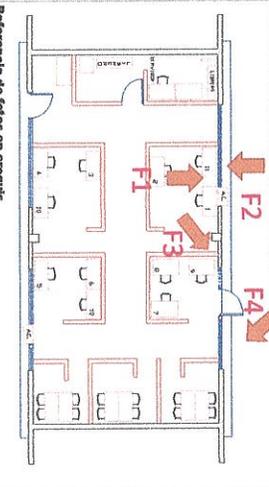


Referencia de fotos en croquis

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

Carr. Chiluhlan-Ixtpec S/N, Ciudad Ixtpec, Oax.  
México C.P. 70110.



LABORATORIO DE AUTOACCESO

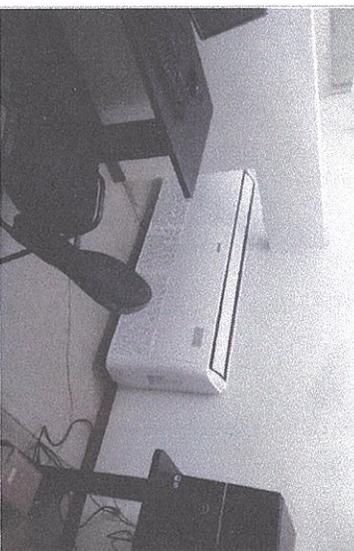

F1

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.



F2



F3



F4

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestiña, se pueden copiar tantas pestiñas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Mes reportado  
julio-septiembre  
FECHA DE CORTE: 30/09/2021



Porcentaje de avances


100

10 Nombre de la obra:


Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

GRUPOS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

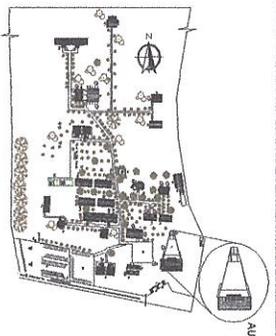


AUDITORIO

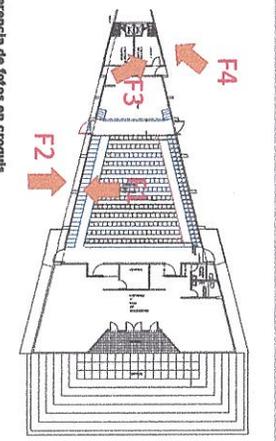


Referencia de fotos en croquis

Carr. Chihuitlan-Ixtepeo S/N, Ciudad Ixtepeo, Oax., México C.P. 70110.

FOTOS

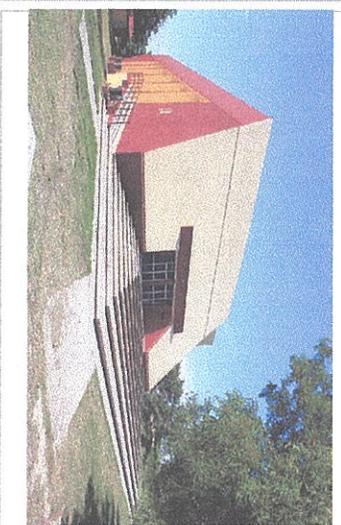


AUDITORIO

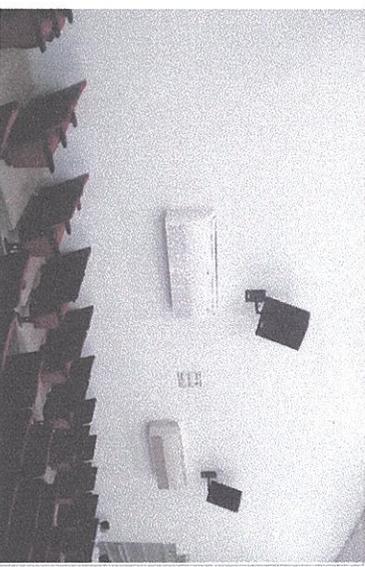


F1

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.

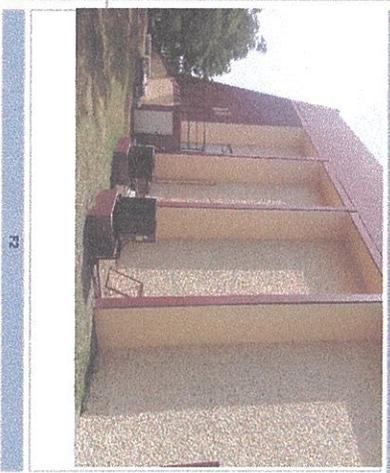

F2

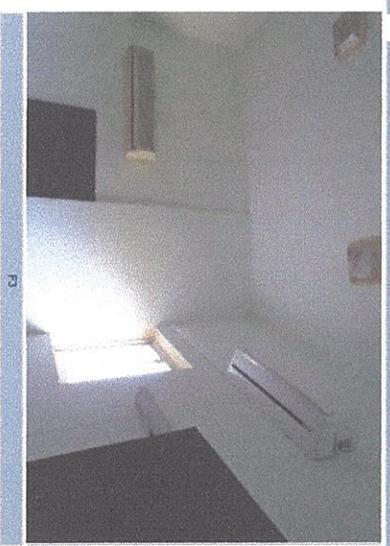

F3



F4

M.A. Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Chiles Olivares.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de Bienes

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE PORTALEJAMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
julio-septiembre

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

REPORTE FOTOGRAFICO

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO

10



Nombre de la obra: Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CRONOIS DE LOCALIZACION



Porcentaje de avance

100

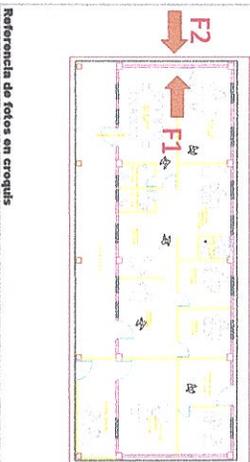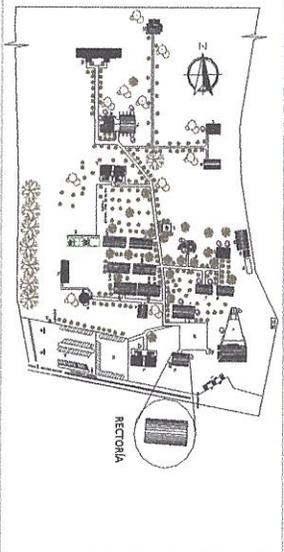


Referencia de fotos en croquis

FOTOS

Carr. Chihuitlan-Ixtotec SNL, Ciudad Ixtotec, Oax.  
México C.P. 70110.

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.

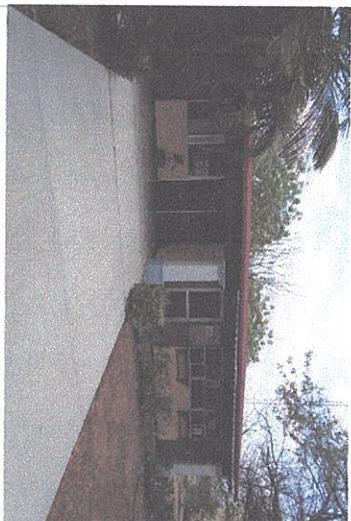

EDIFICIO DE RECTORIA



F1: SALA DE JUNTAS



F2

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe recibo, fotografías de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equiparación, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y después de la obra.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
julio-septiembre



Porcentaje de avance



100

10 Nombre de la obra:

Suministro e instalación de climas en la Universidad del Istmo Campus Ixtotec.

CRONOGRAMA DE LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

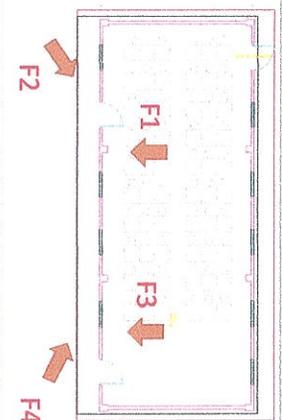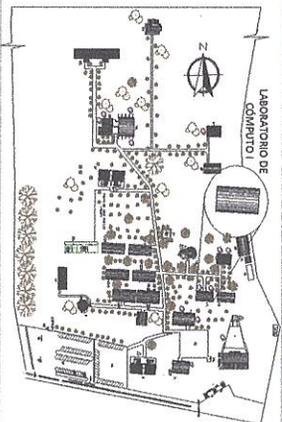

FOTOS



SALA DE COMPUTO1




F1


Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminada.



F2

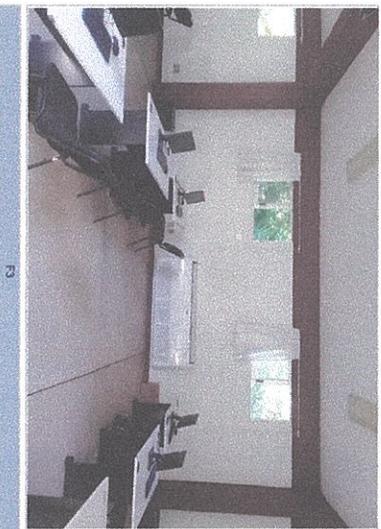

F3

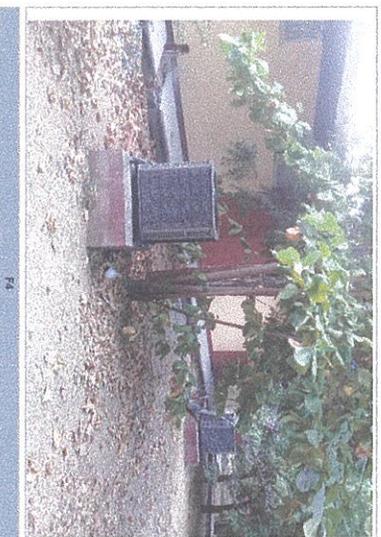

F4

M.A Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de Bienes

M.A Oscar Cortés Olivares.

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* Es muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para al antes, durante y después de la obra.

2019

2020

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORT E FOTOGRAFICO

Mes reportado  
**julio-septiembre**  
Fecha de corte: 30/09/2021




Porcentaje de avance

100



BIblioteca

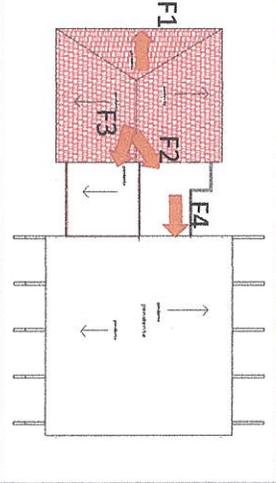

**Impemebilización de edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec.**


**UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO**

Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, Carata  
Sección, C.P. 70780, Santo Domingo Tehuantepec,  
Oaxaca, México.

**FOTOS**



BIblioteca

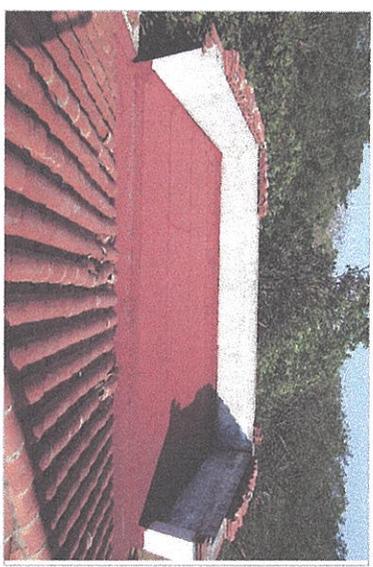


F1



F2



F3

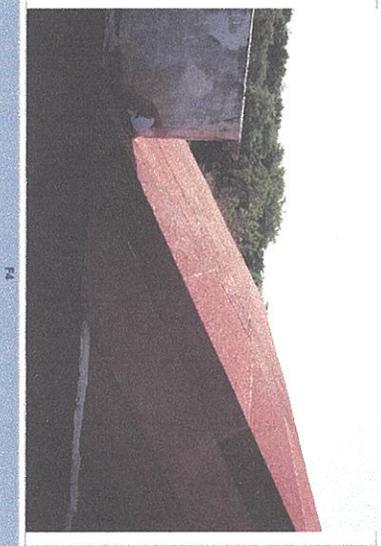

F4

Comentarios de los trabajos realizados:  
Obras terminadas.

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de la IES

M.A. Oscar Cortés Olivares.  
Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

\* En muy importante que se anexe reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, incluso ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
