



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

www.unistmo.edu.mx

2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

OFICIO No. 321/VRAD/UNISTMO/2025

Asunto: El que se indica.

Santo Domingo Tehuantepec, Oax.; a 09 de abril de 2025

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
DGESUI/SES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

Estimado Director:

En atención a su correo electrónico de fecha 18 de marzo del presente, con asunto: "RECORDATORIO, ENVÍO INFORME DE AVANCE FAM, 1er. Informe Trimestral (Enero-Marzo) 2025." y en relación al recurso FAM del ejercicio 2025, asignado a esta dependencia con número de oficio 511/2025-0575-39 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, le hago llegar el primer reporte correspondiente al primer trimestre del año 2025 para el ejercicio del FAM 2025 correspondiente a los meses de enero – marzo del año 2025., Así como, en atención al recurso FAM del ejercicio 2024, asignado a esta dependencia con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, y oficio de validación académica de la solicitud de rectificación de los proyectos FAM 2024 de fecha 12 de marzo, le hago llegar el quinto reporte correspondiente al primer trimestre del año 2025 para el ejercicio del FAM 2024 correspondiente a los meses de enero – marzo del año 2025.

Anexo copias del convenio pendiente de remitir, actas de entrega – recepción, actas administrativas de entrega – recepción y fianzas de vicios ocultos de los proyectos del cierre del ejercicio FAM 2024.

Se informa además que la documentación original se enviará a través de correo postal, impreso y en medios magnéticos; independientemente los documentos en formato Excel y PDF firmados, se envían por medio de correo electrónico. Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
voluntas totum potest
guiráa zanda ne guendaracala'dxi

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN



C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. – Rectora de la Universidad del Istmo. - Para su conocimiento.

Arq. Miriam Guzmán Ordaz. - Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Manto. Mismo fin.

Cfp.- Archivo.

*OCO/mgo

Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050



*OCO/mgo

ANEXO 1 del Oficio No 312/VRAD/UNISTMO/2025

Proyectos Asignados mediante Oficio No. 511/2025-0575-39 de la SEP		
PRIORIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO
1	Modernización y equipamiento de áreas académicas y de investigación en la Universidad del Istmo, que impulsen el desarrollo profesional en el entorno del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).	\$2,775,368.75
2	Mantenimiento de las instalaciones y espacios físicos en la Universidad del Istmo	\$1,982,611.82
3	Climatización de edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec	\$1,972,984.15
4	Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec. (Segunda etapa).	\$1,050,496.86
5	Equipamiento básico de mobiliario para espacios educativos en la Universidad del Istmo	\$1,038,723.44
	TOTAL, CON I.V.A:	\$8,820,185.02



Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

FECHA DE ELABORACIÓN

Nombre: Universidad del Istmo

Dirección: 20 de Enero

Código: 2000000000

Nombre del Proyecto: FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

App: Universidad del Istmo

Correo electrónico: info@univdelistmo.edu.mx



DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: FUNDACIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

App: Universidad del Istmo

Correo electrónico: info@univdelistmo.edu.mx

Table with columns for Project ID, Description, Dates, Budget, and Status. Includes rows for laboratory equipment and energy infrastructure projects.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Nombre: Universidad del Táchira

Ciudad: Mérida - 200000

Código: UNIMIA

Nombre: M.A. María Paz Ojeda

Cargo: Coordinadora de Apoyos

Correo: m.p.ojeda@unimia.edu.ve

Correo: m.p.ojeda@unimia.edu.ve

Fecha: 02/03/2025

Fecha de Emisión: 02/03/2025

Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la Universidad del Táchira, específicamente para los PE de licenciatura de los campos biológicos y agrícolas, así como, los PE de posgrado del campo Talentopec.

Equipamiento de los laboratorios y talleres de los programas académicos del central Talentopec con una orientación a las requerimientos del ambiente y del control (procesamiento del video de Talentopec.

Table with columns: Cód. de Proyecto, Fecha, Monto, Descripción, Tipo de Proyecto, Estado, Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Monto Ejecutado, Monto Total, etc.

Handwritten signature and stamp of M.A. María Paz Ojeda, Coordinadora de Apoyos.

Handwritten signature and stamp of M.A. Carlos Torres Ojeda, Vice Rector de Apoyos Académicos de la UNIMIA.

Handwritten signature and stamp of Mra. María de los Angeles Parra Añas, Rectora de la UNIMIA.

1. Este informe es válido para el periodo de tiempo que se indica en el encabezado del mismo.

2. Este informe es válido para el periodo de tiempo que se indica en el encabezado del mismo.

3. Este informe es válido para el periodo de tiempo que se indica en el encabezado del mismo.

2024

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNISTMO

Porcentaje de avance


100.00%

PROYECTO 1 Nombre de la obra: **Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (01)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (02)




UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, Cp. 70760


FOTOS

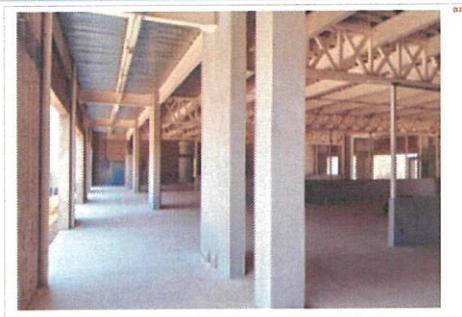

Observaciones:

Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: COMERCIALIZADORA TERRAM ET AGUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V.
Con fecha 18 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto de ejecución, por \$508,297.03 (Cinientos ocho mil doscientos noventa y siete pesos 03/100 M.N.) I.V.A. incluido.
Con fecha 01 de marzo de 2025, se firma el convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución, por un periodo del 05/mar/2025 al 28/mar/2025.
Con fecha 29 de marzo de 2025 se firma el acta de entrega - recepción de los trabajos objeto del contrato EO-920051985-E-3-2024.

Avance en la partida de cimentación al 100%
Avance en la partida de estructuras al 100%
Avance en la partida de albañilería al 100%
Avance en la partida de instalaciones al 100%
Avance en la partida de trabajos extraordinarios al 100%
Avance en la partida de obra complementaria al 100%

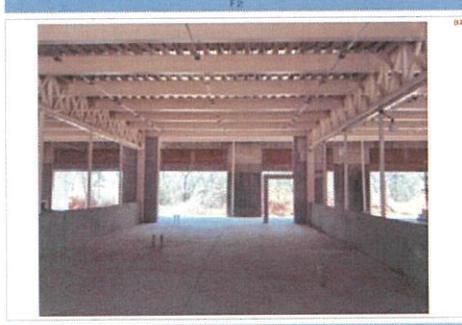

03

Arq. Miriam Macías Hernández
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Osvaldo Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Ángeles Patricia Arias
Rectora de la Unistmo

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024



FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCUTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA




Terminación de obra por obra
1er Trimestre - 2025

Fecha de actualización: 05/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>100.00%</p>	<p>PRIMOSIDAD 1</p> <p>Nombre de la obra: Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec</p> <p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (5)</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (5)</p>  <p>LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)</p>  <p>Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, Cp. 70780</p>
---	---	---	---

FOTOS

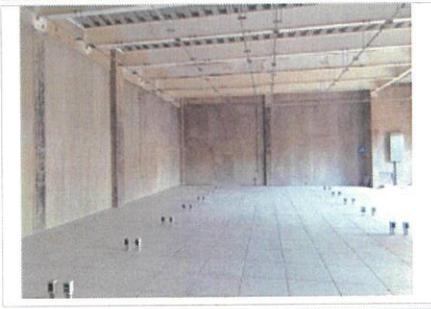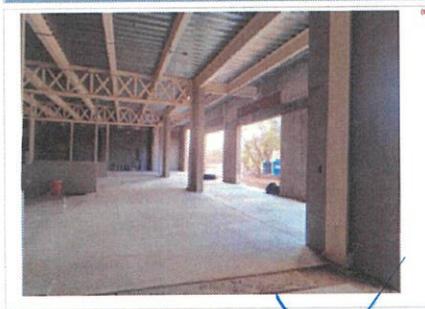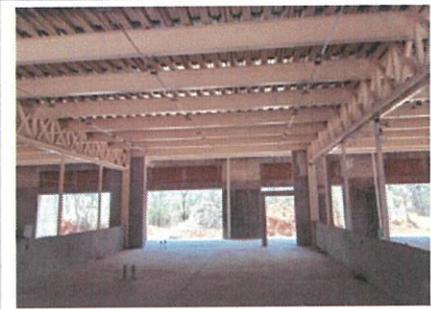

Observaciones: (11)

Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: COMERCIALIZADORA TERRAM ET AGUAM TIERRA Y AGUA S.A. DE C.V.

Con fecha 18 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto de ejecución, por \$508,297.03 (Cinco mil ochocientos noventa y siete pesos 03/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Con fecha 01 de marzo de 2025, se firma el convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución, por un periodo del 05-mar-2025 al 26-mar-2025.

Con fecha 29 de marzo de 2025 se firma el acta de entrega - recepción de los trabajos objeto del contrato EO-92005-985-E-3-2024.

Avance en la partida de cimentación al 100%


Avance en la partida de estructuras al 100%

Avance en la partida de albanilería al 100%

Avance en la partida de instalaciones al 100%

Avance en la partida de trabajos extraordinarios al 100%

Avance en la partida de obra complementaria al 100%



Arq. Miriam Guzmán Olvera
Jefa del Departamento de Proyecto, Construcción y Mantenimiento



M.A. Yecá Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO



Mra. María de los Angeles Piedra Ariza
Rectora de la Unistmo

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrá copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2025


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: **Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtapex (Primera etapa).**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (8)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)


Dirección Postal: Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapex Chihuitan, Ciudad Ixtapex, Oaxaca, CP. 70110



Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS

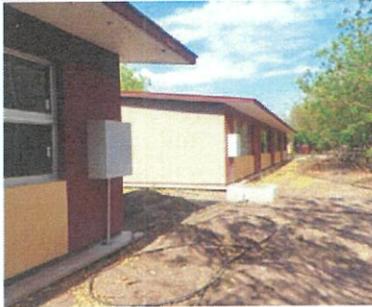

F1



F2



Observaciones: (11)

Con oficio de autorización de recursos No SF/SP/IDP/IFAM-IES/1570-2024, de fecha 25 de septiembre de 2024. Con procedimiento de contratación a base de adjudicación directa de No. E-CO-20051985-E-4-2024. Con fecha 29 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.

Con fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$22,410.50 (Veintidós mil cuatrocientos diez pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido y un periodo de 29 de marzo de 2025 al 30 de marzo de 2025.

Con fecha 31 de marzo de 2025 se firma el acta de entrega - recepción de los trabajos objeto del contrato E-CO-20051985-E-4-2024.

- Avance en la partida de transformador de distribución al 100%
- Avance en la partida de tablero Line al 100%
- Avance en la partida de excavación y tubería al 100%
- Avance en la partida de registros al 100%
- Avance en la partida de cableado y sistema de tierra al 100%
- Avance en la partida de tablero de distribución al 100%
- Avance en la partida de trabajos extraordinarios al 100%
- Avance en la partida de obra complementaria al 100%



F3



F4

Arq. Miriam Guzmán Ordaz
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Dr. Oscar César Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mra. Maira de los Angeles Saldaña Arias
Rectora de la Unistmo

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 06/04/2025


REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: **Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtapeca (Primera etapa).**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

Dirección Postal: Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtapeca Chihuitlan, Ciudad Ixtapeca, Oaxaca. CP. 70110



Porcentaje de avance

100.00%

FOTOS



F1




F2

Observaciones: (11)
Con oficio de autorización de recursos No SF (GPP/DPP/FAM-ES/1570/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024, con procedimiento de contratación a base de adjudicación directa de No. EO-920051985-E-4-2024, con fecha 29 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GRUPO PROURBAC S.A. DE C.V.
Con fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$22,410.00 (Veintidós mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) I.V.A. incluido y un periodo de 29 de marzo de 2025 al 30 de marzo de 2025.
Con fecha 31 de marzo de 2025 se firma el acta de entrega - recepción de los trabajos objeto del contrato EO-920051985-E-4-2024
Avance en la partida de transformador de distribución al 100%
Avance en la partida de tablero o Linea al 100%
Avance en la partida de excavación y tubería al 100%
Avance en la partida de registros al 100%
Avance en la partida de cableado y sistema de tierra al 100%
Avance en la partida de tablero de distribución al 100%
Avance en la partida de trabajos extraordinarios al 100%
Avance en la partida de obra complementaria al 100%



F3

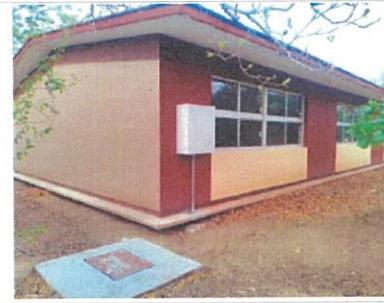

F4

Arq. Miriam Escobar Ojeda
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Ing. Juan Carlos Torres Olivares
Ingeniero de Mantenimiento de la UNISTMO

Mra. Maite de los Angeles Fabiana Arias
Rectora de la Unistmo

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastafila, se podrán copiar tantas pastafilas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Nombre de la obra: **Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**




100.00%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, carretera transístmica Juchitán-la ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000

FOTOS



F1



F2

Observaciones: (11)
Con cicio de autorización de recursos No SF/SIP/DPI/FAM-ES/157/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024. Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 76, en atención al oficio 784VRAD/UNISTMO/2024.
Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GREHUGMAR S.A. DE C.V.
Con fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$259,927.64 (Dieciséis mil novecientos veintiseis pesos 64/100 M.N.) I.V.A. incluido y un periodo de 06 de marzo de 2025 al 20 de marzo de 2025.
Con fecha 25 de marzo de 2025 se firma el acta de entrega - recepción de los trabajos objeto del contrato EO-92005R65-E-2-2024.
Avance en la partida de transición aérea subterránea al 100%
Avance en la partida de excavación y tubería de media tensión al 100%
Avance en la partida de registros de media tensión al 100%
Avance en la partida de cableado de media tensión al 100%
Avance en la partida de tablero I Linea al 100%
Avance en la partida de excavación y tubería de baja tensión al 100%
Avance en la partida de cableado y sistema de tierra al 100%
Avance en la partida de tablero de distribución al 100%
Avance en la partida media tensión aéreo al 100%
Avance en la partida de desmantelamiento al 100%
Avance en la partida de trabajos extraordinarios al 100%
Avance en la partida de obra complementaria al 100%



F3



F4

Ara. Miriam Guzmán Ordaz
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Mrs. Patricia Cortés Olivares
Vice-Rectora de Administración de la UNISTMO

Mra. María de los Angeles Parra Añes
Rectora de la UNISTMO

NOTA
*Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 06/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMAR: 3 Nombre de la obra: **Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (8)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, carretera transistmica Juchitán-La ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000



Proyecto de inversión

100.00%

FOTOS



F1



F2

Observaciones: (11)
Con oficio de autorización de recursos No SF/SP/DP/PP/FAM-IES/157/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024. Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 76, en atención al oficio 784/RAD/UNISTMO/2024

Con fecha 4 de noviembre de 2024 se firma el contrato de obra con la empresa: GREHUGMAR S.A. DE C.V.

Con fecha 20 de diciembre de 2024, se firma el convenio modificatorio de ampliación al monto y plazo de ejecución, por \$305,927.64 (Trescientos sesenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 94/100 M.N.) I.V.A. incluido y un período de 05 de marzo de 2025 al 30 de marzo de 2025.

Con fecha 25 de marzo de 2025 se firma el acta de entrega - recepción de los trabajos objeto del contrato EQ-920051985-E-2-2024

- Avance en la partida de transición aérea subterránea al 100%
- Avance en la partida de excavación y tubería de media tensión al 100%
- Avance en la partida de registro de media tensión al 100%
- Avance en la partida de cableado de media tensión al 100%
- Avance en la partida de tablero I Líne al 100%
- Avance en la partida de excavación y tubería de baja tensión al 100%
- Avance en la partida de cableado y sistema de tierra al 100%
- Avance en la partida de tablero de distribución al 100%
- Avance en la partida media tensión aérea al 100%
- Avance en la partida de demantelamiento al 100%
- Avance en la partida de trabajos extraordinarios al 100%
- Avance en la partida de obra complementaria al 100%



F3



F4

Arq. Miriam del Tránsito Ordaz
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Castro Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Ángeles Puebla Rojas
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 4 Nombre de la obra: **Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los pabellones de los campus Ixtepeca y Juchitán, así como, los pabellones de los campus Tehuantepec.**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (1) CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (2)



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

Dirección Postal:

Campus Ixtepeca, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepeca Chihuitan, Ciudad Ixtepeca, Oaxaca, CP. 70110

Campus Juchitán, Ciudad Universitaria S/N, carretera transistmica Juchitán-la ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000.

Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760

100.00%

FOTOS

AULAS, campus Ixtepeca (1)



PROYECTOR BENQ

AIRE ACONDICIONADO DE 3 TON

LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán (2)



ANALIZADOR DE FIBRA ÓPTICA

CONGELADOR HORIZONTAL

ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE

MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA

Observaciones: (11)

Con oficio de autorización SF/SP/DP/PP/FAM-ES/0423/2024, de fecha 28/05/2024 CANCELADA. Con oficio de autorización SF/SP/DP/PP/FAM-ES/1586/2024, de fecha 10/10/2024. Con fecha 03 de diciembre de 2024, se publica la convocatoria múltiple, por parte de la Secretaría de Administración, por la Dirección de Recursos Materiales, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la licitación pública nacional No. LPN-SA-UI-0055-11/2024. <https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/>

Con fecha 18 de diciembre de 2024, se emite la notificación del Fallo de la licitación pública nacional, determinando declarar ganadores a los siguientes licitantes: Medquimia S.A. de C.V. quien ofertó la partida 7 por un monto total de \$24,153.52 (Veinticuatro mil ciento cincuenta y tres pesos 52/100 M.N.) I.V.A. incluido. El Crisol S.A. de C.V. quien ofertó la partida 5 por un monto total de \$9,969.27 (Nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 27/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 75, en atención al oficio 753/VRADUNISTMO/2024

Se realizan los procedimientos de adjudicación directa para comprometer el recurso y realizar la adquisición de los equipos autorizados.

Se cuenta con actas de entrega de los contratos realizados.

LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán (2)




AGITADOR VIBRATORIO VORTEX GENIE

DESHIDRADOR DE ALIMENTOS

MEDIDOR DE ACTIVIDAD DE AGUA

LABORATORIO: Laboratorios de Energía Eólica, campus Tehuantepec (2)

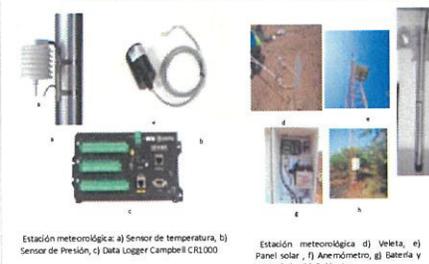

Estación meteorológica: a) Sensor de temperatura, b) Sensor de Presión, c) Data Logger Campbell CR1000

Estación meteorológica d) Vela, e) Panel solar, f) Anemómetro, g) Batería y controlador, h) Gabinete

Ing. Miriam Contreras Pineda
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Ing. Ericka Patricia Olivares
Vice-Rectora de Administración de la UNISTMO

Mra. María de los Angeles Pineda Arías
Rectora de la Unistmo

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


1er Trimestre - 2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD 5 Nombre de la obra: Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los PE de Restauración de los campos listados y Juchitán, así como, los PE de pago del campo Tehuantepec.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8) CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

UNISTMO
100.00%



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70700

FOTOS

Taller Aula de Dibujo

RESTIRADOR PROFESIONAL para arquitectura, dibujo técnico o dibujo artístico. Mesa de vidrio templado y estructura de acero. Incluye bandejas. Contiene dos cajones en la parte inferior de la mesa del restirador para colocar objetos. INCLUIRE - Mesa de trabajo de cristal - Estructura de acero - 4 charolas de plástico - 4 ruedas - 4 estabilizadores - 2 cajoneras - 1 llave allen de 4mm - 1 llave española de 10 y 12 mm - Tornillería para su armado.
MEDIDAS DEL PRODUCTO Largo: 104 cm Ancho: 61 cm Alto: 124 cm

Taller de Metales **Taller de Serigrafía**

COMPRESOR DE AIRE Para secado de materiales. PLOTTER DE CORTE Para vinil. IMPRESORA DE SUBLIMACIÓN

Observaciones:
Con oficio de autorización SF/SPIP/DPIP/FAM-ES/0423/2024, de fecha 28 de mayo de 2024. CANCELADA.
Con oficio de autorización SF/SPIP/DPIP/FAM-ES/1985/2024, de fecha 16/10/2024.
Con fecha 03 de diciembre de 2024, se publica la convocatoria múltiple por parte de la Secretaría de Administración, por la Dirección de Recursos Materiales, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la licitación pública nacional No. LPN-S/A-UJ-0056-11/2024.
<https://www.oaxaca.gob.mx/indicadores/licitaciones/>
Con fecha 17 de diciembre de 2024, se emite la notificación del Fallo de la licitación pública nacional, determinando declarar ganadores a los siguientes licitantes:
Grupo mayoría de oaxaca S.A. de C.V. quien ofertó la partida 10 por un monto total de \$1,029.58 (Un mil veintinueve pesos 58/100 M.N.) I.V.A. incluido.
Raxi comercializadora S.A. de C.V. quien ofertó la partida 11 por un monto total de \$13,871.40 (Trece mil ochocientos setenta y un pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido.
Se declaran DESERTAS las partidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16.
Se realizan los procedimientos de adjudicación directa para comprometer el recurso y realizar la adquisición de los equipos autorizados.
Se cuenta con el folio de reducción de recursos No. 75, en atención al oficio 763VRAD/UNISTMO/2024

Laboratorio de Oceanografía **Laboratorio de Ing. Química**

REFRIGERADOR COMERCIAL Capacidad de 547 L, con iluminación LED, puerta de vidrio.
GENERADOR DE NITRÓGENO Pureza de nitrógeno de 99.9 %, alimentación de 220V, capacidad de 300 ml/min.

Taller de Maderas

Torno para madera de 40" e) Lijadora de Banda Sierra Ingleteadora Clavadora Neumática

Arg. Myriam...
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

...
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles...
Rectora de la Unistmo

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adquisiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

1er Trimestre - 2025

Fecha de observación: 16/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD 5 Nombre de la obra:

Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los PE de Reconstrucción de los campus Istapac y Juchitán, así como, los PE de posgrado del campus Tehuantepec.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)


CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)



Porcentaje de avance

100.00%



Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N. Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760

FOTOS

Taller de Serigrafía (8)



PLANCHA PARA TAZAS

IMPRESORA DE SUBIMACIÓN



PLOTTER DE CORTE Para vinil

F1

Laboratorio de Química (8)



GENERADOR DE NITRÓGENO Purity de nitrógeno de 99.9 % alimentación de 220V, capacidad de 300 ml/min.



MUFLA



CONGELADOR HORIZONTAL



BALANZA ANALÍTICA

F2

Observaciones: (11)

Con oficio de autorización SF/SPIP/DP/IFAM-ES/0423/2024, de fecha 28 de mayo de 2024, CAN CELADA. Con oficio de autorización SF/SPIP/DP/IFAM-ES/1985/2024, de fecha 16/10/2024. Con fecha 03 de diciembre de 2024, se publica la convocatoria múltiple, por parte de la Secretaría de Administración, por la Dirección de Recursos Materiales, del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la licitación pública nacional No. LPN-SAU-0056-11/2024. <https://www.oaxaca.gob.mx/administracion/licitaciones/>

Con fecha 17 de diciembre de 2024, se emite la notificación del Fallo de la licitación pública nacional, determinando declarar ganadores a los siguientes licitantes: Grupo mayorista de Oaxaca S.A. de C.V. quien ofertó la partida 10 por un monto total de \$1,026.56 (Un mil veintinueve pesos 58/100 M.N.) I.V.A. incluido. Rival comercializadora S.A. de C.V. quien ofertó la partida 11 por un monto total de \$13,671.40 (Trece mil ochocientos setenta y un pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido.

Se realizan los procedimientos de adjudicación directa para comprometer el recurso y realizar la adquisición de los equipos autorizados.

Se cuanta con el folio de reducción de recursos No. 75, en atención al oficio 763VRAD/UNISTMO/2024

Taller Aula de Dibujo (8)



RESTIRADOR PROFESIONAL

COMPRESOR DE AIRE Para secado de materiales.

Taller de Metales (8)



Taller de Maderas (8)



Clavadora Neumática

e) Lijadora de Banda



Sierra de Inglete



Sierra de Mesa 10"

F3

F4

Arq. Sergio Lozano Parra Soriano
Jefe del Departamento de Proyectos, Verificación y Mantenimiento

M.A. César Quintero Jimenez
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mrs. María de los Ángeles
Rectora de la Universidad

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Paralelo se anexa una planilla, se podrá copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adyacencias, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

CARGO EN LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad del Istmo

Entidad federativa: 20 Oaxaca

Clave SIT: 2004500219

Nombre: M.A. Oscar Castro Olivares

Cargo: Vicerrector de Administración

Teléfono: 871 71 2 70 50 Ext. 208

Cuenta electrónica: vic_alm@univm.unimmo.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Iván Quiroz Ortiz

Cargo: Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 871 71 2 70 50 Ext. 209

Cuenta electrónica: idquirozo@unimmo.edu.mx, idquirozo@unimmo.edu.mx

CARGO Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Proyecto	Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Tipo de Proyecto	Monto autorizado (M\$)	CONTRATO Y CALIFICADO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				Monto pagado (M\$)	Resumen (E) A-D	Ejercicios (A) - (B) - (C) - (D)			Monto pagado (M\$)	Fecha de Ejecución	Observaciones	Avance a la Fecha			Actas				
					Número de Contrato(s)	Fecha Programada		Monto Contratado (B)			Cantidad	Diferencia (C) - (B) - (A) - (D) - (C) - (A) - (B)	Número de Ejercicios				Cantidad	Monto Contratado	Línea de Crédito	Acta de Pago	Acta de Recepción (Acto de Entrega)	Fecha	Acta de Recepción de Obra	Fecha
						INICIO	TERMINO																	
1	2	Mantenimiento de las instalaciones y espacios físicos en la Universidad del Istmo	X	\$ 1,982,611.82		01/06/2025	28/10/2025		1	<p>GLOBAL DEL PROYECTO</p> <p>Beños generales 2 253.57</p> <p>Calentador 2 433.01</p> <p>Módulo de aulas 12 5181.64</p> <p>Centro de idiomas 2 522.18</p> <p>Biblioteca 1 710.88</p> <p>Caseta de emergencia 1 42.72</p> <p>Vice-rectoría administrativa 1 259.07</p> <p>Laboratorio de biología 1 271.30</p> <p>Rectoría 1 133.24</p> <p>Instituto de energía 1 747.82</p> <p>Almacén 1 193.20</p> <p>TOTAL 25 8757.83</p> <p>Salones de clase del 1 al 21. Aire acondicionado de 36,000 BTU's 21 710.88</p> <p>Salón de clase 1. Tablero line de 10 circuitos. 800 de amperes 1 1090.00</p> <p>Salón de clase 1. Tablero eléctrico de 30 circuitos de 200 de amperes 6 1452.00</p> <p>Salón de clase 1. Nicho de concreto para albero eléctrico. 6 1090.00</p> <p>Laboratorio de industrial. Aire acondicionado de 36,000 BTU's. 13 1452.00</p> <p>Laboratorio de industrial. Transformador de 750 kva 1 1090.00</p> <p>Laboratorio de industrial. Planta de emergencia de 750 kva. 1 1452.00</p> <p>Laboratorio de industrial. Tablero line de 10 circuitos. 800 de amperes 1 1090.00</p> <p>Laboratorio de industrial. Tablero eléctrico de 30 circuitos de 200 de amperes 1 1452.00</p> <p>Laboratorio de industrial. Nicho de concreto para albero eléctrico. 1 1090.00</p> <p>Biblioteca. Aire acondicionado de 36,000 BTU's. 1 1452.00</p> <p>Biblioteca. Aire acondicionado de 36,000 BTU's. 1 1452.00</p> <p>Biblioteca. Tablero eléctrico de 30 circuitos de 200 de amperes 1 1090.00</p> <p>Biblioteca. Nicho de concreto para albero eléctrico. 1 1452.00</p> <p>TOTAL 58 17144.88</p>			<p>Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/0225-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. En proceso de rectificación de proyectos en el portal del Sistema de Inversión (SIFAM), en base al calendario referente al oficio 511/0225-1000-39 de fecha 19 de marzo de 2025.</p>											
2	2	Climatización de edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec	X	\$ 1,972,984.15		01/08/2025	29/10/2025		1	<p>Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/0225-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. En proceso de rectificación de proyectos en el portal del Sistema de Inversión (SIFAM), en base al calendario referente al oficio 511/0225-1000-39 de fecha 19 de marzo de 2025.</p>														
3	4	Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec. (Segunda etapa).	X	\$ 1,050,496.86		01/07/2025	28/10/2025		1	<p>Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/0225-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. En proceso de rectificación de proyectos en el portal del Sistema de Inversión (SIFAM), en base al calendario referente al oficio 511/0225-1000-39 de fecha 19 de marzo de 2025.</p>														
											TOTAL	7	3872.19											

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD DEL ISTMO



Nombre: Universidad del Istmo

Entidad federativa: 20 Oaxaca

Ciudad: 611 20MS0021P

Nombre: M.A. Oscar Cortés Olivares

Cargo: Vicerrector de Administración

Teléfono: 011 712 32 50 Ext. 209

Correo electrónico: vica_admin@unismo.edu.mx

RESPONSABLES

Nombre: Arq. Miriam Guzmán Ordaz

Cargo: Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Teléfono: 011 712 32 50 Ext. 209

Correo electrónico: deproyectos@unismo.edu.mx, apom.unismo@gmail.com

CIERRE Y MANTENIMIENTO

Modernización y equipamiento de áreas académicas y de investigación en la Universidad del Istmo que impulsen el desarrollo profesional en el entorno del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIT)

5 1

2,775,368.75

01/08/2025 28/11/2025

5

Laboratorio de Hidrocarburos. Agujador de bienz, Tuber y tuberías.	1	Pza
Laboratorio de biomasas Centrifuga	1	Pza
Laboratorio de biomasas Minicool 45.000 STU'S	2	Pza
Laboratorio de química y laboratorio de ingeniería química Refinamiento	2	Pza
Laboratorio de química y laboratorio de ingeniería química Homos	2	Pza
Laboratorio de ingeniería química. Molino de bolas	1	Pza
Clinica robotizada. Manual CPM Prompt para estudio para RCP	10	Pza
Clinica robotizada. Manual RCP Prompt de Formación y Prácticas para RCP - Manual Babel Paquete de 5	10	Pza
Clinica robotizada. Manual crisis completo	2	Pza
Clinica robotizada. Refrigerador para vacunas	1	Pza
Clinica robotizada. Mesa Pasteur de acero inoxidable	3	Pza
Clinica robotizada. Gile Genova crisis linea mala	20	Pza
Clinica robotizada. Proyector con blanco para sala	4	Pza
Sala de Desarrollo de Software. Proyector	2	Pza
Sala de Redes. Servidor	1	Pza
Sala de Redes. No Break	1	Pza
Taller de Cerámica. Homo eléctrico modelo modelo CR 10L-6R	1	Pza
Taller de Cerámica. Tomo DIVADPO RV-WANDSPER	1	Pza
Taller de Plásticos. X1 Carbon compo Bambi Lab	1	Pza
Taller de Plásticos. Termofractora para Plástico MASTER Max	1	Pza
Taller de Plásticos. Dobladora de acrílico	1	Pza
Taller de Serigrafía. SNAPMAKER ARTISAN Snapmaker Artisan impresora 3D grabadora láser y máquina CNC 3 en 1	1	Pza
Taller de Serigrafía. EINSCAN H2 SHINING 3D	1	Pza
Taller de Serigrafía. Cortadora láser BEAMO 30W FUV	1	Pza
Taller de Textil. PRISOV Boradora semi-industrial de 6 agujas	1	Pza
Taller de Textil. Teleros de Mesa de 30cm	5	Pza
Taller de Metales. Router para grabado CNC Orion 3D 1025C	1	Pza
Taller de Metales. Dobladora rotadora cortadora de lámina 3 en 1 de 30" spray SHANTIZ	1	Pza
Taller de Metales. Equipo para corte con Plasma Spectrum 625 Xtreme	1	Pza
Taller de Metales. Cortadora láser BEAMO 30 W	1	Pza
Sala de cómputo 3. Kit de Audio	1	Pza
Salas de cómputo 1 y 2 Equipo de cómputo de escritorio All-in-One	100	Pza
TOTAL	481	Pza

Recurso FAM del ejercicio 2025 asignado con número de oficio 511/2025-0575-39 de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. En proceso de rectificación de proyectos en el portal del Sistema de Inversión (SIFAM) en base al calendario referencial al oficio 511/2025-1000-39 de fecha 19 de marzo de 2025.

\$8,820,183.02

\$0.00 \$0.00 \$0.00

Arq. Miriam Guzmán Ordaz
Jefa del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora de la Unistmo

Se capturan los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden anexar fotos como sea necesario. En esta sección se muestran los resultados de forma breve y concisa de trabajos y visitas, siempre que se estén reflejando en el reporte fotográfico. El presupuesto por las fechas de inicio y término están actualizadas. Todas las cels. de \$0.00. \$0.00. \$0.00 y \$0.00.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PRIMORDIA 1

Nombre de la obra: Mantenimiento de las instalaciones y espacios físicos en la Universidad del Istmo

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN

UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

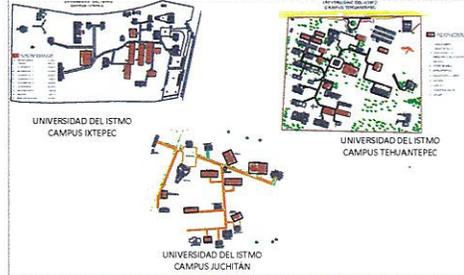

UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC

UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS


Dirección Postal:

Campus Ixtepec, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110

Campus Juchitán, Ciudad Universitaria S/N, carretera transistmica Juchitán-la ventosa km 14, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México C.P. 70000.

Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760

FOTOS



Sustitución de sanitarios en el edificio de centro de idiomas

Sustitución de mingitorios en baños generales

Reparación de instalación sanitaria en baños generales, biblioteca, cafetería y centro de idiomas



Sustitución de pisos y muros: cambio de losetas y azulejos por reparaciones sanitarias e hidráulicas

Impermeabilización del edificio de centro de idiomas

Remodelación de puertas y mamparas en baños generales

Observaciones :

Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.
En proceso de rectificación de proyectos en el portal del Sistema de Inversión (SIFAM), en base al calendario referente al oficio 511/2025-1000-39, de fecha 19 de marzo de 2025.

F1:



Sustitución de pisos y muros: cambio de losetas y azulejos por reparaciones sanitarias e hidráulicas

Aplicación de pintura en los módulos de aulas 1 y 2

Impermeabilización de centro de idiomas, cafetería y vice-rectoría académica

F2:



Sustitución de sanitarios en baños de biblioteca

Sustitución de lavabos en baños de rectoría

Sustitución de mingitorios en baños de cafetería



Reparación de instalación hidráulica y sanitaria en baños de biblioteca

Sustitución de pisos y muros: cambio de losetas y azulejos por reparaciones sanitarias e hidráulicas

Sustitución de cancelería en las salas de cómputo, auditorio y rectoría

F3:

Arq. Miriam Guzmán Ordaz
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

F4:

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

F5:

Mtra. Maria de los Angeles Peralta Arias
Rectora de la Unistmo

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial: se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre o año que se reporta

1er Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 05/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PRIMORDIA 2

Nombre de la obra: Climatización de edificios en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal:

Campus Tehuantepec, Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México. Cp. 70760

FOTOS



Se cambiará el clima de 60,000 BTU's en mal estado en Sala de lectura de biblioteca



Se cambiará el clima de 36,000 BTU's en mal estado en Sala de




Salones de clases



Se instalarán aires acondicionados de 36,000 BTU's en Salones de clases



Transformador de Distribución tipo pedestal de 750 KVA, 3F. Relación 13200-110/220 marca, conexión Estrella-Delta



Planta generadora de energía eléctrica de 750 KVA, 3F, voltaje 120/200, medidas 5'13 x 2'49 x 3'58 cm.



Aire acondicionado inverter de 60,000 BTU's, Fuente de alimentación: (V/Hz/Ph) 220-230/60/3, tipo piso-techo, gas refrigerante: R410A, Un control remoto LCD para mayor comodidad, Descarga: vertical

Observaciones :

Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. En proceso de rectificación de proyectos en el portal del Sistema de Inversión (SIFAM), en base al calendario referente al oficio 511/2025-1000-39, de fecha 19 de marzo de 2025.

F1:



Tablero 1 línea de 10 circuitos, Capacidad del interruptor principal: 800 A, Ipo de Acometida y Marco: ML, Para sistemas eléctricos: De 3 fases - 4 hilos, Tensiones de operación máximo: 600 Vc.a., 250 Vc.d., Tipo Nema 1 (estándar), Buses: De cobre plateado de 800 A.



Aire acondicionado inverter de 36,000 BTU's, Fuente de alimentación: (V/Hz/Ph) 220-230/60/3, tipo techo, gas refrigerante: R410A, Un control remoto LCD para mayor comodidad, Descarga: vertical



Tablero 1 línea de 10 circuitos, Capacidad del interruptor principal: 800 A, Ipo de Acometida y Marco: ML, Para sistemas eléctricos: De 3 fases - 4 hilos, Tensiones de operación máximo: 600 Vc.a., 250 Vc.d., Tipo Nema 1 (estándar), Buses: De cobre plateado de 800 A.

F2:



Se instalarán aires acondicionados de 36,000 BTU's en laboratorios



Se instalarán tableros eléctricos para climatización de los edificios de autos

F4:



Se instalará un clima de 36,000 BTU's en Sala de estudio de biblioteca



Tablero de alumbrado NQ30 con interruptor principal, Corriente nominal: 200 A, Corriente interrumpida nominal: 10 Ka, Voltaje: 240 V CA, 48 V DC, 3F-4H, Neutro al 200% instalado de fábrica, Tipo Nema 1 (estándar)

F5:

Arq. Miriam Guzmán Ordaz
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles Peralta Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL-DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año civil de reporte:

1er Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PRIORIDAD 3


Nombre de la obra: Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec. (Segunda etapa).

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal:

Campus Ixtepec, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca. CP. 70110

FOTOS



La biblioteca cuenta con una sala de lectura, una sala de estudio, dos serenos, y las oficinas administrativas y de atención las cuales por las altas temperaturas presentes en la región hacen necesario que los aires acondicionados trabajen a su máxima capacidad...



El instituto de estudios es un espacio destinado a los profesores-investigadores para dar asesorías extra clase a los alumnos. Cada profesor está a cargo de cierta cantidad de alumnos en los cubículos los cuales utilizan computadoras, impresoras, proyectores, cafeteras...



La cafetería es una de las áreas que se utiliza con mayor frecuencia, considerando que además de los estudiantes, el personal administrativo y académico que labora en la institución también acude a solicitar el servicio...



El auditorio institucional es utilizado para seminarios, conferencias, graduaciones y eventos culturales, por tal motivo y tomando en cuenta que representa doble altura...

Observaciones :

Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública...



En el taller de carpintería se elaboran los muebles que se utilizan en los diferentes edificios no solo del Campus Ixtepec, sino también de los Campus de Tehuantepec y Juixtlán...

Signature of Arq. Miriam Guzmán Ordaz, Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

Signature of Mtra. Cecilia Ojeda, Vice-Rectora de Administración de la UNISTMO

Signature of Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias, Rectora de la Unistmo

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que reporta

1er Trimestre - 2025

Fecha de elaboración: 05/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

LOGO DE INSTITUCIÓN



Porcentaje de avance

0.00%

PRIMORDIA

4


Nombre de la obra: Equipamiento básico de mobiliario para espacios educativos en la Universidad del Istmo.

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS ITEPEC

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS ITEPEC

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Dirección Postal: Campus Itepec, Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec-Chihuitán, Ciudad Itepec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS

Aulas: Salones de clases

Mesa 90 Piezas



Mesa escritorio de estructura metálica con cubierta en melamina, de 1.40m x 60 cm x 72 cm.

Pantallas 8 Piezas



Pantalla Comercial LED 75"

Aulas campus Itepec

Sillas 180 Piezas



Sillas con estructura de acero tubular... con acabado de pintura epóxica... flexible con densidad en el respaldo de 22 kg/m3 y de 24 kg/m3 en el asiento y alta resistencia. Tapiz: tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices. Peso máximo de resistencia: 120 kg.

Soporte de Pantalla 8 Piezas



Soporte de pantalla LED 75"

Aulas: Salones de Clases

Equipo de cómputo de escritorio All-in-One



Dell OptiPlex 7420 All-in-One 23.8" Intel Core i7-14700, Memoria RAM: 32GB, Unidad de almacenamiento: SSD M.2 2TB, Windows 11 Pro 64-bit, Negro. Puertos e interfaces: PowerShare USB-SI, Número de puertos PowerShare USB: 1, Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1, Cantidad de puertos tipo C/USB 3.1 (3.1 Gen 2): 1, Cambio de estado de auriculares / micrófono del puerto SI, Versión HDMI 2.1, Cantidad de puertos tipo A/USB 3.1 (3.1 Gen 2): 4, Número de puertos HDMI: 2, Botón de encendido/apagado SI, Cantidad de DisplayPorts: 1, Salidas para auriculares: 3, Cantidad de puertos tipo A/USB 3.0 (3.1 Gen 1): 2.

Aulas campus Itepec

170 Piezas

Observaciones :

Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. En proceso de rectificación de proyectos en el portal del Sistema de Inversión (SIFAM), en base al calendario referente al oficio 511/2025-1000-39, de fecha 19 de marzo de 2025.

Aulas: Aulas Interactivas

Mesa 10 Piezas



Mesa escritorio de estructura metálica con cubierta en melamina, de 1.40m x 60 cm x 72 cm.

Pantalla 2 Piezas



Pantalla Comercial LED 75"

Aulas campus Itepec

Sillas 20 Piezas



Sillas con estructura de acero tubular... con acabado de pintura epóxica (electrocoat) color negro, gris o blanco. Respaldo y asiento: hueco espuma laminada. Flexible con densidad en el respaldo de 22 kg/m3 y de 24 kg/m3 en el asiento y alta resistencia. Tapiz: tapizada al color de su elección de toda nuestra colección de tapices. Peso máximo de resistencia: 120 kg.

Soporte de Pantalla 2 Piezas



Soporte de pantalla LED 75"

Aulas: Aulas Interactivas

Equipo de cómputo de escritorio All-in-One



Dell OptiPlex 7420 All-in-One 23.8" Intel Core i7-14700, Memoria RAM: 32GB, Unidad de almacenamiento: SSD M.2 2TB, Windows 11 Pro 64-bit, Negro. Puertos e interfaces: PowerShare USB-SI, Número de puertos PowerShare USB: 1, Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1, Cantidad de puertos tipo C/USB 3.1 (3.1 Gen 2): 1, Cambio de estado de auriculares / micrófono del puerto SI, Versión HDMI 2.1, Cantidad de puertos tipo A/USB 3.1 (3.1 Gen 2): 4, Número de puertos HDMI: 2, Botón de encendido/apagado SI, Cantidad de DisplayPorts: 1, Salidas para auriculares: 3, Cantidad de puertos tipo A/USB 3.0 (3.1 Gen 1): 2.

Aulas campus Itepec

20 Piezas

Aulas: Aulas Interactivas

Aulas campus Itepec



Mra. Miriam Guzmán Ordaz, Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Cortés Olivares, Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mtra. María de los Angeles Peñaflor Arias, Rectora de la UNISTMO

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre - 2025

Fecha de actualización: 05/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Form header containing project details: PRIORIDAD 5, Nombre de la obra: Modernización y equipamiento de áreas académicas y de investigación en la Universidad del Istmo, que impulsan el desarrollo profesional en el entorno del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Includes georeferencing, project plan, and location photos.

FOTOS

F1: Aulas: Salones de clases. Includes photos and descriptions of classrooms (Aulas A1, A2, A3, A4, A5, A6), a chair, a table, a projector, and a screen.

F2: Laboratorio: Hidrocarburos. Includes photos and descriptions of an Infrared Spectrophotometer, a densitometer, and a rotational viscosimeter.

Observaciones: Recurso FAM del ejercicio 2025, asignado con número de oficio 511/2025-0575-39, de fecha 18 de febrero de 2025 por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública.

F3: Laboratorio: Ing. Química. Includes photos and descriptions of a refrigerator and a Comesa mortar.

F4: Laboratorio: Clínica Robotizada. Includes photos of a robotic surgery room and a patient bed.

F5: Laboratorios: Taller de Metales, Taller de Serigrafía, Taller de Textil, Taller de Cerámica, Taller de Plásticos. Includes photos of various workshop areas.

Arq. Miriam Guzmán Ordaz
Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Mantenimiento

M.A. Osorio Cortés Olivares
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mra. María de los Angeles Pineda Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
