



OFICIO No. 570/VRA/UNISTMO/2023

Asunto: El que se indica.

Santo Domingo Tehuantepec, Oax.; a 04 de octubre de 2024

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
DGESUI/SES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E.

Estimado Director:

En atención a su oficio correo electrónico de fecha 25 de septiembre del presente y con asunto: "RECORDATORIO, ENVÍO INFORME DE AVANCE FAM, 3er. Trimestre (Julio-Septiembre) 2024" y en relación al recurso FAM del ejercicio 2024, asignado a esta dependencia con número de oficio 511/2024-0622-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, y oficio de validación académica de la solicitud de rectificación de los proyectos FAM 2024 de fecha 12 de marzo, le hago llegar el tercer reporte correspondiente al tercer trimestre del año 2024 para el ejercicio del FAM 2024 correspondiente a los meses de julio – septiembre del año 2024.

Anexo copias de los oficios de autorización emitidos por la Secretaría de Finanzas, Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública, de los proyectos: Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la Universidad del Istmo, específicamente para los PE de licenciatura de los campus Ixtepec y Juchitán, así como, los PE de posgrado del campus Tehuantepec, Equipamiento de los laboratorios y talleres de los programas educativos del campus Tehuantepec con una orientación a los requerimientos del entorno y del corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec, Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Ixtepec (Primera etapa) y Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.

Se informa además que la documentación original se enviará a través de correo postal, impreso y en medios magnéticos; independientemente los documentos en formato Excel y PDF firmados, se envían por medio de correo electrónico. Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
voluntas totum potest
guiráa zanda ne guendaracala'dxi

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.f.p. Mtra. María de los Ángeles Peralta Arias. – Rectora de la Universidad del Istmo. – Para su conocimiento.
Arq. Sergio Leonardo Peralta Soriano. – Jefe del Departamento de Proyectos, Construcción y Manto. Mismo fin.
Cfp.- Archivo.
*OCO/mgo



Campus Tehuantepec
Cd. Universitaria, Sto. Domingo
Tehuantepec, Oax.
(971) 5224050

Campus Ixtepec
Cd. Universitaria, Cd. Ixtepec, Oax.
(971) 7127050

Campus Juchitán
Cd. Universitaria, H. Cd. de Juchitán de
Zaragoza, Oax.
(971) 712 7050

2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TACHA

FAM
FACULTAD DE AGRICULTURA Y MEDICINADIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA

3er Trimestre - 2024

TOTAL DE VALORES: 30.000,00

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TACHA									
Nombre: Universidad del Tacha									
Entidad habilitada: 20.000,00									
Código: 20.000,00									
Nombre: M.A. Oscar Carlos Ochoa									
Cargo: Maestro de Taller de Construcción									
Teléfono: 071 71 71 71 del 200									
Correo electrónico: ochoa_m_a@unata.edu.ec									
Nombre: Ing. Sergio L. Lora									
Cargo: Asesor de Construcción de Proyectos, Construcción y Mantenimiento									
Teléfono: 071 71 71 71 del 200									
Correo electrónico: lora_sergio@unata.edu.ec									
4	Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la Universidad del Tacha, específicamente para los PIR de Escuelas de los campus Iquitos y Juchán, así como, los PE de programas del campus Tahuatapes.	X	\$	1.300.000,00	23/10/2024	21/12/2024			
5	Equipamiento de los laboratorios y talleres de los programas educativos del campus Tahuatapes con una orientación a las necesidades del entorno y del corredor interuniversitario del Tacha de Tahuatapes.	X	\$	601.000,00	23/10/2024	21/12/2024			
TOTAL									
TOTAL									

1. Se respalda la información que se encuentra en la columna principal.

2. Se respalda la información que se encuentra en la columna principal.

3. Se respalda la información que se encuentra en la columna principal.

Ing. Sergio L. Lora

M.A. Oscar Carlos Ochoa
Vice-Rector de Administración de la UNATAMtra. María de los Angeles Porras Arias
Rectora de la Uninam

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er Trimestre - 2024

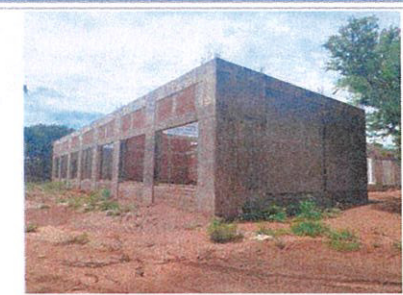
Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

USO DE LA INSTITUCIÓN  Porcentaje de avance 0.00%	PRIORIDAD 1 Nombre de la obra: Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (10)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (10) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (10) 		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10) 

Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, Co. 70760

FOTOS



Observaciones:

Recurso FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0822-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, con oficio de validación académica de realización de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1069-35 de fecha 12 de marzo de 2024.

En integración de la información en el portal de la Secretaría de Finanzas (Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca) para el ejercicio fiscal 2024.


M.A. Oscar Cortés Chaves
Jefe del Departamento de Construcción y Mantenimiento


M.A. Oscar Cortés Chaves
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO


Mra. María de los Angeles Parada Arías
Rectora de la UNISTMO

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaina, se podrán copiar tantas pestainas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
QUEDÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES



DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año al que se aplica

3er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	PROCEDIMIENTOS 1 Nombre de la obra: Terminación de un laboratorio de simulación y manufactura industrial en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)  Dirección Postal: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª sección Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México, Co. 70760
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)  LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL

FOTOS



Observaciones:

(11)

Recurso FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0822-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Con oficio de validación académica de modificación de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1068-35 de fecha 12 de marzo de 2024. En integración de la información en el portal de la Secretaría de Finanzas (Sistema Estatal de Finanzas Públicas de Oaxaca) para el ejercicio fiscal 2024.

(12)

Arq. Sergio Luis Hernández Bernal
Jefe del Departamento de Construcción, Infraestructura y Mantenimiento

(13)

M.A. Oscar Córdova Chaves,
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

(14)

Mrs. María de los Angeles Peña Arias
Rectora de la UNISTMO

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
SE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 04/12/2024

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE OAXACA	PRESENCIA 2	Nombre de la obra: Mantenimiento a la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Itepec (Primera etapa).
UNISTMO	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)
Porcentaje de avance	0.00%	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
		
		Dirección Postal: Ciudad Universitaria s/n, Carretera Itepec Chihuitan, Ciudad Itepec, Oaxaca, CP. 70110

FOTOS



F1



F2



F3



F4

Observaciones:

Recurso FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0822-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública, con oficio de validación académica de modificación de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1069-36 de fecha 12 de marzo de 2024.

Con oficio de autorización SF/SP/OP/PP/FAM-ES/1570/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024. Carga de información en el sistema de Opinión Normativa de la SHITFP, para revisión de la convocatoria y bases de licitación.

Am. Sergio J. Pérez Arriaga
Jefe del Departamento de Fomento Institucional, Construcción y Mantenimiento

M.A. Oscar Daniel Cisneros,
Vice-Rector de Administración de la UNISTMO

Mra. María de los Angeles Peraza Arias
Rectora de la Unistmo

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta



3er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	PRECUBO 3 Nombre de la obra: Montaje de la red de energía eléctrica en edificios de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)			

FOTOS

				Observaciones: (11) Recurso FAM del ejercicio 2024, asignado con número de oficio 511/2024-0822-38 de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública. Con oficio de validación académica de modificación de los proyectos FAM 2024, con número 511/2024-1069-35 de fecha 12 de marzo de 2024. Con oficio de autorización SFIS/PP/PP/FAM/ES/1571/2024, de fecha 25 de septiembre de 2024. Carga de información en el sistema de Opinión Normativa de la SHFPP, para revisión de la convocatoria y bases de licitación.
				
				

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
ORDENÓ EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta (9)

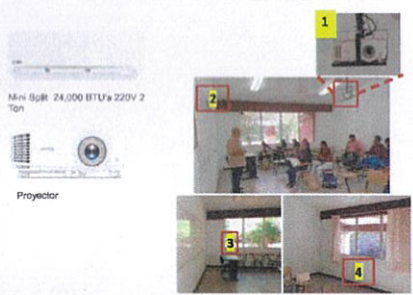
3er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración (10/10/2024)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	PROYECTO 4 Nombre de la obra: Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los po de Huautla de los campos Istepec y Juchitán, así como, los po de postgrado del campus Tehuantepec.		
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)
	 UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS ISTEPEC	 UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN	 UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC

FOTOS

AULAS, campus Istepec Estado actual (11)	LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán (12)	Observaciones: (13) Con oficio de autorización SF/SP/10/P/FAM-E-50423/2024, de fecha 28 de mayo de 2024. En revisión del expediente ante el Comité de adquisiciones, evaluaciones, emendaciones y servicios del Estado de Oaxaca, para que se someta a consideración el procedimiento licitatorio.
		
LABORATORIOS: laboratorios del Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación, campus Juchitán (14)	LABORATORIO: Laboratorios de Energía Eólica, campus Tehuantepec (15)	
		
		

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
GUSTO EL RECURSO**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

3er Trimestre - 2024

Fecha de elaboración: 04/10/2024

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	PROYECTO: II Nombre de la obra: Adquisición de equipo básico y especializado para aulas, laboratorios, centros de información y documentación en la universidad del Istmo, específicamente para los PE de Huamantla de los campos Itapepec y Juchitán, así como, los PE de posgrado del campus Tehuantepec.	
	GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (9) 	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9) 

FOTOS

Taller Aula de Dibujo  RESTRADOR PROFESIONAL para arquitectura, diseño técnico o dibujo artístico. Mesa de vidrio templado y estructura de acero. Incluye bandejas. Contiene dos cajones en la parte inferior de la mesa del restrador para colocar objetos. INCLUIVE - Mesa de trabajo de cristal - Estructura de acero - 4 charolas de plástico - 4 ruedas - 4 estabilizadores - 2 cajoneras - 1 llave allen de 4mm - 1 llave española de 10 y 12 mm - Tornillería para su armado. MEDIDAS DEL PRODUCTO Largo: 104 cm Ancho: 61 cm Alto: 124 cm	Taller de Metales  COMPRESOR DE AIRE Para secado de materiales.	Taller de Serigrafía  PLOTTER DE CORTE Para vinil IMPRESORA DE SUBIMACIÓN	Observaciones: Con oficio de autorización SF/SP/VD/PE/FAM-ES/04/57/2024, de fecha 04 de junio de 2024. En revisión del expediente ante el Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del Estado de Oaxaca, para que se someta a consideración el procedimiento licitatorio.
Laboratorio de Oceanografía  REFRIGERADOR COMERCIAL Capacidad de 547 L, con iluminación LED, puerta de vidrio.	Laboratorio de Ing. Química  GENERADOR DE NITRÓGENO Pureza de nitrógeno de 99.9 %, alimentación de 220V, capacidad de 300 m³/min.	Taller de Maderas  Torno para madera de 40"  Ujadora de Banda  Sierra Ingleteadora  Clavadora Neumática	

NOTA:

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
